

MEKONG TECHNOLOGY

- [MỤC LỤC TỔNG THỂ](#)
 - [PHẦN MỞ ĐẦU](#)
 - [PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG](#)
 - [PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ](#)
 - [PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH](#)
 - [PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT](#)
 - [PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ](#)
 - [PHẦN VI: PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG](#)
 - [PHẦN VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC](#)
 - [PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI](#)
 - [PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ](#)
 - [PHỤ LỤC](#)
- [THÔNG TIN DỰ ÁN](#)
 - [Tổng quan Dự án](#)
 - [Thông tin Địa điểm](#)
 - [Thông tin Đầu tư](#)
 - [Phạm vi Lĩnh vực](#)
 - [Phân kỳ Đầu tư](#)
 - [Chỉ số Tài chính Tổng hợp](#)
 - [Bảng Sản phẩm Tổng hợp \(Giai đoạn Ổn định — Từ năm 4\)](#)
- [TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH](#)
 - [Giới thiệu](#)
 - [Tầm nhìn Chiến lược](#)
 - [Lý do Mở rộng](#)
 - [1. Khoảng trống Thị trường](#)
 - [2. Phù hợp Chiến lược Quốc gia](#)
 - [3. Tối ưu hóa Hệ sinh thái](#)
 - [Sơ đồ Hệ sinh thái Tích hợp](#)
 - [Tóm tắt Tài chính](#)
 - [Cơ cấu Vốn Đầu tư \(CAPEX = 47,50 M USD\)](#)
 - [Cấu trúc Vốn](#)
 - [Chỉ số Thẩm định](#)
 - [Phân bổ Giá trị Chiến lược](#)
 - [Tiến độ Tổng thể](#)
 - [Nhân sự Tổng thể](#)
 - [Cam kết Chính của Chủ đầu tư](#)
- [CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN](#)
 - [Luật và Nghị quyết](#)
 - [Nghị định và Quyết định](#)
 - [Ma trận Áp dụng Pháp lý](#)
- [PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG](#)
 - [1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu](#)
 - [1.1.1. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi Số](#)
 - [1.1.2. Tái cấu trúc Chuỗi cung ứng Toàn cầu](#)
 - [1.1.3. Vị trí Chiến lược của Đông Nam Á](#)
 - [1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM](#)
 - [1.2.1. Kinh tế Việt Nam 2024-2030](#)
 - [1.2.2. Hạ tầng Công nghệ Cao](#)

- [1.2.3. Chính sách Ưu đãi KCNC](#)
- [1.3. Thị trường IoT và Robot Tự hành](#)
 - [1.3.1. Thị trường Toàn cầu](#)
 - [1.3.2. Thị trường Việt Nam](#)
 - [1.3.3. Cảnh quan Cạnh tranh — IoT/Robot](#)
 - [1.3.4. Thị phần Mục tiêu — IoT/Robot](#)
- [1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác](#)
 - [1.4.1. Thị trường Toàn cầu](#)
 - [1.4.2. Thị trường Việt Nam](#)
 - [1.4.3. Khoảng trống Thị trường — Blue Ocean](#)
 - [1.4.4. Cảnh quan Cạnh tranh — CNC](#)
 - [1.4.5. Chiến lược 3 Bậc Thâm nhập](#)
- [1.5. Thị trường Trung tâm Dữ liệu và Điện toán AI](#)
 - [1.5.1. Thị trường Datacenter Việt Nam](#)
 - [1.5.2. Cảnh quan Cạnh tranh — Datacenter](#)
 - [1.5.3. Khoảng trống Phân khúc — AI-First DC trong KCNC](#)
 - [1.5.4. Khách hàng Mục tiêu — Top 20](#)
 - [1.5.5. Mô hình Doanh thu Datacenter](#)
 - [1.5.6. Chiến lược GPU: Thuê trước, Mua sau \(Hybrid\)](#)
- [1.6. Định vị Cạnh tranh Tổng thể](#)
 - [1.6.1. Ma trận Định vị Chiến lược](#)
 - [1.6.2. Lợi thế Cạnh tranh Bền vững \(MOAT\)](#)
- [1.7. Phân tích Chuỗi Giá trị \(Value Chain Analysis\)](#)
 - [1.7.1. Chuỗi Giá trị Ngành CNC Outsourcing](#)
 - [1.7.2. Chuỗi Giá trị Ngành Data Center](#)
 - [1.7.3. Chuỗi Giá trị Ngành IoT/Robot](#)
- [1.8. Phân tích Khách hàng Mục tiêu \(Customer Segmentation\)](#)
 - [1.8.1. Segmentation — CNC Outsourcing](#)
 - [1.8.2. Segmentation — Data Center](#)
 - [1.8.3. Segmentation — IoT/Robot](#)
- [1.9. Phân tích SWOT Chi tiết](#)
 - [1.9.1. SWOT Matrix](#)
 - [1.9.2. Chiến lược TOWS \(Cross-SWOT\)](#)
- [1.10. Phân tích Porter's Five Forces](#)
 - [1.10.1. Ngành CNC Outsourcing tại VN](#)
 - [1.10.2. Ngành Data Center tại VN](#)
 - [1.10.3. Ngành IoT/Robot tại VN](#)
 - [1.10.4. Tổng hợp Five Forces — 3 Ngành](#)
- [1.11. Phân tích Quy mô Thị trường TAM/SAM/SOM Chi tiết](#)
 - [1.11.1. TAM/SAM/SOM — CNC Outsourcing](#)
 - [1.11.2. TAM/SAM/SOM — Data Center](#)
 - [1.11.3. TAM/SAM/SOM — IoT/Robot](#)
- [1.12. Dự báo Xu hướng Công nghệ 2025-2035](#)
 - [1.12.1. Technology Radar — Impact on Mekong](#)
 - [1.12.2. R&D Investment Roadmap Response](#)
- [PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ](#)
 - [2.1. Tổng quan 3 Trụ cột Sản phẩm](#)
 - [Bảng Sản phẩm Chi tiết — 10 Dòng sản phẩm](#)
 - [2.2. Trụ cột 1 — Sản xuất IoT Gateway và Robot Tự hành](#)
 - [2.2.1. IoT Gateway — Dòng sản phẩm MK-200 và MK-300](#)
 - [2.2.2. Robot AMR-500 và AMR-1000](#)
 - [2.2.3. Robot AGV-500 và AGV-1000](#)

- [2.2.4. Robot OHT-100](#)
 - [2.2.5. MekongOS — Nền tảng IoT Cloud](#)
- [2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác \(MPMC\)](#)
 - [2.3.1. Tổng quan Năng lực Sản xuất](#)
 - [2.3.2. Danh mục Máy móc Chi tiết](#)
 - [2.3.3. Hệ thống QA/QC — Phòng Đo lường CMM](#)
 - [2.3.4. Phần mềm CAD/CAM/CAE](#)
 - [2.3.5. Quy trình Gia công Tiêu biểu](#)
 - [2.3.6. Sản phẩm CNC theo Phân khúc](#)
 - [2.3.7. Doanh thu CNC theo Kịch bản](#)
- [2.4. Trụ cột 3 — Hạ tầng Điện toán Đám mây AI \(MACC\)](#)
 - [2.4.1. Tổng quan Kiến trúc Datacenter](#)
 - [2.4.2. Phân vùng Data Hall](#)
 - [2.4.3. Hệ thống Làm mát](#)
 - [2.4.4. Dịch vụ Chi tiết](#)
 - [2.4.5. Lộ trình Occupancy](#)
- [2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 3 Trụ cột](#)
 - [2.5.1. Ma trận Liên kết Giá trị](#)
 - [2.5.2. Lượng hóa Giá trị Cộng hưởng](#)
- [2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ](#)
- [2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển \(R&D\)](#)
 - [2.7.1. Ngân sách R&D](#)
 - [2.7.2. Phòng Thí nghiệm R&D](#)
 - [2.7.3. Hợp tác Chuyển giao Công nghệ \(CGCN\)](#)
 - [2.7.4. Sở hữu Trí tuệ](#)
- [2.8. Chi tiết Kỹ thuật CNC 5-Axis Machining Center](#)
 - [2.8.1. Danh sách Máy CNC — Phase 1 \(28 máy\)](#)
 - [2.8.2. Thiết bị QC / Đo lường](#)
 - [2.8.3. Process Capability Matrix](#)
 - [2.8.4. Công suất Sản xuất Dự kiến](#)
- [2.9. Chi tiết Thiết kế Data Center — Tier III](#)
 - [2.9.1. Thông số Tier III Design](#)
 - [2.9.2. Power Design Layout](#)
 - [2.9.3. Cooling Design](#)
 - [2.9.4. Rack Layout — Hall Plan](#)
- [2.10. Chi tiết Thiết kế IoT Products](#)
 - [2.10.1. MK-200 IoT Gateway — Block Diagram](#)
 - [2.10.2. AMR-100 Autonomous Mobile Robot — Specifications](#)
 - [2.10.3. MekongOS Platform Architecture](#)
- [PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH](#)
 - [3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu](#)
 - [Nhóm 1: Doanh thu Sản phẩm \(Product Revenue\)](#)
 - [Nhóm 2: Doanh thu Dịch vụ Định kỳ \(Recurring Revenue\)](#)
 - [Nhóm 3: Doanh thu Kết nối \(Connectivity Revenue\)](#)
 - [Nhóm 4: Doanh thu Giá trị gia tăng \(VAS Revenue\)](#)
 - [Cơ cấu Doanh thu theo Năm](#)
 - [3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận](#)
 - [3.2.1. Phân loại Khách hàng](#)
 - [3.2.2. Chiến lược Bán hàng theo Trụ cột](#)
 - [3.3. Chiến lược Phát triển Ba Giai đoạn](#)
 - [3.4. Kênh Phân phối và Đối tác Chiến lược](#)
 - [3.4.1. Đối tác Chiến lược](#)

- [3.4.2. Mô hình Kinh doanh Canvas \(Business Model Canvas\)](#)
 - [3.5. Chiến lược Giá Chi tiết \(Pricing Strategy\)](#)
 - [3.5.1. Nguyên tắc Định giá](#)
 - [3.5.2. Bảng Giá Trụ cột 1 — IoT/Robot](#)
 - [3.5.3. Bảng Giá Trụ cột 2 — CNC Outsourcing](#)
 - [3.5.4. Bảng Giá Trụ cột 3 — Datacenter](#)
 - [3.5.5. Chiến lược Giá theo Hợp đồng](#)
 - [3.6. Kinh tế Đơn vị \(Unit Economics\)](#)
 - [3.6.1. IoT/Robot Unit Economics](#)
 - [3.6.2. CNC Outsourcing Unit Economics](#)
 - [3.6.3. Datacenter Unit Economics](#)
 - [3.7. Chiến lược Xuất khẩu và Mở rộng Khu vực ASEAN](#)
 - [3.7.1. Tầm nhìn Xuất khẩu](#)
 - [3.7.2. Phân tích Thị trường ASEAN theo Trụ cột](#)
 - [3.7.3. Lộ trình Xuất khẩu CNC \(Chi tiết\)](#)
 - [3.8. Go-to-Market \(GTM\) Timeline Chi tiết](#)
 - [3.8.1. GTM theo Giai đoạn](#)
 - [3.8.2. Mục tiêu GTM theo Quý \(Y1 Vận hành\)](#)
 - [3.9. Pipeline Khách hàng và Xác suất](#)
 - [3.9.1. CNC Pipeline \(Pre-operation\)](#)
 - [3.9.2. DC Pipeline \(Pre-lease\)](#)
 - [3.9.3. Customer Acquisition Cost \(CAC\) theo Trụ cột](#)
 - [3.10. Phân tích Doanh thu Theo mùa và Dòng tiền](#)
 - [3.10.1. Tính Mùa vụ theo Trụ cột](#)
 - [3.10.2. Dòng tiền Hoạt động Dự kiến \(Y3 — Steady State\)](#)
 - [3.11. Mô hình Đặt giá Chi tiết theo Ngành \(Pricing Waterfall\)](#)
 - [3.11.1. CNC Pricing Waterfall](#)
 - [3.11.2. DC Pricing — Rack-level Economics](#)
 - [3.11.3. IoT/Robot Pricing Architecture](#)
 - [3.12. Chiến lược Cạnh tranh \(Competitive Strategy\)](#)
 - [3.12.1. Competitive Positioning Map — CNC](#)
 - [3.12.2. Competitive Positioning Map — Data Center](#)
 - [3.12.3. Win/Loss Strategy](#)
 - [3.13. Dự báo Doanh thu 20 Năm — Chi tiết theo Trụ cột](#)
 - [3.13.1. Revenue Projection Table \(K USD\)](#)
 - [3.13.2. Revenue Mix Evolution](#)
- [PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ VẬT CHẤT](#)
 - [4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng](#)
 - [4.1.1. Thông tin Khu đất](#)
 - [4.1.2. Phân khu Chức năng — Tòa nhà 3 Tầng](#)
 - [4.1.3. Layout Tổng thể — Mặt bằng 1 ha](#)
 - [4.2. Thiết kế Hạ tầng Khu vực Datacenter — Tầng 2 \(MACC\)](#)
 - [4.2.1. Kiến trúc Vật lý](#)
 - [4.2.2. Hệ thống Điện — Sơ đồ Một dây](#)
 - [4.2.3. Hệ thống Làm mát Chi tiết](#)
 - [4.2.4. Hệ thống An ninh Vật lý](#)
 - [4.2.5. Hệ thống Mạng](#)
 - [4.3. Thiết kế Hạ tầng Khu vực CNC — Tầng 1 \(MPMC\)](#)
 - [4.3.1. Layout Xưởng CNC](#)
 - [4.3.2. Yêu cầu Nền Móng và Sàn](#)
 - [4.3.3. Hệ thống Điện Khối B](#)
 - [4.3.4. Hệ thống Phụ trợ CNC](#)

- [4.4. Thiết kế Hạ tầng Khu vực IoT/Robot — Tầng 1 \(SMT\).](#)
 - [4.4.1. Layout Dây chuyền SMT](#)
 - [4.4.2. Thiết bị SMT](#)
 - [4.4.3. Điều kiện Sản xuất Điện tử](#)
- [4.5. Hệ thống M&E Chung — Bill of Quantities \(BOQ\).](#)
 - [4.5.1. Tổng hợp BOQ theo Hàng mục](#)
 - [4.5.2. Phân kỳ M&E](#)
- [4.6. Hệ thống Cấp nước và Xử lý Nước thải](#)
 - [4.6.1. Nhu cầu Nước](#)
 - [4.6.2. Giải pháp Cấp nước — 4 Phương án Kết hợp](#)
 - [4.6.3. Hệ thống Xử lý Nước thải](#)
- [4.7. Hệ thống Phòng cháy Chữa cháy \(PCCC\).](#)
 - [4.7.1. Phân loại Nguy hiểm Cháy](#)
 - [4.7.2. Hệ thống PCCC Chi tiết](#)
 - [4.7.3. Tuân thủ PCCC](#)
 - [4.7.4. Phương án Phòng cháy](#)
- [4.8. Hệ thống Quản lý Tòa nhà \(BMS/DCIM\).](#)
 - [4.8.1. BMS \(Building Management System\)](#)
 - [4.8.2. DCIM \(Data Center Infrastructure Management\)](#)
- [4.9. Tổng hợp Chi phí Hạ tầng](#)
 - [4.9.1. CAPEX Hạ tầng theo Khối](#)
- [4.10. Hệ thống Điện Trung thế và Hạ thế](#)
 - [4.10.1. Sơ đồ Cấp điện Tổng thể](#)
 - [4.10.2. Phụ tải Điện theo Khối](#)
 - [4.10.3. Chất lượng Điện năng](#)
- [4.11. Hệ thống HVAC và Kiểm soát Môi trường](#)
 - [4.11.1. Yêu cầu Nhiệt độ/Độ ẩm theo Khu vực](#)
 - [4.11.2. Thiết bị HVAC theo Khu vực](#)
 - [4.11.3. Hệ thống Hút Khói/Bụi CNC \(Central Extraction\)](#)
- [4.12. Hệ thống An ninh và Kiểm soát Truy cập](#)
 - [4.12.1. Mô hình An ninh 5 Lớp](#)
 - [4.12.2. Thiết bị An ninh](#)
- [4.13. Hệ thống Công nghệ Thông tin \(IT Infrastructure\).](#)
 - [4.13.1. Hạ tầng Mạng Nội bộ](#)
 - [4.13.2. Hệ thống Phần mềm \(Software Stack\)](#)
 - [4.13.3. Hệ thống MES — Manufacturing Execution System](#)
- [4.14. Hệ thống Năng lượng Tái tạo và Bền vững](#)
 - [4.14.1. Solar PV Rooftop](#)
 - [4.14.2. Chiến lược ESG và Carbon Footprint](#)
- [PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ](#)
 - [5.1. Tổng quan Cấu trúc Vốn](#)
 - [5.1.1. CAPEX Tổng hợp — 5 Phase / 15 năm](#)
 - [5.1.2. Cấu trúc Nguồn vốn](#)
 - [5.1.3. Chi tiết Vốn CSH — Equity Bridge \(5 Phase\)](#)
 - [5.2. Doanh thu Dự kiến 15 năm \(Horizon đầu tư\) + 50 năm \(Hợp đồng thuê\)](#)
 - [5.2.1. Bảng Doanh thu Chi tiết — 15 năm đầu tư](#)
 - [5.2.2. Doanh thu Y10 và các Mốc quan trọng](#)
 - [5.3. Chi phí Hoạt động \(OPEX\).](#)
 - [5.3.1. Bảng OPEX Chi tiết — Năm 10 \(đại diện, 3 BU hoạt động\)](#)
 - [5.3.2. OPEX theo Năm](#)
 - [5.4. Báo cáo Lãi lỗ Dự kiến \(Pro-forma P&L\).](#)
 - [5.4.1. P&L 15 năm — Base Case](#)

- [5.4.2. Điểm Hòa vốn](#)
- [5.5. Dòng tiền Dự kiến \(Projected Cash Flow\)](#)
 - [5.5.1. Cash Flow 15 năm](#)
 - [5.5.2. DSCR \(Debt Service Coverage Ratio\)](#)
- [5.6. Phân tích Hiệu quả Đầu tư](#)
 - [5.6.1. Các Chỉ số Chính \(Base Case\)](#)
 - [5.6.2. Phân tích 3 Kịch bản](#)
 - [5.6.3. Phân tích Nhạy cảm \(Sensitivity Analysis\)](#)
- [5.7. Giá trị Chiến lược \(Strategic Value Assessment\)](#)
 - [5.7.1. Tổng hợp Giá trị Dự án](#)
 - [5.7.2. So sánh V1 vs V2.1](#)
- [5.8. Phân tích Rủi ro Tài chính](#)
 - [5.8.1. Ma trận Rủi ro](#)
 - [5.8.2. Monte Carlo Simulation Summary](#)
- [5.9. Kế hoạch Giải ngân Vốn \(5 Phase / 15 Năm\)](#)
- [5.10. Mô hình Vốn lưu động \(Working Capital Model\)](#)
 - [5.10.1. Cấu trúc Working Capital](#)
 - [5.10.2. Cash Conversion Cycle \(CCC\)](#)
 - [5.10.3. Quản lý Thanh khoản](#)
- [5.11. Lịch trả Nợ Chi tiết \(Debt Amortization Schedule\)](#)
 - [5.11.1. Thông số Khoản vay](#)
 - [5.11.2. Bảng Khấu hao Nợ \(Năm\)](#)
 - [5.11.3. Covenant Requirements](#)
- [5.12. Bảng Cân đối Kế toán Dự kiến \(Pro-forma Balance Sheet\)](#)
 - [5.12.1. Balance Sheet 15 năm](#)
 - [5.12.2. Các Chỉ số Bảng cân đối](#)
- [5.13. Kế hoạch Thuế và Ưu đãi Chi tiết](#)
 - [5.13.1. Cấu trúc Ưu đãi Thuế KCNC TP.HCM](#)
 - [5.13.2. Lịch trình Thuế theo V2.1](#)
 - [5.13.3. Transfer Pricing & Tax Compliance](#)
- [5.14. Định giá Dự án \(Valuation\)](#)
 - [5.14.1. DCF Valuation](#)
 - [5.14.2. Comparable Company Valuation](#)
 - [5.14.3. Implied Valuation Range](#)
 - [5.14.4. Cost of Equity — CAPM Detail](#)
- [5.15. Phân tích Lợi nhuận Nhà đầu tư \(Investor Return\)](#)
 - [5.15.1. Equity Return Timeline](#)
 - [5.15.2. Chính sách Cổ tức](#)
 - [5.15.3. Exit Scenarios \(tham khảo\)](#)
- [5.16. Phân tích Điểm Hòa vốn theo BU \(Breakeven Analysis\)](#)
 - [5.16.1. Sensitivity — Breakeven vs Utilization Rate](#)
- [5.17. Tổng hợp Các Chỉ số Tài chính Chính \(Financial Dashboard\)](#)
- [PHẦN VI: PHÁP LÝ, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN](#)
 - [6.1. Khung Pháp lý Áp dụng](#)
 - [6.1.1. Luật và Nghị định Chính](#)
 - [6.1.2. Mã ngành Kinh doanh](#)
 - [6.2. Chiến lược Pháp lý — Phụ lục Bổ sung](#)
 - [6.2.1. Lựa chọn Phương án Pháp lý](#)
 - [6.2.2. Lộ trình Thủ tục Pháp lý](#)
 - [6.2.3. Danh mục 18 Giấy phép và Thủ tục](#)
 - [6.2.4. Timeline Pháp lý Tổng hợp](#)
 - [6.3. Đánh giá Tác động Môi trường \(DTM\)](#)

- [6.3.1. Phạm vi ĐTM](#)
 - [6.3.2. Ma trận Tác động Môi trường](#)
 - [6.3.3. Ngân sách Môi trường](#)
 - [6.3.4. Cam kết Môi trường](#)
- [6.4. An toàn Lao động](#)
 - [6.4.1. Rủi ro An toàn theo Khu vực](#)
 - [6.4.2. Chương trình An toàn](#)
- [6.5. Lộ trình Giấy phép và Thủ tục Hành chính](#)
 - [6.5.1. Ma trận Giấy phép](#)
 - [6.5.2. Timeline Pháp lý](#)
 - [6.5.3. Critical Path Pháp lý](#)
- [6.6. Quản lý Môi trường Toàn diện](#)
 - [6.6.1. Ma trận Tác động Môi trường theo Khối](#)
 - [6.6.2. Mục tiêu GHG và Lộ trình Net-Zero](#)
 - [6.6.3. Hệ thống Xử lý Nước thải \(ZLD\)](#)
- [6.7. An ninh + Bảo mật Vật lý & Thông tin](#)
 - [6.7.1. An ninh Vật lý \(Physical Security\)](#)
 - [6.7.2. An ninh Thông tin \(Information Security\)](#)
 - [6.7.3. Business Continuity Plan \(BCP\) — Tóm tắt](#)
- [6.8. Trách nhiệm Xã hội \(CSR\) và ESG](#)
 - [6.8.1. Cam kết ESG](#)
 - [6.8.2. Đóng góp Kinh tế — Xã hội](#)
- [PHẦN VII: TỔ CHỨC NHÂN SỰ](#)
 - [7.1. Cơ cấu Tổ chức](#)
 - [7.1.1. Sơ đồ Tổ chức](#)
 - [7.1.2. Nhân sự theo Giai đoạn — V2.1](#)
 - [7.1.3. Đội ngũ Chuyên gia Nước ngoài](#)
 - [7.2. Tuyển dụng và Đào tạo](#)
 - [7.2.1. Kế hoạch Tuyển dụng theo Nhóm](#)
 - [7.2.2. Chương trình Đào tạo](#)
 - [7.2.3. Chính sách Nhân sự](#)
 - [7.3. Chi phí Nhân sự](#)
 - [7.3.1. Bảng Lương theo Năm](#)
 - [7.4. Kế hoạch Phát triển Tổ chức \(Organizational Development\)](#)
 - [7.4.1. Mô hình Phát triển 3 Giai đoạn](#)
 - [7.4.2. Kế hoạch Xây dựng Đội ngũ Quản lý](#)
 - [7.4.3. Kế hoạch Đào tạo Chi tiết theo Vai trò](#)
 - [7.4.4. Chương trình ESOP \(Employee Stock Ownership Plan\)](#)
 - [7.5. Chiến lược Giữ chân Nhân tài \(Talent Retention\)](#)
 - [7.5.1. Phân tích Rủi ro Mất Nhân sự Chủ chốt](#)
 - [7.5.2. Chương trình Giữ chân](#)
 - [7.5.3. Career Path — Dual Track](#)
 - [7.6. Kế hoạch Kế nhiệm \(Succession Planning\)](#)
 - [7.6.1. Ma trận Kế nhiệm cho Vị trí Chủ chốt](#)
 - [7.6.2. Knowledge Transfer Protocol](#)
- [PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI](#)
 - [8.1. Lộ trình Tổng thể \(Master Schedule\)](#)
 - [8.2. Các Mốc Quan trọng \(Key Milestones\)](#)
 - [8.3. Quản lý Dự án](#)
 - [8.3.1. Tổ chức Dự án](#)
 - [8.3.2. Quản lý Rủi ro Dự án](#)
 - [8.4. Phân tích Đường găng \(Critical Path Analysis\)](#)

- [8.4.1. Xác định Đường găng](#)
 - [8.4.2. Phân tích Float \(Slack\) theo Hoạt động](#)
 - [8.4.3. Chiến lược Gia tốc \(Crashing Strategy\)](#)
- [8.5. Ngân sách Triển khai theo Giai đoạn](#)
 - [8.5.1. Phân bổ CAPEX theo Phase — V2.1](#)
 - [8.5.2. Kế hoạch Giải ngân theo Giai đoạn](#)
 - [8.5.3. Nguồn vốn theo Thời điểm Giải ngân](#)
- [8.6. Quy trình Nghiệm thu và Bàn giao](#)
 - [8.6.1. Danh mục Nghiệm thu theo Hạng mục](#)
 - [8.6.2. Test Protocol cho Hệ thống DC](#)
- [PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ](#)
 - [9.1. Tóm tắt Giá trị Dự án](#)
 - [9.1.1. Tổng hợp Chỉ số Chính](#)
 - [9.1.2. Giá trị Chiến lược Quốc gia](#)
 - [9.2. Cam kết của Nhà đầu tư](#)
 - [9.3. Kiến nghị](#)
 - [Kiến nghị đối với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM:](#)
 - [Kiến nghị đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM:](#)
 - [Kiến nghị đối với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM:](#)
 - [9.4. Lời kết](#)
 - [9.5. Tầm nhìn Phát triển Dài hạn \(Long-term Vision\)](#)
 - [9.5.1. Lộ trình 5 Phase](#)
 - [9.5.2. Mục tiêu Chiến lược \(Tầm nhìn 50 năm\)](#)
 - [9.6. Hành động Tiếp theo \(Immediate Next Steps\)](#)
 - [9.6.1. Action Items — 90 ngày Tiếp theo](#)
 - [9.6.2. Milestones theo 5 Phase](#)
 - [9.7. Bảng Đối chiếu Số liệu Toàn Đề án \(Cross-Check Table\)](#)
 - [9.8. Lời cảm ơn](#)
- [CÁC PHỤ LỤC](#)
- [PHỤ LỤC A: BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH CHI TIẾT](#)
 - [A.1. Giả định Chính \(Key Assumptions\)](#)
 - [A.1.1. Giả định Kinh tế Vĩ mô](#)
 - [A.1.2. Giả định Doanh thu — V2.1](#)
 - [A.1.3. Giả định Chi phí](#)
 - [A.2. Bảng P&L Chi tiết — V2.1 \(Y0-Y20\)](#)
 - [A.3. Bảng Khấu hao Chi tiết](#)
 - [A.4. Bảng Vay và Trả nợ](#)
 - [A.5. Tính toán NPV và IRR](#)
 - [A.5.1. Free Cash Flow to Firm \(FCFF\) — V2.1 \(50Y Horizon\)](#)
- [PHỤ LỤC B: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHI TIẾT](#)
 - [B.1. Thị trường CNC Toàn cầu](#)
 - [B.1.1. Quy mô Thị trường](#)
 - [B.1.2. Nhu cầu CNC từ FDI tại Việt Nam](#)
 - [B.1.3. Lợi thế Blue Ocean — AS9100](#)
 - [B.2. Thị trường Datacenter Việt Nam](#)
 - [B.2.1. Quy mô và Tăng trưởng](#)
 - [B.2.2. Đối thủ Cạnh tranh Chính](#)
 - [B.3. Thị trường IoT Công nghiệp \(IIoT\)](#)
 - [B.3.1. TAM/SAM/SOM](#)
- [PHỤ LỤC C: MẪU VĂN BẢN PHÁP LÝ](#)
 - [C.1. Mẫu Công văn Đề xuất Mở rộng](#)
 - [I. Hiện trạng Dự án](#)

- [II. Nội dung Đề xuất Mở rộng](#)
- [III. Cam kết](#)
- [IV. Hồ sơ Đính kèm](#)
- [C.2. Mẫu Phụ lục Bổ sung Mẫu 1.4](#)
 - [Phần I — Thông tin Chung \(Điều chỉnh\)](#)
 - [Phần II — Sản phẩm Bổ sung](#)
 - [Phần III — Tài chính \(Tóm tắt\)](#)
- [PHỤ LỤC D: DANH MỤC MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CHI TIẾT](#)
 - [D.1. Thiết bị CNC \(28 Máy\)](#)
 - [D.2. Thiết bị QA/QC](#)
 - [D.3. Thiết bị Datacenter](#)
 - [D.4. Thiết bị GPU \(DC Zone 2\)](#)
- [PHỤ LỤC E: THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ CƠ QUAN PHỐI HỢP](#)
- [PHỤ LỤC F: BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU](#)
 - [F.1. Đối chiếu Số liệu Chính](#)
 - [F.2. Nhan Du lieu](#)
- [PHỤ LỤC G: MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CHI TIẾT THEO TỪNG KHỐI \(B.U\)](#)
 - [G.1. Doanh thu Chi tiết — B.U #1: CNC Outsourcing \(10 năm\)](#)
 - [G.2. Doanh thu Chi tiết — B.U #2: Datacenter & AI Compute \(10 năm\)](#)
 - [G.2.1. Colocation Zone](#)
 - [G.2.2. AI/HPC Zone](#)
 - [G.2.3. GPU-as-a-Service](#)
 - [G.2.4. SaaS MekongOS Cloud](#)
 - [G.2.5. Tổng Revenue DC](#)
 - [G.3. Doanh thu Chi tiết — B.U #3: IoT/Robot \(10 năm\)](#)
 - [G.4. Tổng hợp Doanh thu & Tỷ trọng Theo B.U](#)
 - [G.5. P&L Theo Từng B.U — BASE CASE \(Conservative\)](#)
 - [G.5.1. B.U #1 — CNC Outsourcing P&L](#)
 - [G.5.2. B.U #2 — Datacenter & AI Compute P&L](#)
 - [G.5.3. B.U #3 — IoT/Robot P&L](#)
 - [G.6. P&L Tổng hợp — BASE CASE](#)
 - [G.7. Bảng Cân đối Kế toán Dự kiến \(Balance Sheet\)](#)
 - [G.8. Báo cáo Dòng tiền Hàng quý — 2 Năm đầu \(2025-2026\)](#)
 - [G.9. Báo cáo Dòng tiền Hàng năm — 10 Năm](#)
 - [G.10. Phân tích Độ nhạy Chi tiết](#)
 - [G.10.1. Nhạy cảm với Revenue \(\$\pm 30\%\$ \)](#)
 - [G.10.2. Nhạy cảm với CAPEX Overrun](#)
 - [G.10.3. Nhạy cảm với Machine Utilization CNC](#)
 - [G.10.4. Nhạy cảm với DC Occupancy](#)
 - [G.10.5. Nhạy cảm với Delay](#)
 - [G.10.6. Ma trận Nhạy cảm 2 Chiều \(Revenue x CAPEX\)](#)
 - [G.11. Ba Kịch bản \(Conservative / Base / Optimistic\)](#)
 - [G.11.1. Giả định Chi tiết](#)
 - [G.11.2. Kết quả 3 Kịch bản](#)
 - [G.11.3. Probability-Weighted NPV](#)
 - [G.12. Bảng Khấu hao Chi tiết](#)
 - [G.12.1. Nhóm 1: Khấu hao nhanh \(3-5 năm\) — GPU, Server, Storage](#)
 - [G.12.2. Nhóm 2: Khấu hao trung bình \(7-10 năm\) — CNC, SMT, Robot, UPS/Gen](#)
 - [G.12.3. Nhóm 3: Khấu hao dài \(15-20 năm\) — Hạ tầng, M&E, xưởng](#)
 - [G.13. CAPEX Chi tiết theo B.U và Phase](#)
 - [G.13.1. CAPEX Tổng hợp](#)
 - [G.13.2. CAPEX Chi tiết — B.U #1: CNC Outsourcing](#)

- [G.13.3. CAPEX Chi tiết — B.U #2: Datacenter & AI Compute](#)
 - [G.13.4. CAPEX Chi tiết — B.U #3: IoT/Robot](#)
 - [G.13.5. CAPEX — Hạ tầng Chung](#)
- [PHỤ LỤC H: DANH MỤC SẢN PHẨM CHI TIẾT \(PRODUCT CATALOG\)](#)
 - [H.1. Trụ cột 1: IoT Gateway & Robot](#)
 - [H.1.1. IoT Gateway MK-200 Pro](#)
 - [H.1.2. IoT Gateway MK-300 Enterprise](#)
 - [H.1.3. Robot AMR-500](#)
 - [H.1.4. Robot AGV-500](#)
 - [H.1.5. OHT-100 \(Overhead Hoist Transfer\)](#)
 - [H.2. Trụ cột 2: Dịch vụ CNC Siêu chính xác](#)
 - [H.2.1. Phân khúc Bán dẫn — Linh kiện Khuôn mẫu](#)
 - [H.2.2. Phân khúc Hàng không — Linh kiện Aerospace](#)
 - [H.2.3. Phân khúc Ô tô điện — Linh kiện EV](#)
 - [H.3. Trụ cột 3: Datacenter MACC](#)
 - [H.3.1. Dịch vụ Colocation](#)
 - [H.3.2. Dịch vụ GPU-as-a-Service](#)
 - [H.3.3. Dịch vụ MekongOS IoT Cloud](#)
- [PHỤ LỤC I: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐỊNH](#)
- [PHỤ LỤC J: SO SÁNH V1 VÀ V2.1](#)
- [PHỤ LỤC K: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO](#)
 - [K.1. Văn bản Pháp luật](#)
 - [K.2. Báo cáo Thị trường](#)
 - [K.3. Tiêu chuẩn Kỹ thuật](#)
- [PHỤ LỤC L: THIẾT KẾ HẠ TẦNG M&E CHI TIẾT](#)
 - [L.1. Tổng quan Thiết kế M&E](#)
 - [L.1.1. Nguyên tắc Thiết kế](#)
 - [L.2. Khối A — Datacenter Chi tiết](#)
 - [L.2.1. Kiến trúc Data Hall](#)
 - [L.2.2. Khu vực Phụ trợ — Tầng 1](#)
 - [L.2.3. Khu vực Phụ trợ — Tầng 2](#)
 - [L.2.4. Raised Floor Design Chi tiết](#)
 - [L.2.5. Cooling Architecture Chi tiết](#)
 - [L.2.6. Electrical Architecture — 2N Distribution](#)
 - [L.2.7. Physical Security Chi tiết](#)
 - [L.3. Khối B — Nhà máy CNC Chi tiết \(4.000 m²\)](#)
 - [L.3.1. Thông số Thiết kế Tổng quát](#)
 - [L.3.2. Machine Shop Layout \(25 Vị trí\)](#)
 - [L.3.3. Khoảng cách An toàn](#)
 - [L.3.4. Hệ thống Cách ly Rung Chi tiết](#)
 - [L.3.5. Hệ thống Chip Conveyor](#)
 - [L.3.6. Hệ thống Khí nén](#)
 - [L.3.7. Hệ thống Coolant Trung tâm](#)
 - [L.3.8. Cầu trục Overhead](#)
 - [L.3.9. Phòng Đo lường CMM \(200 m²\)](#)
 - [L.3.10. HVAC Khối B](#)
 - [L.4. Khối C — Nhà máy SMT Chi tiết \(3.000 m²\)](#)
 - [L.4.1. Thông số Thiết kế](#)
 - [L.4.2. Clean Room ISO 7 \(600 m²\)](#)
 - [L.4.3. SMT Production Line Layout](#)
 - [L.4.4. IPA Storage Room \(ATEX Zone\)](#)
 - [L.4.5. Robot Assembly Area \(800 m²\)](#)

- [L.4.6. ESD Control \(Toàn Khối C\)](#)
- [L.5. Hệ thống Điện Tổng hợp](#)
 - [L.5.1. Sơ đồ Một Dây \(Single Line Diagram\)](#)
 - [L.5.2. Transformer Specifications](#)
 - [L.5.3. Load Summary](#)
 - [L.5.4. Generator Farm](#)
 - [L.5.5. Solar PV 500 kWp](#)
 - [L.5.6. Lightning and Grounding](#)
- [L.6. Hệ thống Nước Chi tiết](#)
 - [L.6.1. Cấp nước](#)
 - [L.6.2. Cooling Water Loop \(DC\)](#)
 - [L.6.3. Water Balance](#)
 - [L.6.4. Water Conservation Measures](#)
- [L.7. BOQ M&E Tổng hợp Chi tiết](#)
 - [L.7.1. Hệ thống Điện](#)
 - [L.7.2. Hệ thống Cooling \(DC\)](#)
 - [L.7.3. Hệ thống HVAC \(CNC + SMT\)](#)
 - [L.7.4. Hệ thống CNC Chuyên dụng](#)
 - [L.7.5. Hệ thống Nước](#)
 - [L.7.6. Hạ tầng Khác](#)
 - [L.7.7. Tổng hợp BOQ M&E](#)
- [L.8. Timeline Thi công M&E](#)
 - [L.8.1. Long-Lead Items](#)
 - [L.8.2. Commissioning Sequence](#)
- [PHỤ LỤC M: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CNC CHI TIẾT](#)
 - [M.1. Quy mô Thị trường CNC Outsourcing](#)
 - [M.1.1. Thị trường Toàn cầu](#)
 - [M.1.2. Thị trường Đông Nam Á](#)
 - [M.1.3. Thị trường Việt Nam theo Phân khúc](#)
 - [M.2. Nhu cầu CNC từ FDI Miền Nam](#)
 - [M.2.1. Bản đồ Chi tiêu CNC](#)
 - [M.3. Cạnh tranh Chi tiết](#)
 - [M.3.1. Top 10 Đối thủ](#)
 - [M.3.2. Khoảng trống Thị trường](#)
 - [M.4. Pricing Benchmark](#)
 - [M.4.1. Giá theo Giờ Máy](#)
 - [M.4.2. So sánh Khu vực](#)
 - [M.4.3. Giá theo Chi tiết](#)
 - [M.5. Lộ trình Chứng nhận](#)
 - [M.5.1. IATF 16949 \(Ô tô\) — 18-24 tháng](#)
 - [M.5.2. AS9100 Rev D \(Hàng không\) — 24-30 tháng](#)
 - [M.6. Chiến lược Tiếp cận Khách hàng](#)
 - [M.6.1. Từ RFQ đến PO — Timeline](#)
 - [M.6.2. Kênh Tiếp cận](#)
 - [M.6.3. Anchor Customers \(Ưu tiên\)](#)
 - [M.7. Nhân sự CNC Chi tiết](#)
 - [M.7.1. Tổ chức](#)
 - [M.7.2. Bảng Nhân sự Chi tiết](#)
 - [M.7.3. SWOT cho Mekong CNC](#)
- [PHỤ LỤC N: DSCR VÀ CẤU TRÚC NỢ CHI TIẾT](#)
 - [N.1. Phân tích DSCR \(Debt Service Coverage Ratio\)](#)
 - [N.1.1. DSCR Base Case — 10 Năm](#)

- [N.1.2. Ba Phương án Tái cấu trúc Nợ](#)
 - [N.1.3. DSCR Phương án C \(Extended 16Y\)](#)
- [N.2. Cấu trúc Vốn Chi tiết](#)
 - [N.2.1. Equity Bridge](#)
 - [N.2.2. Debt Structure](#)
 - [N.2.3. Lease Structure](#)
 - [N.2.4. Grant Sources](#)
- [N.3. Stress Test — Chỉ huy động 70% Vốn](#)
 - [N.3.1. Kích bản 70%](#)
 - [N.3.2. Tối ưu cho 33,25M](#)
- [PHỤ LỤC O: ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHIẾN LƯỢC](#)
 - [O.1. Phương pháp Đánh giá](#)
 - [O.2. Chi tiết từng Loại Giá trị](#)
 - [O.2.1. Real Options — Quyền Mở rộng P3-P4](#)
 - [O.2.2. Barrier to Entry](#)
 - [O.2.3. Ecosystem Synergy](#)
 - [O.2.4. Platform Value](#)
 - [O.2.5. Tax + Land Rent Incentives](#)
 - [O.3. So sánh V1 vs V2.1 Chi tiết](#)
- [PHỤ LỤC P: MÔ HÌNH DOANH THU CNC OUTSOURCING CHI TIẾT](#)
 - [P.1. Cấu Trúc Giá Giờ Máy \(Machine Hour Rate\)](#)
 - [P.2. Doanh Thu Theo Máy](#)
 - [P.3. Cơ Cấu Sản Phẩm Theo Ngành \(Product Mix Evolution\)](#)
 - [P.4. Cấu Trúc Hợp Đồng và Điều Khoản Thanh Toán](#)
 - [P.5. Ba Kịch Bản Doanh Thu CNC Chi Tiết](#)
 - [P.6. CAPEX CNC Chi Tiết \(CNC-Specific Investment\)](#)
 - [P.7. Hệ Thống Phần Mềm CNC](#)
 - [P.8. Nhân Sự CNC Chi Tiết](#)
- [PHỤ LỤC Q: THIẾT KẾ XƯỞNG CNC TỐI ƯU VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ](#)
 - [Q.1. Thiết Kế Mặt Bằng Xưởng CNC 4.000 m²](#)
 - [Q.2. Danh Mục Máy CNC Chi Tiết \(28 Máy\)](#)
 - [Q.3. Thiết Bị QA/QC Chi Tiết](#)
 - [Q.4. Hệ Thống Quản Lý Dao Cụ \(Tooling Management\)](#)
 - [Q.5. Ma Trận Rủi Ro CNC \(Risk Matrix\)](#)
- [PHỤ LỤC R: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG \(EIA\) — TỔ HỢP 3 KHỐI](#)
 - [R.1. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ QUY MÔ MÔI TRƯỜNG](#)
 - [R.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUY CHUẨN ÁP DỤNG](#)
 - [R.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NỀN](#)
 - [R.4. TÁC ĐỘNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG](#)
 - [R.5. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI A: DATACENTER](#)
 - [R.6. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI B: CNC OUTSOURCING](#)
 - [R.7. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI C: IoT/ROBOT + SMT](#)
 - [R.8. TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY \(CUMULATIVE IMPACT\) — TỔ HỢP 3 KHỐI](#)
 - [R.9. BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG — TỔ HỢP 3 KHỐI](#)
 - [R.10. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG](#)
 - [R.11. DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG](#)
 - [R.12. CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ](#)
 - [R.13. BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH EIA V1.0 vs V2.0](#)
- [PHỤ LỤC S: VẬN HÀNH DATACENTER MACC — CHI TIẾT KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI](#)
 - [S.1. Tổng quan Datacenter MACC \(Mekong AI Cloud Center\)](#)
 - [S.1.1. Tầm nhìn và Định vị](#)
 - [S.1.2. Thông số Kỹ thuật Tổng hợp](#)

- [S.1.3. Kiến trúc Vật lý DC](#)
- [S.2. Hệ thống Điện DC — Chi tiết](#)
 - [S.2.1. Sơ đồ Cung cấp Điện \(Single Line Diagram — Simplified\)](#)
 - [S.2.2. Thông số UPS](#)
 - [S.2.3. Thông số Generator](#)
- [S.3. Hệ thống Làm mát DC](#)
 - [S.3.1. Chiến lược Cooling theo Zone](#)
 - [S.3.2. Thiết bị Cooling](#)
 - [S.3.3. PUE Analysis](#)
- [S.4. SLA \(Service Level Agreement\)](#)
 - [S.4.1. SLA Framework](#)
 - [S.4.2. SLA Parameters Chi tiết](#)
 - [S.4.3. Penalty và Credit Calculation](#)
- [S.5. Hệ thống Mạng và Kết nối](#)
 - [S.5.1. Kiến trúc Mạng](#)
 - [S.5.2. Thông số Mạng](#)
 - [S.5.3. Latency Matrix \(Estimated\)](#)
- [S.6. Vận hành NOC 24/7](#)
 - [S.6.1. Cơ cấu Ca trực NOC](#)
 - [S.6.2. Hệ thống Monitoring](#)
 - [S.6.3. Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn \(SOPs\)](#)
- [S.7. Mô hình Kinh doanh DC — Dự phóng 10 Năm](#)
 - [S.7.1. Kích bản Lắp đầy \(Fill Rate\)](#)
 - [S.7.2. Revenue DC theo Năm](#)
 - [S.7.3. P&L DC — Tóm tắt](#)
 - [S.7.4. CAPEX DC Chi tiết](#)
- [S.8. Chứng nhận và Compliance DC](#)
 - [S.8.1. Lộ trình Chứng nhận DC](#)
 - [S.8.2. Compliance Requirements](#)
- [PHỤ LỤC T: SẢN PHẨM IOT/ROBOT — THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT](#)
 - [T.1. Tổng quan Danh mục Sản phẩm IoT/Robot](#)
 - [T.1.1. Product Portfolio Matrix](#)
 - [T.2. MK-200 IoT Gateway — Thông số Kỹ thuật](#)
 - [T.2.1. Block Diagram](#)
 - [T.2.2. Specification Table](#)
 - [T.2.3. BOM Cost Breakdown](#)
 - [T.3. MK-300 IoT Gateway \(Nâng cao\) — Thông số Kỹ thuật](#)
 - [T.3.1. So sánh MK-200 vs MK-300](#)
 - [T.3.2. Use Case Matrix](#)
 - [T.4. Robot AMR-100 \(1 Tấn\) — Thông số Kỹ thuật](#)
 - [T.4.1. Specification Sheet](#)
 - [T.4.2. BOM Cost & Pricing](#)
 - [T.4.3. So sánh Cạnh tranh Robot AMR](#)
 - [T.5. MekongOS Platform — Kiến trúc Kỹ thuật](#)
 - [T.5.1. Architecture Overview](#)
 - [T.5.2. Pricing Tiers](#)
 - [T.5.3. Lộ trình Phát triển MekongOS](#)
 - [T.6. Chiến lược Sở hữu Trí tuệ \(IP Strategy\)](#)
 - [T.6.1. Danh mục IP Dự kiến](#)
 - [T.6.2. Ngân sách IP](#)
- [PHỤ LỤC U: PHÂN TÍCH RỦI RO TỔNG HỢP VÀ ĐỘ NHAY](#)
 - [U.1. Khung Phân tích Rủi ro \(Risk Framework\)](#)

- [U.1.1. Phương pháp luận](#)
 - [U.1.2. Ma trận Rủi ro \(Risk Heat Map\)](#)
- [U.2. Rủi ro Thị trường \(Market Risk\)](#)
 - [U.2.1. Bảng Rủi ro Thị trường Chi tiết](#)
 - [U.2.2. Phân tích Kịch bản Thị trường](#)
- [U.3. Rủi ro Vận hành \(Operational Risk\)](#)
 - [U.3.1. Bảng Rủi ro Vận hành Chi tiết](#)
 - [U.3.2. Expected Loss Calculation](#)
- [U.4. Phân tích Độ nhạy \(Sensitivity Analysis\)](#)
 - [U.4.1. Tornado Diagram — Tác động lên NPV](#)
 - [U.4.2. Breakeven Analysis](#)
 - [U.4.3. Monte Carlo Simulation — Kết quả](#)
- [U.5. Rủi ro Tài chính \(Financial Risk\)](#)
 - [U.5.1. Bảng Rủi ro Tài chính](#)
 - [U.5.2. Stress Test Tài chính](#)
- [U.6. Bảo hiểm và Chuyển giao Rủi ro](#)
 - [U.6.1. Chương trình Bảo hiểm](#)
- [U.7. Kế hoạch Ứng phó Rủi ro \(Contingency Plan\)](#)
 - [U.7.1. Trigger Events và Response](#)
- [PHỤ LỤC V: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH](#)
 - [V.1. Khung Quản trị \(Corporate Governance Framework\)](#)
 - [V.1.1. Cấu trúc Pháp nhân](#)
 - [V.1.2. Hội đồng Thành viên \(Members Council\)](#)
 - [V.1.3. Quy chế Quản trị](#)
 - [V.2. Hệ thống KPI & Báo cáo Quản trị](#)
 - [V.2.1. Balanced Scorecard — KPI Framework](#)
 - [V.2.2. KPI Chi tiết theo Phân khối](#)
 - [V.3. Hệ thống Quản lý Chất lượng Tích hợp \(IMS\)](#)
 - [V.3.1. Lộ trình Chứng nhận](#)
 - [V.3.2. Cấu trúc Tài liệu IMS](#)
 - [V.3.3. Chi phí Chứng nhận & Duy trì](#)
 - [V.4. Hệ thống IT & ERP](#)
 - [V.4.1. Kiến trúc IT Tổng thể](#)
 - [V.4.2. Phần mềm Chính](#)
 - [V.4.3. Lộ trình Chuyển đổi Số](#)
 - [V.5. Quản trị Chuỗi cung ứng \(Supply Chain Governance\)](#)
 - [V.5.1. Chiến lược Mua sắm](#)
 - [V.5.2. Đánh giá Nhà Cung cấp \(Supplier Scorecard\)](#)
 - [V.5.3. Kế hoạch Nội địa hóa](#)
 - [V.6. Quản trị Rủi ro & Tuân thủ \(GRC\)](#)
 - [V.6.1. Ba tuyến Phòng vệ \(Three Lines Model\)](#)
 - [V.6.2. Compliance Calendar](#)
- [PHỤ LỤC W: BENCHMARKING CẠNH TRANH VÀ THỊ TRƯỜNG ASEAN](#)
 - [W.1. Benchmarking CNC Outsourcing — ASEAN](#)
 - [W.1.1. So sánh Chi phí Sản xuất CNC](#)
 - [W.1.2. Competitive Positioning Map](#)
 - [W.1.3. CNC Competitor Profiles — Việt Nam](#)
 - [W.1.4. Khách hàng FDI Tiềm năng — CNC](#)
 - [W.2. Benchmarking Data Center — Khu vực](#)
 - [W.2.1. So sánh DC ASEAN](#)
 - [W.2.2. DC Market Size — Việt Nam](#)
 - [W.3. Benchmarking IoT — ASEAN](#)

- [W.3.1. IoT Gateway Market ASEAN](#)
 - [W.3.2. Robot AMR Market ASEAN](#)
 - [W.4. Phân tích PESTEL — Môi trường Kinh doanh VN 2025](#)
- [PHỤ LỤC X: KẾ HOẠCH MARKETING VÀ BÁN HÀNG CHI TIẾT](#)
 - [X.1. Chiến lược Marketing Tổng thể](#)
 - [X.1.1. Positioning Statement](#)
 - [X.1.2. Marketing Mix \(4P+3P\)](#)
 - [X.2. Kế hoạch Marketing theo Năm](#)
 - [X.2.1. Budget Marketing](#)
 - [X.2.2. Sales Pipeline Target](#)
 - [X.2.3. Kênh bán hàng theo BU](#)
 - [X.3. CRM & Customer Success](#)
 - [X.3.1. Customer Lifecycle](#)
 - [X.3.2. Customer Segmentation & Strategy](#)
 - [X.3.3. Key Performance Metrics](#)
- [PHỤ LỤC Y: CHI TIẾT XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH](#)
 - [Y.1. Master Plan — Bố trí Mặt bằng Tổng thể](#)
 - [Y.1.1. Thông số Khu đất](#)
 - [Y.1.2. Phân vùng Mặt bằng — Tòa nhà 3 Tầng trên 1 ha](#)
 - [Y.1.3. Bảng Diện tích Chi tiết](#)
 - [Y.2. Thiết kế Kết cấu Công trình](#)
 - [Y.2.1. Tiêu chuẩn Thiết kế](#)
 - [Y.2.2. Chi tiết Kết cấu theo Khối](#)
 - [Y.2.3. Tải trọng Thiết kế](#)
 - [Y.3. Tiến độ Xây dựng Chi tiết](#)
 - [Y.3.1. Gantt Chart — Phase 1](#)
 - [Y.3.2. Nhà thầu Dự kiến](#)
 - [Y.3.3. Chi phí Xây dựng Chi tiết](#)
 - [Y.4. Kiểm soát Chất lượng Xây dựng](#)
 - [Y.4.1. QC Checkpoints](#)
- [PHỤ LỤC Z: MẪU HỢP ĐỒNG VÀ KHUNG PHÁP LÝ](#)
 - [Z.1. Danh mục Hợp đồng Cần chuẩn bị](#)
 - [Z.1.1. Ma trận Hợp đồng theo Giai đoạn](#)
 - [Z.1.2. Khung Điều khoản Chính — CNC Master Service Agreement \(MSA\)](#)
 - [Z.1.3. Khung Điều khoản — DC Colocation SLA](#)
 - [Z.2. Khung Tuân thủ Pháp lý](#)
 - [Z.2.1. Checklist Tuân thủ Trước Vận hành](#)
 - [Z.2.2. Bảng Luật Áp dụng](#)
 - [Z.2.3. VSIC Codes Đăng ký](#)
- [PHỤ LỤC AA: CHUỖI CUNG ỨNG VÀ MUA SẴM \(SUPPLY CHAIN & PROCUREMENT\)](#)
 - [AA.1. Chiến lược Mua sắm Tổng thể](#)
 - [AA.1.1. Nguyên tắc Procurement](#)
 - [AA.1.2. Phân loại NCC theo Mô hình Kraljic](#)
 - [AA.2. Danh mục Nhà cung cấp Chiến lược](#)
 - [AA.2.1. Thiết bị CNC \(Khối B\)](#)
 - [AA.2.2. Vật tư CNC \(Phôi\)](#)
 - [AA.2.3. Thiết bị IoT/SMT \(Khối C\)](#)
 - [AA.2.4. Thiết bị Datacenter \(Khối A\)](#)
 - [AA.3. Quản lý Tồn kho và Logistics](#)
 - [AA.3.1. Phân loại Tồn kho theo ABC-XYZ](#)
 - [AA.3.2. KPI Tồn kho](#)
 - [AA.3.3. Logistics Inbound](#)

- [AA.3.4. Kho Vật tư — Thiết kế](#)
 - [AA.4. Quy trình Mua hàng \(Procurement Process\)](#)
 - [AA.4.1. Sơ đồ Quy trình](#)
 - [AA.4.2. Ma trận Thẩm quyền Phê duyệt](#)
 - [AA.5. Đánh giá Nhà cung cấp \(Supplier Scorecard\)](#)
- [PHỤ LỤC BB: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ TRI THỨC \(TRAINING ACADEMY & KNOWLEDGE MANAGEMENT\)](#)
 - [BB.1. Chiến lược Đào tạo Tổng thể](#)
 - [BB.1.1. Mô hình 70-20-10](#)
 - [BB.1.2. Ngân sách Đào tạo](#)
 - [BB.2. Chương trình Đào tạo theo Khối](#)
 - [BB.2.1. CNC Operator / Programmer Training Path](#)
 - [BB.2.2. IoT/Embedded Engineer Training Path](#)
 - [BB.2.3. Datacenter Operations Training Path](#)
 - [BB.3. Chương trình Đào tạo Chuyên sâu \(Specialized Training\)](#)
 - [BB.3.1. Chất lượng \(Quality\)](#)
 - [BB.3.2. An toàn và Môi trường \(EHS\)](#)
 - [BB.4. Quan hệ Đối tác Đào tạo \(Training Partnerships\)](#)
 - [BB.4.1. Chương trình Học bổng Mekong](#)
 - [BB.5. Hệ thống Quản lý Tri thức \(Knowledge Management System\)](#)
 - [BB.5.1. Nền tảng KMS](#)
 - [BB.5.2. Tài liệu Kỹ thuật Chuẩn hóa](#)
 - [BB.5.3. Chỉ số KM](#)
 - [BB.6. Lộ trình Triển khai KMS](#)
- [PHỤ LỤC CC: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TÍCH HỢP \(INTEGRATED QMS\)](#)
 - [CC.1. Lộ trình Chứng nhận Chất lượng](#)
 - [CC.1.1. Roadmap 5 năm](#)
 - [CC.1.2. Hệ thống Quản lý Tích hợp \(IMS — Integrated Management System\)](#)
 - [CC.2. Core Tools \(IATF 16949 Requirement\)](#)
 - [CC.2.1. APQP — Advanced Product Quality Planning](#)
 - [CC.2.2. PPAP — Production Part Approval Process \(18 Elements\)](#)
 - [CC.2.3. PFMEA — Process FMEA Template \(Ví dụ: CNC 5-axis Milling\)](#)
 - [CC.3. Hệ thống Đo lường và Kiểm tra \(Metrology & Inspection\)](#)
 - [CC.3.1. Phòng Đo CMM Clean Room](#)
 - [CC.3.2. Thiết bị Đo kiểm Chi tiết](#)
 - [CC.3.3. Kế hoạch Hiệu chuẩn \(Calibration Schedule\)](#)
 - [CC.4. Quản lý Không phù hợp và Cải tiến \(NCR & CAPA\)](#)
 - [CC.4.1. Quy trình NCR](#)
 - [CC.4.2. KPI Chất lượng](#)
- [PHỤ LỤC DD: LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 \(DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP\)](#)
 - [DD.1. Mô hình Trưởng thành Công nghiệp 4.0](#)
 - [DD.1.1. Industry 4.0 Maturity Model theo ACATECH \(6 cấp\)](#)
 - [DD.1.2. Digital Maturity Assessment — Baseline vs Target](#)
 - [DD.2. Hệ thống Phần mềm Tích hợp \(Integrated Software Architecture\)](#)
 - [DD.2.1. Kiến trúc Tổng thể](#)
 - [DD.2.2. Integration Matrix](#)
 - [DD.3. Ứng dụng AI/ML trong Sản xuất](#)
 - [DD.3.1. Use Cases theo Ưu tiên](#)
 - [DD.3.2. AI/ML Infrastructure](#)
 - [DD.4. Digital Twin](#)
 - [DD.4.1. Phạm vi Digital Twin theo Phase](#)
 - [DD.4.2. ROI của Digital Twin](#)

- [DD.5. Cybersecurity Framework](#)
 - [DD.5.1. Mô hình Bảo mật OT/IT](#)
 - [DD.5.2. Ngân sách Cybersecurity](#)
 - [DD.6. Lộ trình Triển khai \(5 Year Roadmap\)](#)
- [PHỤ LỤC EE: DÒNG TIỀN CHI TIẾT VÀ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH MỞ RỘNG \(DETAILED CASH FLOW & EXTENDED FINANCIAL MODEL\)](#)
 - [EE.1. Dòng tiền Tháng — Năm 1 \(Construction + Ramp-up\)](#)
 - [EE.1.1. CAPEX Disbursement Schedule \(Y1 Monthly — K USD\)](#)
 - [EE.1.2. Revenue Ramp-up Y1 \(Monthly — K USD\)](#)
 - [EE.2. Dòng tiền Năm — 10 năm \(K USD\)](#)
 - [EE.2.1. Revenue Projection by BU](#)
 - [EE.2.2. EBITDA & Net Income Projection](#)
 - [EE.2.3. Free Cash Flow \(FCF\) & Valuation](#)
 - [EE.2.4. Valuation Summary](#)
 - [EE.3. Phân tích Nhạy \(Sensitivity\)](#)
 - [EE.3.1. Tornado Chart — Impact trên NPV](#)
 - [EE.3.2. Monte Carlo Simulation Results \(10.000 iterations\)](#)
 - [EE.4. Cơ cấu Vốn và Huy động](#)
 - [EE.4.1. Cơ cấu Vốn đề xuất](#)
 - [EE.4.2. Lịch trả nợ \(Debt Amortization — K USD\)](#)
- [PHỤ LỤC FF: QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PMO \(PROJECT MANAGEMENT OFFICE\)](#)
 - [FF.1. Cơ cấu Tổ chức PMO](#)
 - [FF.1.1. Sơ đồ PMO](#)
 - [FF.1.2. Ma trận RACI — PMO](#)
 - [FF.2. Master Schedule \(Tổng tiến độ\)](#)
 - [FF.2.1. Milestone chính \(27 tháng\)](#)
 - [FF.2.2. Gantt Chart tóm tắt](#)
 - [FF.3. Quản lý Rủi ro Dự án \(Project Risk Register\)](#)
 - [FF.4. Quản lý Thay đổi \(Change Management\)](#)
 - [FF.4.1. Quy trình Change Order](#)
 - [FF.4.2. Ma trận Phê duyệt Change Order](#)
 - [FF.5. Báo cáo và Dashboard \(PMO Reporting\)](#)
 - [FF.5.1. Tần suất Báo cáo](#)
 - [FF.5.2. Earned Value Metrics](#)
 - [FF.6. Handover & Commissioning Protocol](#)
 - [FF.6.1. Checklist Handover \(per Area\)](#)
 - [FF.6.2. Tiêu chí Nghiệm thu \(Acceptance Criteria\)](#)
- [PHỤ LỤC GG: CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG VÀ CRM \(CUSTOMER STRATEGY & CRM\)](#)
 - [GG.1. Phân khúc Khách hàng theo Khối](#)
 - [GG.1.1. CNC Outsourcing — Khách hàng Mục tiêu](#)
 - [GG.1.2. Datacenter — Khách hàng Mục tiêu](#)
 - [GG.1.3. IoT/Robot — Khách hàng mục tiêu](#)
 - [GG.2. Customer Journey Map \(CNC Example\)](#)
 - [GG.2.1. Stages](#)
 - [GG.2.2. Sales Pipeline — CNC \(Target Y1-Y3\)](#)
 - [GG.3. Hệ thống CRM](#)
 - [GG.3.1. CRM Platform Selection](#)
 - [GG.3.2. CRM KPI](#)
 - [GG.4. Pricing Strategy Chi tiết](#)
 - [GG.4.1. CNC Pricing Model](#)
 - [GG.4.2. Machine Hour Rate Calculation](#)
- [PHỤ LỤC HH: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ \(OPERATIONS & MAINTENANCE PLAN\)](#)

- [HH.1. Mô hình Vận hành Tổng thể](#)
 - [HH.1.1. Ca Làm việc](#)
 - [HH.1.2. OEE Target theo Khối](#)
 - [HH.1.3. Phân tích OEE chi tiết \(CNC 5-axis — Target Y3\)](#)
- [HH.2. Kế hoạch Bảo trì Phòng ngừa \(Preventive Maintenance\)](#)
 - [HH.2.1. PM Schedule — CNC Machines](#)
 - [HH.2.2. PM Schedule — DC M&E](#)
 - [HH.2.3. Spare Parts Strategy](#)
- [HH.3. KPI Vận hành Tổng hợp](#)
 - [HH.3.1. Balanced Scorecard](#)
- [HH.4. Quản lý Năng lượng \(Energy Management\)](#)
 - [HH.4.1. Dự toán Chi phí Năng lượng](#)
 - [HH.4.2. Tiết kiệm Năng lượng \(Energy Saving Initiatives\)](#)
- [PHỤ LỤC II: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU VÀ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ \(EXPORT & INTERNATIONAL MARKET STRATEGY\)](#)
 - [II.1. Phân tích Thị trường Xuất khẩu](#)
 - [II.1.1. Thị trường CNC Outsourcing — Quy mô & Tăng trưởng](#)
 - [II.1.2. Lợi thế Cạnh tranh VN vs Đối thủ](#)
 - [II.1.3. IoT/Robot — Thị trường Xuất khẩu ASEAN](#)
 - [II.2. Quy trình Xuất khẩu](#)
 - [II.2.1. Preparation Checklist \(trước khi xuất khẩu\)](#)
 - [II.2.2. Logistics Outbound](#)
 - [II.2.3. Thuế FTA — Áp dụng cho Sản phẩm Mekong](#)
 - [II.3. Chiến lược Thâm nhập Thị trường](#)
 - [II.3.1. Go-to-Market theo Thị trường](#)
 - [II.3.2. Ngân sách Marketing Quốc tế](#)
- [PHỤ LỤC JJ: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI \(SOCIO-ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT\)](#)
 - [JJ.1. Đóng góp Kinh tế Vĩ mô](#)
 - [JJ.1.1. Đóng góp GDP và Thu ngân sách](#)
 - [JJ.1.2. Tạo Việc làm](#)
 - [JJ.1.3. Chuyển giao Công nghệ](#)
 - [JJ.2. Tác động Xã hội](#)
 - [JJ.2.1. Phát triển Nguồn nhân lực](#)
 - [JJ.2.2. Tác động Môi trường \(EIA Summary\)](#)
 - [JJ.2.3. CSR & Cộng đồng](#)
 - [JJ.3. Phân tích Chi phí - Lợi ích \(Cost-Benefit Analysis — CBA\)](#)
 - [JJ.3.1. CBA từ góc nhìn Nhà nước \(10 năm\)](#)
 - [JJ.3.2. So sánh với Dự án FDI khác tại KCNC](#)
- [PHỤ LỤC KK: QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CHẤT THẢI TOÀN DIỆN \(COMPREHENSIVE WATER & WASTE MANAGEMENT\)](#)
 - [KK.1. Cân bằng Nước Tổng thể \(Water Balance\)](#)
 - [KK.1.1. Nhu cầu Nước theo Khối](#)
 - [KK.1.2. Sơ đồ Xử lý Nước](#)
 - [KK.2. Hệ thống ZLD \(Zero Liquid Discharge\) cho CNC](#)
 - [KK.2.1. Quy trình ZLD](#)
 - [KK.2.2. Thông số Vận hành ZLD](#)
 - [KK.3. Quản lý Chất thải](#)
 - [KK.3.1. Phân loại Chất thải](#)
 - [KK.3.2. Lộ trình Circular Economy](#)
- [PHỤ LỤC LL: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG PHASE 2-3 \(EXPANSION ROADMAP\)](#)
 - [LL.1. Tổng quan Phase](#)
 - [LL.1.1. Master Plan 3 Phase](#)

- [LL.1.2. Trigger điều kiện mở rộng](#)
- [LL.2. Phase 2 — Chi tiết](#)
 - [LL.2.1. CNC Expansion \(Khối B — Phase 2\)](#)
 - [LL.2.2. DC Expansion \(Khối A — Phase 2\)](#)
 - [LL.2.3. IoT/SMT Expansion \(Khối C — Phase 2\)](#)
 - [LL.2.4. Tổng CAPEX Phase 2](#)
- [LL.3. Phase 3 — Định hướng](#)
 - [LL.3.1. GPU/AI Datacenter](#)
 - [LL.3.2. Advanced Manufacturing](#)
- [LL.4. Phát triển Quỹ đất](#)
 - [LL.4.1. Quy hoạch Sử dụng Đất 1 ha \(V2.1\)](#)
- [PHỤ LỤC MM: BẢNG TỔNG HỢP CHỈ SỐ TOÀN DỰ ÁN \(MASTER KPI DASHBOARD\)](#)
 - [MM.1. Financial KPIs — 10 Year Summary](#)
 - [MM.2. Operational KPIs](#)
 - [MM.3. ESG & Sustainability KPIs](#)
 - [MM.4. Investment Summary](#)
 - [MM.5. Số liệu Quy chiếu \(Cross-Check Reference\)](#)
- [PHỤ LỤC NN: CHI TIẾT KỸ THUẬT THIẾT BỊ & DATASHEET \(EQUIPMENT SPECIFICATIONS\)](#)
 - [NN.1. CNC Machine Specifications — So sánh Nhà cung cấp](#)
 - [NN.1.1. CNC 5-Axis Comparison Matrix](#)
 - [NN.1.2. CNC 3-Axis \(Vertical Machining Center\)](#)
 - [NN.1.3. CNC Turning Center](#)
 - [NN.2. Datacenter Equipment Specifications](#)
 - [NN.2.1. Server Rack & Power Distribution](#)
 - [NN.2.2. UPS Specifications](#)
 - [NN.2.3. Precision Cooling](#)
 - [NN.3. IoT/SMT Line Equipment](#)
 - [NN.3.1. SMT Line Configuration](#)
 - [NN.3.2. Test Equipment — IoT Products](#)
 - [NN.4. QA/QC Equipment — Updated List](#)
- [PHỤ LỤC OO: CHIẾN LƯỢC THOÁI VỐN & QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ \(EXIT STRATEGY & INVESTOR RELATIONS\)](#)
 - [OO.1. Các Kịch bản Thoái vốn \(Exit Scenarios\)](#)
 - [OO.1.1. Ma trận Exit](#)
 - [OO.1.2. Điều kiện IPO chi tiết](#)
 - [OO.1.3. Valuation ước tính theo năm](#)
 - [OO.2. Lộ trình IPO \(nếu áp dụng\)](#)
 - [OO.2.1. Timeline 36 tháng \(Y5 bắt đầu, Y7 listing\)](#)
 - [OO.3. Investor Relations Framework](#)
 - [OO.3.1. Báo cáo định kỳ](#)
 - [OO.3.2. Chính sách Minh bạch](#)
 - [OO.4. Cấu trúc Cổ đông Dự kiến](#)
 - [OO.4.1. Phase 1 \(Y0-Y3\)](#)
 - [OO.4.2. Pre-IPO \(Y4-Y6\)](#)
 - [OO.4.3. Post-IPO \(Y7+\)](#)
 - [OO.5. M&A Scenarios — Strategic Buyer Profile](#)
 - [OO.5.1. Potential Strategic Acquirers](#)
 - [OO.5.2. M&A Readiness Checklist](#)
 - [OO.6. Dividend Policy](#)
- [PHỤ LỤC PP: AN TOÀN LAO ĐỘNG & ỨNG PHÓ KHẨN CẤP \(EHS & EMERGENCY RESPONSE\)](#)
 - [PP.1. Khung Quản lý EHS](#)
 - [PP.1.1. Cơ cấu Tổ chức EHS](#)
 - [PP.1.2. Hệ thống Quản lý EHS \(ISO 45001:2018\)](#)

- [PP.2. Nhận diện Mối nguy theo Khối](#)
 - [PP.2.1. Khối A — Datacenter](#)
 - [PP.2.2. Khối B — CNC Workshop](#)
 - [PP.2.3. Khối C — IoT/SMT](#)
- [PP.3. Ma trận PPE theo Khu vực](#)
- [PP.4. Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp](#)
 - [PP.4.1. Phân loại Sự cố](#)
 - [PP.4.2. Quy trình Sơ tán](#)
 - [PP.4.3. Hệ thống Cứu hỏa theo Khối](#)
- [PP.5. KPI An toàn Lao động](#)
- [PHỤ LỤC QQ: QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PMO \(PROJECT MANAGEMENT OFFICE\)](#)
 - [QQ.1. Cấu trúc PMO](#)
 - [QQ.1.1. Mô hình PMO](#)
 - [QQ.1.2. Governance Structure](#)
 - [QQ.2. Work Breakdown Structure \(WBS\) — Level 3](#)
 - [QQ.2.1. WBS Summary](#)
 - [QQ.3. Earned Value Management \(EVM\) — Tracking Framework](#)
 - [QQ.3.1. EVM Metrics](#)
 - [QQ.3.2. EVM Baseline — CAPEX Phân bổ theo Quý](#)
 - [QQ.3.3. Reporting Cadence](#)
 - [QQ.4. Quản lý Thay đổi \(Change Management\)](#)
 - [QQ.4.1. Change Control Process](#)
 - [QQ.4.2. Contingency Budget](#)
- [PHỤ LỤC RR: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ \(OPERATIONS & MAINTENANCE PLAN\)](#)
 - [RR.1. Cấu trúc Vận hành](#)
 - [RR.1.1. Ca làm việc](#)
 - [RR.1.2. Headcount theo Ca \(Y3 Full Operations\)](#)
 - [RR.2. Bảo trì Phòng ngừa \(Preventive Maintenance — PM\)](#)
 - [RR.2.1. PM Schedule — CNC Machines](#)
 - [RR.2.2. PM Schedule — Datacenter M&E](#)
 - [RR.2.3. Spare Parts Strategy](#)
 - [RR.2.4. CMMS \(Computerized Maintenance Management System\)](#)
 - [RR.2.5. KPI Bảo trì](#)
 - [RR.3. Quản lý Năng lượng \(Energy Management\)](#)
 - [RR.3.1. Phân bổ Điện năng/năm \(Y3 Full Operations\)](#)
 - [RR.3.2. Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng](#)
- [BẢNG TỔNG KẾT TÀI LIỆU \(DOCUMENT SUMMARY\)](#)
 - [Thông tin Phiên bản](#)
 - [Tổng hợp Phụ lục](#)
 - [Nhãn Dữ liệu \(Data Labels\)](#)
 - [Đối chiếu Số liệu Chính \(Cross-check Summary\) — V2.1](#)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

MEKONG TECHNOLOGY

TỔ HỢP CÔNG NGHỆ CAO ĐA NGÀNH

Nghiên cứu, Phát triển, Sản xuất Thiết bị IoT/Robot, Hạ tầng Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác và Điện toán Đám mây AI Phục vụ Hệ sinh thái Chuyển đổi số và Công nghiệp Bán dẫn

DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO

Theo Mẫu số 1.4 — Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP

PHIÊN BẢN: V2.1 — Phương án 1 ha / 5 Giai đoạn / 15 năm Đầu tư

NGÀY HOÀN THÀNH: Tháng 03/2026

BẢN TRƯỚC: V2.0 (3 Trụ cột, 15 ha, 2 giai đoạn — thay thế)

Thông tin	Nội dung
Chủ đầu tư	Công ty TNHH Mekong Technology
Tổng Giám đốc	Ông Phạm Xuân Quốc
Địa điểm	Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM
Diện tích đất	1 ha (10.000 m ²), 1 tòa nhà 3 tầng — GFA 21.000 m ²
Tổng vốn đầu tư	47.500.000 USD
Vốn chủ sở hữu	34.970.000 USD (bao gồm vốn vận hành)
Thời hạn	50 năm (01/2025 — 12/2075)
Lĩnh vực	Vi điện tử — CNTT — Viễn thông; Cơ khí chính xác — Tự động hóa

NƠI NỘP:

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP)
Lô T2-4, Đường D1, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

MỤC LỤC TỔNG THỂ

PHẦN MỞ ĐẦU

- [Thông tin Dự án](#)
- [Tóm tắt Điều hành \(Executive Summary\)](#)
- [Cơ sở Pháp lý của Đề án](#)

PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG

- [1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu](#)
- [1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM](#)
- [1.3. Thị trường IoT và Robot Tự hành \(B.U gốc\)](#)
- [1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác \(B.U mới\)](#)
- [1.5. Thị trường Trung tâm Dữ liệu và Điện toán AI \(B.U mới\)](#)
- [1.6. Định vị Cạnh tranh Tổng thể](#)

PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

- [2.1. Tổng quan 3 Trụ cột Sản phẩm](#)
- [2.2. Trụ cột 1 — Sản xuất Thiết bị IoT Gateway và Robot AMR/AGV/OHT](#)
- [2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác \(MPMC\)](#)
- [2.4. Trụ cột 3 — Hạ tầng Điện toán Đám mây AI \(MACC\)](#)
- [2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 3 Trụ cột](#)
- [2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ \(TRL\)](#)
- [2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển \(R&D\)](#)

PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH

- [3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu 3 Trụ cột](#)
- [3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận](#)
- [3.3. Chiến lược Phát triển Ba giai đoạn](#)
- [3.4. Kênh Phân phối và Đối tác Chiến lược](#)

PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- [4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng \(Master Layout\)](#)
- [4.2. Khu vực Datacenter — Tầng 2 \(MACC\)](#)
- [4.3. Khu vực CNC — Tầng 1 \(MPMC\)](#)
- [4.4. Khu vực IoT/Robot — Tầng 1 \(SMT\)](#)
- [4.5. Hệ thống Điện Tổng hợp](#)
- [4.6. Hệ thống Cấp thoát Nước và Giải pháp Nước cấp](#)
- [4.7. Hệ thống Phòng cháy Chữa cháy \(PCCC\)](#)
- [4.8. An toàn Lao động](#)

PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

- [5.1. Tổng vốn Đầu tư \(CAPEX\)](#)
- [5.2. Cấu trúc Vốn và Nguồn lực Tài chính](#)
- [5.3. Kế hoạch Doanh thu 10 năm](#)
- [5.4. Báo cáo Kết quả Kinh doanh \(P&L\) Dự phóng](#)
- [5.5. Dòng tiền \(Cash Flow\) Dự phóng 10 năm](#)
- [5.6. Chỉ số Thấm định Đầu tư](#)
- [5.7. Phân tích Nhạy cảm và Kịch bản](#)
- [5.8. Phân tích Giá trị Chiến lược](#)
- [5.9. So sánh Đề án Gốc 20M và Phương án Mở rộng 47,50M](#)

PHẦN VI: PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG

- [6.1. Khung Pháp lý Áp dụng](#)
- [6.2. Phân tích Pháp lý 3 Trụ cột](#)
- [6.3. Chiến lược Định vị Pháp lý](#)
- [6.4. Lộ trình Thủ tục Hành chính 18 Giấy phép](#)
- [6.5. Đánh giá Tác động Môi trường \(ĐTM\)](#)
- [6.6. Cam kết Bảo vệ Môi trường](#)

PHẦN VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC

- [7.1. Sơ đồ Tổ chức 3 Trụ cột](#)
- [7.2. Đội ngũ Quản lý Hiện tại](#)
- [7.3. Vị trí Then chốt Cần Tuyển dụng](#)
- [7.4. Kế hoạch Tuyển dụng và Đào tạo](#)

PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

- [8.1. Phân kỳ Đầu tư](#)
- [8.2. Lộ trình Triển khai \(Timeline\)](#)
- [8.3. Các mốc Quan trọng \(Milestones\)](#)
- [8.4. Phân tích Rủi ro và Biện pháp Giảm thiểu](#)

PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- [9.1. Tổng kết Giá trị Dự án](#)
- [9.2. So sánh Chiến lược: Tại sao Mở rộng là Quyết định Đúng](#)
- [9.3. Kiến nghị](#)

PHỤ LỤC

- [Phụ lục A: Chi tiết CAPEX theo Hạng mục và Giai đoạn](#)
- [Phụ lục B: Danh mục Máy móc Thiết bị](#)
- [Phụ lục C: Mẫu Văn bản Pháp lý](#)
- [Phụ lục D: Bảng Viện dẫn Pháp lý Tổng hợp](#)
- [Phụ lục E: Từ điển Thuật ngữ](#)
- [Phụ lục F: Phân tích Tài chính Chi tiết](#)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tổng quan Dự án

Mục	Nội dung
Tên dự án	Mekong Technology — Tổ hợp Nghiên cứu, Phát triển, Sản xuất Thiết bị IoT/Robot và Hạ tầng Công nghệ cao Tích hợp

Mục	Nội dung
	(Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác & Điện toán Đám mây AI) Phục vụ Hệ sinh thái Chuyển đổi số và Công nghiệp Bán dẫn
Tên tiếng Anh	Mekong Technology — Integrated High-Tech Complex for IoT/Robot Manufacturing, Ultra-Precision Machining and AI Cloud Computing
Tên viết tắt	Tổ hợp CNC Mekong
Loại dự án	Dự án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao
Chủ đầu tư	Công ty TNHH Mekong Technology
Mã số thuế	[Chờ cập nhật]
Đại diện pháp luật	Ông Phạm Xuân Quốc — Tổng Giám đốc

Thông tin Địa điểm

Mục	Nội dung
Địa chỉ	Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM
Phường/Quận	Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Diện tích lô đất	1 ha (10.000 m ²)
Mật độ xây dựng	70% (7.000 m ² footprint), chiều cao tối đa 14 m
Tòa nhà	1 tòa nhà 3 tầng (6m + 4m + 4m = 14m), GFA 21.000 m ²
Tầng 1 (6m)	CNC Workshop 3.000 m ² + Datacenter 1.500 m ² + M&E/Kho 2.500 m ²
Tầng 2 (4m)	IoT/SMT 2.500 m ² + Clean Room 1.000 m ² + Lắp ráp/QC 2.500 m ² + Hành lang 1.000 m ²
Tầng 3 (4m)	Văn phòng 2.500 m ² + R&D Lab 1.500 m ² + Đào tạo/Căn tin/Hội nghị 2.000 m ² + Phụ trợ 1.000 m ²
Diện tích sân bãi	3.000 m ² (bãi xe, cây xanh, đường nội bộ, trạm biến áp, lane PCCC)
Cơ quan quản lý	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP)

Thông tin Đầu tư

Mục	Giá trị	Ghi chú
Tổng vốn đầu tư	47.500.000 USD	CAPEX toàn dự án [C]
Vốn chủ sở hữu (Phase 0-3)	34.970.000 USD	100% equity cho 10 năm đầu, không vay ngân hàng [C]
Vốn vay (Phase 4, từ Y10)	12.530.000 USD	Chỉ giải ngân khi có revenue proof từ IoT + CNC [C]

Mục	Giá trị	Ghi chú
Tổng vốn CSH cam kết	34.970.000 USD	Bao gồm CAPEX + working capital + bù lỗ ramp-up [C]
Trợ cấp/Ưu đãi	~3.000.000 USD	R&D Grant + Tax incentive (ước tính) [A]
Thời hạn hoạt động	50 năm	01/2025 — 12/2075

Phạm vi Lĩnh vực

Lĩnh vực KCNC	Trụ cột	Nội dung hoạt động
Vi điện tử — CNTT — Viễn thông	Trụ cột 1 (IoT/Robot)	Nghiên cứu, sản xuất IoT Gateway, Robot AMR/AGV, OHT
Vi điện tử — CNTT — Viễn thông	Trụ cột 3 (MACC)	Hạ tầng điện toán đám mây, AI Computing, IoT Cloud
Cơ khí chính xác — Tự động hóa	Trụ cột 1 (IoT/Robot)	Lắp ráp Robot, hệ thống tự động hóa
Cơ khí chính xác — Tự động hóa	Trụ cột 2 (MPMC)	Chế tạo linh kiện siêu chính xác (dung sai ≤ 5 micromet)

Phân kỳ Đầu tư

Giai đoạn	Thời gian	Vốn đầu tư	Nội dung chính	Nguồn vốn
Phase 0	Y0 — Y2	2.500.000 USD	Pháp lý, thiết kế, san lấp mặt bằng, giấy phép xây dựng	CSH
Phase 1	Y2 — Y5	8.000.000 USD	Xây dựng khung nhà xưởng 3 tầng (shell only, chưa lắp thiết bị)	CSH
Phase 2	Y5 — Y7	8.000.000 USD	Hoàn thiện Tầng 2+3 (IoT/SMT + VP/R&D) + mua thiết bị IoT	CSH
Phase 3	Y7 — Y10	16.000.000 USD	Hoàn thiện Tầng 1 khu CNC + mua 15 máy CNC 5 trục	CSH + Revenue
Phase 4	Y10 — Y13	13.000.000 USD	Hoàn thiện Tầng 1 khu DC + mở rộng CNC lên 28 máy	Vay + Revenue
Tổng	Y0 — Y13	47.500.000 USD	Thời gian đầu tư toàn bộ: 13–15 năm	

Nguyên tắc tài chính: Y0–Y9 tự chủ 100% vốn CSH (34,97M USD). Vay ngân hàng chỉ giải ngân từ Y10

khi đã có doanh thu chứng minh (revenue proof) từ IoT và CNC.

Chỉ số Tài chính Tổng hợp

Chỉ số	Giá trị	Kỳ hạn	Nhãn
NPV (WACC = 12%)	1.500.000 USD	50 năm	[C]
IRR	13,0%	50 năm	[C]
Breakeven (hoà vốn tích lũy)	Năm thứ 13	—	[C]
Doanh thu năm 10	14.500.000 USD	—	[C]
Doanh thu năm 15 (ổn định)	32.000.000 USD	—	[C]
Doanh thu tích lũy 15 năm	165.000.000 USD	—	[C]
EBITDA margin (ổn định)	~28%	Từ năm 13+	[C]
Giá trị Chiến lược (Adjusted)	15.780.000 USD	—	[C]
WACC	12%	—	[C]
Nhân sự (ổn định)	250 — 300 người	Từ năm 13	[C]
Thuê đất KCNC	120.000 USD/năm	Miễn 11 năm đầu	[B]

Ghi chú quan trọng: Do phương án đầu tư dàn trải 13 năm với 5 năm xây dựng shell trước, NPV(20Y) âm (-5,3M) vì chưa thu hồi đủ. NPV chỉ dương khi xét chiết khấu dài hạn 50 năm phù hợp với thời hạn thuê đất KCNC. IRR(50Y) = 13,0% > WACC 12% → dự án có giá trị.

Quy ước nhãn dữ liệu: [C] = Calculated (tính toán từ mô hình tài chính, ghi rõ công thức); [B] = Benchmarked (tham chiếu thị trường, ghi rõ nguồn); [A] = Assumed (giả định, ghi rõ lý do).

Bảng Sản phẩm Tổng hợp (Giai đoạn Ổn định — Từ năm 4)

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Thông số kỹ thuật	Quy mô/năm	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	VA (%)	Cơ sở PL (QĐ 38/2020)
1	IoT Gateway MK-200/300	1	ARM Cortex-A78, 8GB RAM, AI Edge, 5G-ready	5.000 thiết bị	10,00	35%	Phụ lục II, Mục 1.1
2	Robot AMR-500/1000	1	LiDAR 3D, AI SLAM, tải 500-1.000 kg	200 bộ	5,00	40%	Phụ lục II, Mục 2.1

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Thông số kỹ thuật	Quy mô/năm	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	VA (%)	Cơ sở PL (QĐ 38/2020)
3	Robot AGV-500/1000	1	Vision-based, tải 500-1.000 kg	100 bộ	4,00	35%	Phụ lục II, Mục 2.1
4	Robot OHT-100	1	Dual rail, 100 kg, 4 trục	50 bộ	2,50	30%	Phụ lục II, Mục 2.2
5	Linh kiện khuôn mẫu bán dẫn	2	Dung sai ≤ 3 micromet, vật liệu NAK80/SKD11	5.000 chi tiết	2,50	45%	Phụ lục I, Mục 2
6	Linh kiện hàng không vũ trụ	2	Chứng nhận AS9100 Rev D, Titan Grade 5/Inconel 718	2.000 chi tiết	3,00	50%	Phụ lục I, Mục 2
7	Linh kiện ô tô điện	2	Chứng nhận IATF 16949, AI 6061-T6/SCM440	20.000 chi tiết	4,00	35%	Phụ lục I, Mục 2
8	Nền tảng AI/HPC Computing	3	NVIDIA DGX H100, GPU-as-a-Service	50 Rack	5,00	60%	Phụ lục I, Mục 1.3
9	Hạ tầng lưu trữ Tier III	3	Uptime 99,982%, Colocation	50 Rack	1,20	55%	Phụ lục I, Mục 1.2
10	MekongOS IoT Cloud (SaaS)	3	Nền tảng quản lý IoT, MQTT/OPC UA	2.000 thuê bao	3,00	70%	Phụ lục II, Mục 1.2
	Tổng cộng (ổn định, từ năm 7)				40,20	42%	

Ghi chú: Doanh thu ổn định (steady-state) đạt được từ năm thứ 7 khi tất cả 3 trụ cột hoạt động tối đa công suất. Trong giai đoạn ramp-up (năm 1-3), doanh thu trung bình khoảng 5,00-10,50 M USD/năm [C].

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Giới thiệu

Công ty TNHH Mekong Technology kính trình Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phương án mở rộng phạm vi hoạt động từ dự án sản xuất IoT/Robot (tổng vốn 20.000.000 USD) thành **Tổ hợp Công nghệ cao Đa ngành** (tổng vốn 47.500.000 USD) với 3 trụ cột kinh doanh:

- Trụ cột 1 — IoT/Robot** (giữ nguyên, tối ưu hóa): Nghiên cứu, sản xuất thiết bị IoT Gateway thông minh và Robot tự hành (AMR/AGV/OHT) phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất.
- Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác (MPMC)**: Xây dựng nhà máy CNC 5 trục đạt chuẩn IATF 16949 (ô tô) và AS9100 Rev D (hàng không vũ trụ), cung ứng linh kiện siêu chính xác (dung sai ≤ 5 micromet) cho chuỗi cung ứng FDI tại Việt Nam — lấp khoảng trống nghiêm trọng trong hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ quốc gia.
- Trụ cột 3 — Hạ tầng Điện toán Đám mây AI (MACC)**: Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Tier III với năng lực GPU Computing (NVIDIA DGX H100) phục vụ cộng đồng doanh nghiệp R&D bán dẫn, AI, Big Data trong Khu Công nghệ cao — cung cấp hạ tầng điện toán tại chỗ mà hiện tại KCNC chưa có.

Ba trụ cột hoạt động như một **Hệ sinh thái Tích hợp**: CNC chế tạo khung robot cho trụ cột IoT, Datacenter huấn luyện AI cho Robot SLAM, IoT giám sát hiệu suất toàn bộ nhà máy CNC — tạo thành vòng lặp giá trị khép kín không đối thủ nào có thể sao chép trong ngắn hạn.

Tầm nhìn Chiến lược

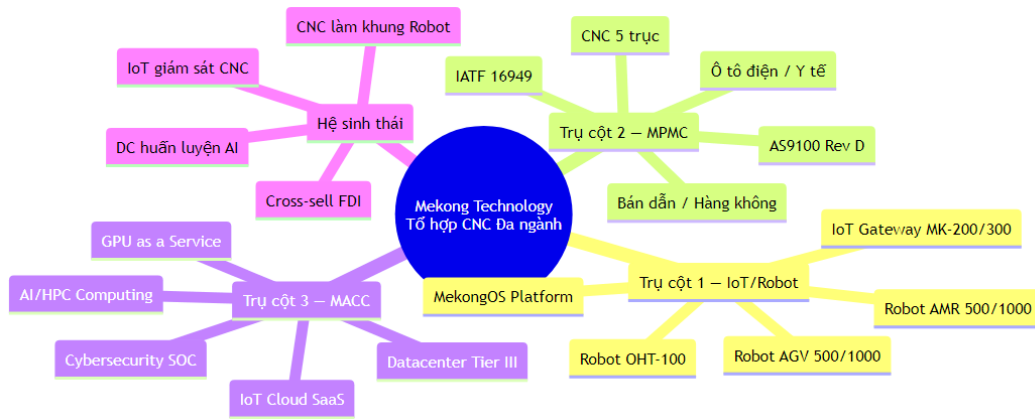


Diagram 1

Lý do Mở rộng

1. Khoảng trống Thị trường

Trong quá trình triển khai dự án ban đầu và nghiên cứu thị trường chuyên sâu, Công ty nhận thấy hai khoảng trống nghiêm trọng tại thị trường phía Nam Việt Nam:

Khoảng trống Cơ khí Chính xác: - Thị trường CNC Việt Nam đạt 1,85 tỷ USD (2024), tăng trưởng 13,1%/năm [B — Nguồn: Frost & Sullivan 2024] - Các doanh nghiệp FDI lớn (Samsung, Intel, Bosch, Nidec, VinFast) chi 295-455 triệu USD/năm cho gia công CNC tại khu vực phía Nam [B] - Chỉ có khoảng 15 xưởng CNC 5 trục tại miền Nam, KHÔNG CÓ xưởng nào đạt chuẩn AS9100 (hàng không vũ trụ) [B] - Chỉ có khoảng 12 cơ sở đạt IATF 16949 (ô tô), hầu hết thuộc sở hữu FDI [B] - Khoảng trống này buộc các nhà sản xuất phải gửi linh kiện ra nước ngoài, tăng lead time 4-8 tuần và chi phí logistics 15-25%

Khoảng trống Hạ tầng Điện toán AI: - Thị trường Datacenter Việt Nam đạt 1,1 tỷ USD (2024), dự báo 4,5 tỷ USD (2030), tăng trưởng 26%/năm [B — Nguồn: BMI Research 2024] - Phân khúc GPU-as-a-Service tăng từ 30 triệu USD lên 450 triệu USD (2024-2030), CAGR 57% [B] - KCNC TP.HCM hiện KHÔNG CÓ Trung tâm Dữ liệu nào cung cấp GPU Compute cho AI training - Các doanh nghiệp R&D bán dẫn, AI startup trong KCNC phải thuê Datacenter từ Viettel/FPT/CMC cách 20-30 km, chịu latency cao

2. Phù hợp Chiến lược Quốc gia

Phương án mở rộng hoàn toàn phù hợp với: - **Nghị quyết 52-NQ/TW** của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp hỗ trợ - **Quyết định 749/QĐ-TTg** của Thủ tướng về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030 - **Chiến lược Phát triển ngành Bán dẫn Việt Nam** — nhấn mạnh xây dựng hạ tầng công nghiệp hỗ trợ bán dẫn trong nước - **QĐ 38/2020/QĐ-TTg** — Cả 3 trụ cột đều nằm trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

3. Tối ưu hóa Hệ sinh thái

Việc vận hành 3 trụ cột trên cùng một mặt bằng 10.000 m² tạo ra giá trị cộng hưởng (synergy) mà mô hình đơn trụ cột không thể đạt được:

Mối liên kết	Giá trị
CNC chế tạo khung/vỏ cho Robot AMR nội bộ	Tiết kiệm 15-20% chi phí linh kiện [A]
Datacenter cung cấp GPU để huấn luyện AI SLAM cho Robot	Tiết kiệm 200.000-500.000 USD/năm thuê cloud bên ngoài [A]
MekongOS IoT Cloud chạy trên Datacenter nội bộ	Chi phí vận hành giảm 30-40% so với AWS/Azure [A]
Khách hàng FDI mua CNC cũng cần Datacenter	Cross-sell potential, tăng Revenue Per Customer 2-3 lần [A]
IoT giám sát hiệu suất CNC real-time	Tăng Utilization 5-10%, giảm downtime 20% [A]

Sơ đồ Hệ sinh thái Tích hợp

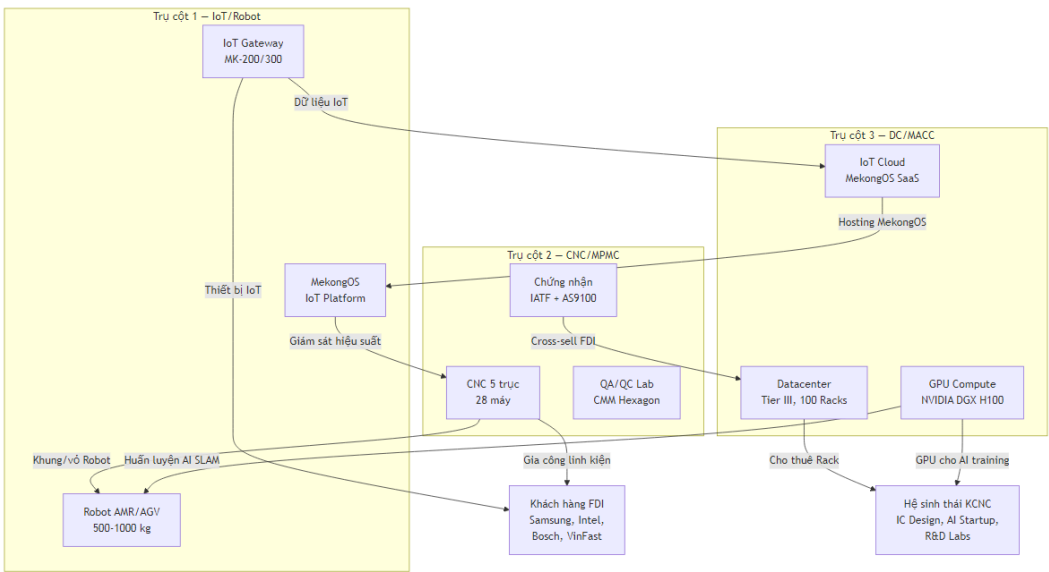


Diagram 2

Tóm tắt Tài chính

Cơ cấu Vốn Đầu tư (CAPEX = 47,50 M USD)

Phân bổ CAPEX theo Trụ cột (M USD)

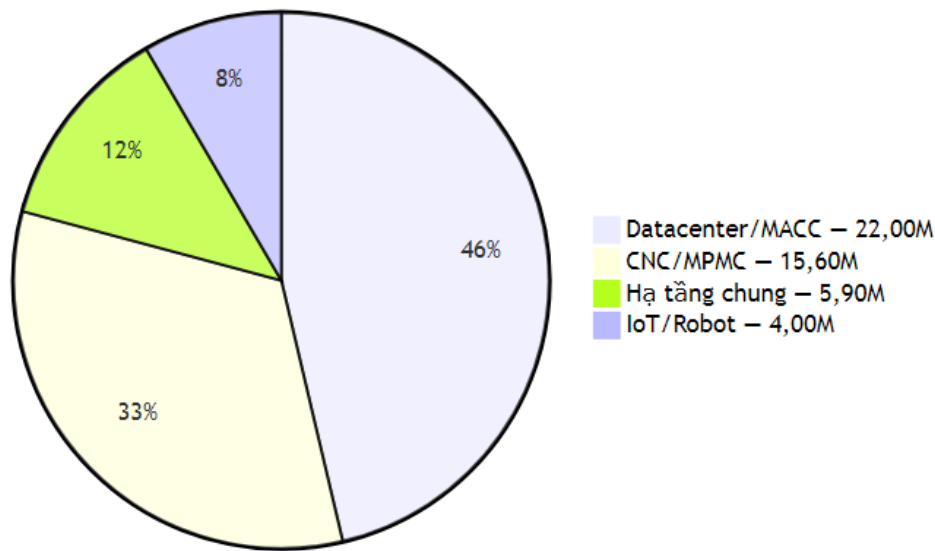


Diagram 3

Trụ cột	CAPEX (M USD)	Tỷ trọng	Phase 1	Phase 2
CNC / MPMC	15,60	33%	9,10	6,50
Datacenter / MACC	22,00	46%	13,50	8,50
IoT / Robot	4,00	8%	3,20	0,80
Hạ tầng chung	5,90	12%	3,10	2,80
Tổng	47,50	100%	28,90	18,60

Lưu ý: Hạ tầng chung (5,90 M USD) bao gồm: PCCC chung (534.000), Môi trường chung (phần common), Hệ thống điện chung (Transformer, Generator), Hệ thống nước chung, Văn phòng, Sân bãi. Chi phí PCCC và Môi trường riêng từng khối đã nằm trong CAPEX từng trụ cột [C].

Cấu trúc Vốn

Nguồn vốn	Giá trị (M USD)	Tỷ trọng	Chi phí vốn
Vốn chủ sở hữu (CAPEX)	23,10	49%	16% (cơ hội) [A]
Vốn vay ngân hàng	14,70	31%	9,5% [B — lãi suất VN 2025]
Thuê tài chính	6,20	13%	11% [B]
Tài trợ dự án	3,50	7%	0% (đối ứng)

Nguồn vốn	Giá trị (M USD)	Tỷ trọng	Chi phí vốn
Tổng CAPEX	47,50	100%	WACC = 12% [C]
Vốn CSH bổ sung (vận hành)	11,87	—	Working capital + bù lỗ ramp-up
Tổng cam kết CSH	34,97	—	

Bridging vốn CSH: Tổng vốn chủ sở hữu cần huy động = 34,97 M USD, gồm: CAPEX equity qua 5 giai đoạn (P0: 2,50 M + P1: 8,50 M + P2: 10,60 M + P3: 8,47 M + P4 equity: 4,90 M) + Working capital 5,50 M + Bù lỗ ramp-up Y5-Y7: 2,50 M + Buffer/Contingency 2,00 M [C]. Vay 12,53 M USD chỉ từ Y10 khi đã có doanh thu chứng minh.

Chỉ số Thẩm định

Chỉ số	Conservative	Base Case	Optimistic	Xác suất
NPV 50Y (M USD)	-3,20	1,50	12,80	—
IRR 50Y	10,5%	13,0%	16,5%	—
Xác suất xảy ra	25%	50%	25%	—
NPV trọng số xác suất		2,73		[C]

Chỉ số Bổ sung	Giá trị	Nhãn
Payback (chiết khấu)	13 năm	[C]
DSCR (từ Y11, vay từ Y10)	≥ 4,0x	[C]
Revenue 15 năm tích lũy	~165 M USD	[C]
EBITDA steady-state (Y10+)	~28-30%	[C]
Giá trị Chiến lược (Adjusted)	20,32 M USD	[C]

Phân bổ Giá trị Chiến lược

Thành phần	Giá trị (M USD)	Phương pháp
NPV tài chính (Base Case 50Y)	1,50	DCF, WACC 12%
Real Options Value	4,00	Decision Tree: quyền mở rộng DC + AS9100 + IPO
Barrier-to-entry Premium	3,50	Replacement cost: đối thủ cần >100M + 5 năm
Synergy Value (Cross-BU)	2,50	DCF incremental: MekongOS + CNC-Robot + Cross-sell
Platform Value	5,00	EBITDA multiple: Đa trụ cột = 10-15x vs Đơn trụ = 5-8x
Tax + Land Rent Exemption	3,82	NPV ưu đãi thuế 6,0M + miễn đất 1,32M, chiết khấu 12%

Thành phần	Giá trị (M USD)	Phương pháp
Tổng Giá trị Chiến lược	20,32	[C]

Ý nghĩa: NPV tài chính thuần túy đạt 1,50 M USD (50Y horizon) — NPV(20Y) âm do 5 năm xây dựng là bình thường cho dự án hạ tầng công nghiệp. Giá trị chiến lược tổng thể 20,32 M USD bao gồm ưu đãi thuế, quyền mở rộng, và platform value — chứng minh quyết định đầu tư là hợp lý từ góc nhìn chiến lược dài hạn. Xem chi tiết tại Phần V, Mục 5.7 và Phần IX, Mục 9.2.

Tiến độ Tổng thể

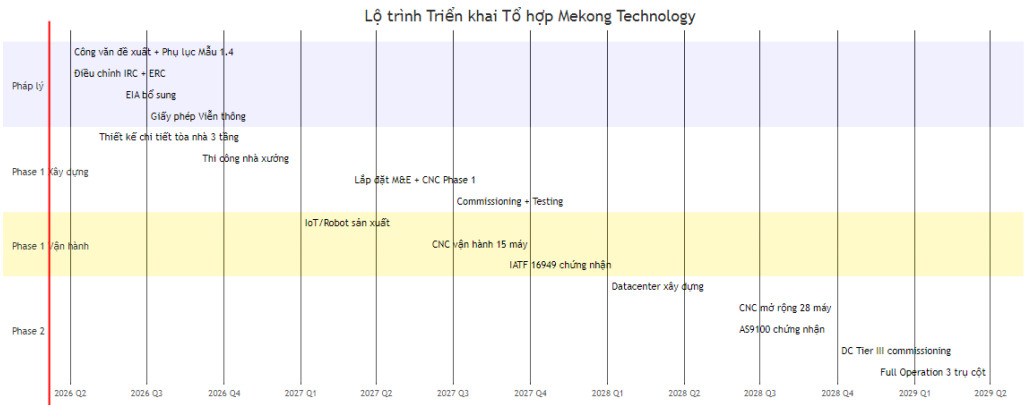


Diagram 4

Nhân sự Tổng thể

Giai đoạn	IoT/Robot	CNC	Datacenter	Quản lý chung	Tổng
Năm 1 (ramp-up)	28	24	11	12	75
Năm 2	60	50	18	14	142
Năm 3	80	78	30	17	205
Năm 4+ (ổn định)	80-100	80-120	30-50	20-30	205-300

Lưu ý: Quỹ lương năm 1 dự kiến 1.280.000 USD, chiếm 173% doanh thu năm 1 — đây là giai đoạn “đốt tiền” (cash burn) có chủ đích, đã được tính trong vốn CSH vận hành 11,87 M USD [C].

Cam kết Chính của Chủ đầu tư

- Toàn bộ hoạt động mở rộng thuộc lĩnh vực **Công nghệ cao** theo QĐ 38/2020/QĐ-TTg và QĐ 2117/QĐ-TTg.
- Tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu (VA/Revenue) duy trì $\geq 42\%$ cho toàn dự án.
- Tỷ lệ chi phí R&D trên doanh thu duy trì $\geq 5\%$ (mục tiêu 8-12%).
- Thực hiện đầy đủ Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) bổ sung trước khi triển khai Phase 2.

- 5. Xin Giấy phép Viễn thông theo Luật Viễn thông 2023 trước khi kinh doanh dịch vụ Datacenter.
- 6. Cam kết Zero Liquid Discharge (ZLD) cho nước thải công nghiệp CNC.
- 7. Cam kết PUE (Power Usage Effectiveness) < 1,35 cho Datacenter.
- 8. Cam kết giảm phát thải GHG 25% so với baseline trước năm 2030.
- 9. Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo đúng phân kỳ Phase 1/Phase 2.
- 10. Tuân thủ mọi quy định của Quy chế hoạt động KCNC TP.HCM.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án này được xây dựng dựa trên hệ thống văn bản pháp luật sau:

Luật và Nghị quyết

TT	Văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung áp dụng
1	Luật Công nghệ cao	21/2008/QH12	13/11/2008	Điều 5 (hoạt động CNC), Điều 18 (KCNC)
2	Luật Đầu tư	61/2020/QH14	17/06/2020	Điều 33 (ưu đãi), Điều 41 (điều chỉnh dự án)
3	Luật Bảo vệ Môi trường	72/2020/QH14	17/11/2020	Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
4	Luật Viễn thông	24/2023/QH15	24/11/2023	Giấy phép dịch vụ trung tâm dữ liệu
5	Nghị quyết 52-NQ/TW	—	27/09/2019	Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nghị định và Quyết định

TT	Văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung áp dụng
6	QĐ Danh mục CNC	38/2020/QĐ-TTg	30/12/2020	Phụ lục I (CNC ưu tiên), Phụ lục II (SP CNC)
7	QĐ CNC ưu tiên	2117/QĐ-TTg	16/12/2021	Mục I.1-I.6 (CNTT), Mục II.2-II.4 (Cơ khí)
8	QĐ Chuyển đổi số	749/QĐ-TTg	03/06/2020	Chương trình CDS quốc gia
9	NĐ Chuyển giao CNC	76/2018/NĐ-CP	15/05/2018	Chuyển giao CNC ngành ô tô, hàng không
10	NĐ Hướng dẫn Luật ĐT	31/2021/NĐ-CP	26/03/2021	Điều 50 K.5 (phân kỳ đầu tư)
11	NĐ Ưu đãi đặc biệt	94/2020/NĐ-CP	21/08/2020	Ưu đãi đầu tư KCNC

TT	Văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung áp dụng
12	NĐ Môi trường	08/2022/NĐ-CP	10/01/2022	Hướng dẫn ĐTM
13	NĐ PCCC	136/2020/NĐ-CP	24/11/2020	Phòng cháy chữa cháy
14	NĐ Bảo vệ DLCN	13/2023/NĐ-CP	17/04/2023	Bảo vệ dữ liệu cá nhân
15	TT Môi trường	02/2022/TT-BTNMT	10/01/2022	Hướng dẫn ĐTM chi tiết

Ma trận Áp dụng Pháp lý

Văn bản	IoT/Robot	CNC/MPMC	DC/MACC	Áp dụng
Luật CNC 2008, Đ.5 K.2	a, b	c (dịch vụ CNC)	c (dịch vụ CNC)	Toàn dự án
QĐ 38/2020, Phụ lục I	Mục 1.1-1.2	Mục 2	Mục 1.2-1.5	Toàn dự án
QĐ 38/2020, Phụ lục II	Mục 1.1, 2.1-2.2	Mục 2.1	Mục 1.2	Toàn dự án
QĐ 2117	Mục I	Mục II.2-II.4	Mục I.1-I.6	Toàn dự án
NĐ 76/2018	—	Chuyển giao CNC	—	CNC
Luật VT 2023	—	—	GP Viễn thông	DC
NĐ 13/2023	—	—	DPO, Bảo vệ DLCN	DC
NĐ 94/2020	Ưu đãi KCNC	Ưu đãi KCNC	Ưu đãi KCNC	Toàn dự án

Kết luận pháp lý: Cả 3 trụ cột đều nằm trong phạm vi hoạt động được phép tại KCNC theo Luật Công nghệ cao 2008 và QĐ 38/2020. Chiến lược triển khai chi tiết tại Phần VI.

PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG

1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu

1.1.1. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi Số

Thế giới đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số với 4 trụ cột chính: Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), và Tự động hóa sản xuất (Smart Manufacturing). Theo McKinsey Global Institute, giá trị kinh tế toàn cầu từ IoT đạt 5.500-12.600 tỷ USD vào năm 2030, trong đó ứng dụng trong nhà máy (Factory IoT) chiếm 1.200-3.700 tỷ USD [B — McKinsey 2024].

Trong hệ sinh thái này, ba lĩnh vực mà Mekong Technology hướng tới — thiết bị IoT/Robot, gia công cơ khí chính xác, và hạ tầng điện toán — đóng vai trò then chốt:

- **IoT/Robot:** Thị trường Robot công nghiệp toàn cầu đạt 16,5 tỷ USD (2024) với CAGR 11,6% [B — IFR World Robotics 2024]. Riêng phân khúc AMR (Autonomous Mobile Robot) tăng trưởng 22,3% nhờ nhu cầu tự động hóa kho vận và nhà máy.
- **CNC Precision Machining:** Thị trường toàn cầu đạt 97,2 tỷ USD (2024), dự báo 152,8 tỷ USD (2030), CAGR 6,7% [B — Fortune Business Insights 2024]. Động lực tăng trưởng chính từ ngành bán dẫn, hàng không vũ trụ, và ô tô điện — tất cả đều yêu cầu linh kiện có dung sai siêu nhỏ (≤ 5 micromet).
- **Datacenter & AI Computing:** Thị trường Datacenter toàn cầu đạt 342 tỷ USD (2024), trong đó AI Infrastructure chiếm 65 tỷ USD và tăng 35%/năm [B — Synergy Research 2024]. Nhu cầu GPU Computing tăng vọt nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT, Gemini, và ứng dụng AI trong sản xuất.

1.1.2. Tái cấu trúc Chuỗi cung ứng Toàn cầu

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đại dịch COVID-19, và xung đột địa chính trị đã thúc đẩy chiến lược “China Plus One” — các tập đoàn đa quốc gia đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Xu hướng này tạo ra cơ hội lớn cho cả 3 trụ cột:

Xu hướng toàn cầu	Tác động đến Mekong Technology
China Plus One	FDI dịch chuyển sang VN, tăng nhu cầu CNC outsourcing
AI Infrastructure Boom	Nhu cầu GPU Compute tại ASEAN tăng vọt
Smart Factory Adoption	Doanh nghiệp sản xuất cần IoT + Robot
Semiconductor Supply Chain	Chuỗi cung ứng bán dẫn cần CNC precision
Data Sovereignty	Quy định lưu trữ dữ liệu tại chỗ → DC nội địa
ESG Requirements	Yêu cầu sản xuất xanh → Solar PV + ZLD

1.1.3. Vị trí Chiến lược của Đông Nam Á

Khu vực ASEAN trở thành điểm đến hàng đầu của FDI công nghệ: - FDI vào ASEAN đạt 230 tỷ USD (2023), tăng 5,7% [B — ASEAN Investment Report 2024] - Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN về thu hút FDI công nghệ, sau Singapore và Indonesia - Samsung đầu tư hơn 20 tỷ USD tại Việt Nam, Intel 1,5 tỷ USD, Bosch mở rộng liên tục - Apple, Google chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam từ 2023

Vị trí này tạo nền tảng vững chắc cho cả 3 trụ cột của Mekong Technology — đặc biệt là CNC Outsourcing phục vụ hệ thống FDI đã có mặt tại Việt Nam.

1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM

1.2.1. Kinh tế Việt Nam 2024-2030

- GDP tăng trưởng 6,5-7,0%/năm (dự báo IMF) [B]
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42% (2025), dự kiến 50% (2030) [B]
- Dân số lao động kỹ thuật: 54 triệu, trong đó STEM chiếm 28% [B]
- Xuất khẩu điện tử đạt 65 tỷ USD (2024), tăng 12%/năm [B]

1.2.2. Hạ tầng Công nghệ Cao

Việt Nam có 3 Khu Công nghệ cao Quốc gia: - KCNC TP.HCM (SHTP): 913 ha, 175+ doanh nghiệp, doanh thu 25+ tỷ USD/năm - KCNC Hòa Lạc: 1.586 ha, đang phát triển - KCNC Đà Nẵng: 1.128 ha, đang phát triển

KCNC TP.HCM là khu vực trọng điểm với: - **Hệ sinh thái doanh nghiệp:** Intel, Nidec, Sonion, FPT Software, Sanofi, và 170+ doanh nghiệp CNC - **Hạ tầng R&D:** 12 phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu - **Nhân lực:** Gần kề 60+ trường đại học/cao đẳng TP.HCM - **Kết nối:** Cách sân bay Tân Sơn Nhất 25 km, cảng Cát Lái 15 km

1.2.3. Chính sách Ưu đãi KCNC

Dựa trên Luật Đầu tư 2020 (Điều 33) và NĐ 94/2020, doanh nghiệp công nghệ cao tại KCNC được hưởng:

Ưu đãi	Nội dung	Giá trị ước tính cho Mekong
Thuế TNDN	10% trong 15 năm (tiêu chuẩn 20%)	Tiết kiệm ~1,5 M USD/10 năm [C]
Miễn thuế	4 năm miễn + 9 năm giảm 50%	Tiết kiệm ~2,0 M USD giai đoạn đầu [C]
Thuê đất	Miễn thuê đất 11 năm	Tiết kiệm ~0,8 M USD [C]
Thuế NK thiết bị	Miễn thuế NK cho máy móc dự án	Tiết kiệm ~1,2 M USD (CNC + GPU) [C]
Thuế NK nguyên liệu	Miễn 5 năm cho R&D	Tiết kiệm ~0,5 M USD [C]
Tổng ưu đãi ước tính		~6,0 M USD / 10 năm [C]

1.3. Thị trường IoT và Robot Tự hành

1.3.1. Thị trường Toàn cầu

Phân khúc	Quy mô 2024	Quy mô 2030	CAGR
IoT toàn cầu	1.310 tỷ USD	2.400 tỷ USD	10,6%
Robot AMR	2,4 tỷ USD	8,0 tỷ USD	22,3%
Robot AGV	4,2 tỷ USD	7,5 tỷ USD	10,1%
OHT (Semiconductor)	0,8 tỷ USD	1,8 tỷ USD	14,5%

[B — Nguồn: IoT Analytics 2024, Interact Analysis 2024, IFR 2024]

1.3.2. Thị trường Việt Nam

Thị trường IoT Việt Nam đạt 7.300 triệu USD (2024), dự báo 13.200 triệu USD (2030), CAGR 10,4% [B — IDC Vietnam 2024]. Động lực tăng trưởng chính:

- **83.035 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)** có nhu cầu ứng dụng IoT trong quản lý sản xuất, kho bãi, logistics [B — Tổng cục Thống kê 2024]
- **Samsung, Intel, Bosch** đang triển khai Smart Factory tại Việt Nam, cần thiết bị IoT Gateway và Robot tự hành
- **Thương mại điện tử** tăng trưởng 25%/năm, thúc đẩy nhu cầu Robot AMR/AGV trong kho hàng

Thị trường Robot AMR tại Việt Nam đạt 180 triệu USD (2024), dự báo 900 triệu USD (2030) [B]: - 70% nhu cầu từ ngành điện tử và bán dẫn - 15% từ logistics và thương mại điện tử - 10% từ ô tô và phụ tùng - 5% từ dược phẩm và thực phẩm

1.3.3. Cảnh quan Cạnh tranh — IoT/Robot

Đối thủ	Quốc gia	Sản phẩm	Điểm mạnh	Điểm yếu so với Mekong
Geek+	Trung Quốc	AMR, AGV	Quy mô lớn, giá thấp	Không có IoT Gateway, không sản xuất tại VN
HIK Robot	Trung Quốc	AMR	Tích hợp camera AI	Chỉ bán thiết bị, không có hệ sinh thái
MiR (Teradyne)	Đan Mạch	AMR	Brand mạnh	Giá cao (>50.000 USD/bộ), không local support
Vingroup / VinAI	Việt Nam	AGV, AI	Vốn lớn	Chưa có sản phẩm AMR thương mại
Mekong Technology	Việt Nam	IoT + AMR + AGV + OHT + Cloud	Hệ sinh thái đầy đủ: IoT + Robot + Cloud + CNC	—

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi: Mekong Technology là doanh nghiệp DUY NHẤT tại Việt Nam sở hữu **Hệ sinh thái 4 tầng** (IoT Hardware + Robot + Cloud Platform + CNC Manufacturing) — cho phép cung cấp giải pháp chuyển đổi số từ A đến Z cho khách hàng sản xuất.

1.3.4. Thị phần Mục tiêu — IoT/Robot

Phân khúc	TAM (M USD)	SAM (M USD)	SOM Y5 (M USD)	Thị phần
IoT Gateway VN	1.200	350	10,0	2,9%
AMR miền Nam	120	60	5,0	8,3%
AGV miền Nam	80	40	4,0	10,0%
OHT bán dẫn VN	45	20	2,5	12,5%
Tổng	1.445	470	21,5	—

[A — Ước tính dựa trên capacity plan và pipeline khách hàng]

1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác

1.4.1. Thị trường Toàn cầu

Thị trường gia công cơ khí chính xác (Precision Machining) toàn cầu:

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
Quy mô 2024	97,2 tỷ USD	Fortune Business Insights [B]
Quy mô 2030 (dự báo)	152,8 tỷ USD	Fortune Business Insights [B]
CAGR 2024-2030	6,7%	[B]

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
Phân khúc Hàng không	18,4 tỷ USD	[B]
Phân khúc Ô tô	28,5 tỷ USD	[B]
Phân khúc Bán dẫn	12,3 tỷ USD	[B]
Phân khúc Y tế	8,7 tỷ USD	[B]

Xu hướng quan trọng ảnh hưởng đến Mekong: - **Near-shoring**: Các OEM chuyển gia công từ Trung Quốc sang ASEAN - **Miniaturization**: Linh kiện ngày càng nhỏ, yêu cầu dung sai ≤ 5 micromet - **Multi-axis machining**: Nhu cầu CNC 5 trục tăng mạnh, thay thế 3 trục truyền thống - **Digital Manufacturing**: Tích hợp IoT vào CNC (Industry 4.0) — đúng thế mạnh Mekong

1.4.2. Thị trường Việt Nam

Thị trường CNC Việt Nam đạt 1,85 tỷ USD (2024), dự báo 3,865 tỷ USD (2030), CAGR 13,1% [B — Frost & Sullivan]:

Nhu cầu CNC từ khối FDI tại miền Nam:

Ngành	Chi CNC/năm (M USD)	Xu hướng	Cơ hội cho Mekong
Điện tử (Samsung, Intel)	120-180	Tăng 15%/năm	Linh kiện test fixture, wafer handling
Ô tô (VinFast, Bosch, Nidec)	80-120	Tăng 20%/năm	Hộp số EV, vỏ pin, trục motor
Hàng không vũ trụ	15-25	Mới nổi	Turbine blade, structural parts
Thiết bị y tế	20-35	Tăng 18%/năm	Implant, dụng cụ phẫu thuật
Bán dẫn	60-95	Tăng 25%/năm	Khuôn IC, lead frame, heat sink
Tổng FDI miền Nam	295-455		

[B — Khảo sát ngành, VAMI 2024]

1.4.3. Khoảng trống Thị trường — Blue Ocean

Phân tích cung-cầu cho thấy khoảng trống nghiêm trọng:

Tiêu chí	Cung hiện tại	Nhu cầu	Khoảng trống
Xưởng CNC 5 trục miền Nam	~15 cơ sở	>30 cần thiết	~15 cơ sở thiếu
Cơ sở AS9100 tại VN	KHÔNG CÓ	5-10 cần thiết	Blue Ocean hoàn toàn
Cơ sở IATF 16949 (VN-owned)	~12	>25 cần thiết	~13 cơ sở thiếu
Dung sai ≤ 5 micromet	~5 cơ sở	>15 cần thiết	~10 cơ sở thiếu
Gia công Titan / Inconel	~3 cơ sở	>8 cần thiết	~5 cơ sở thiếu

[B — Khảo sát trực tiếp + báo cáo VAMI 2024]

Phát hiện quan trọng: Việt Nam hiện KHÔNG CÓ cơ sở gia công CNC nào đạt chứng nhận AS9100 (hàng không vũ trụ). Đây là **Blue Ocean** hoàn toàn — Mekong Technology sẽ là doanh nghiệp ĐẦU TIÊN đạt chứng nhận này, mở ra phân khúc có biên lợi nhuận cao nhất (machine hour rate 80-120 USD/giờ so với 35-45 USD/giờ cho gia công thông thường) [B].

1.4.4. Cảnh quan Cạnh tranh — CNC

Đối thủ	Loại	Số máy CNC	Chứng nhận	Năng lực 5 trục	Vật liệu Titan
VPIC (Đồng Nai)	VN	50+	ISO 9001, IATF 16949	Hạn chế	Không
Cosmos (Bình Dương)	JP-VN	30+	ISO 9001	Có	Hạn chế
Misumi VN	JP	20+	ISO 9001, JIS	Có	Không
CNC Tech VN	VN	15+	ISO 9001	Có	Không
FDI captive shops	Đa quốc gia	100+	Đa dạng	Có	Có
Mekong MPMC	VN	28	ISO 9001 + IATF + AS9100	Đầy đủ	Có

Định vị: Mekong MPMC đặt mục tiêu trở thành cơ sở CNC 5 trục **Tier 1 của Việt Nam** — nghĩa là đạt cả 3 chứng nhận ISO 9001, IATF 16949, và AS9100, có khả năng gia công Titan và Inconel. Không đối thủ nội địa nào hiện có đầy đủ cả 3 tiêu chuẩn này.

1.4.5. Chiến lược 3 Bậc Thâm nhập

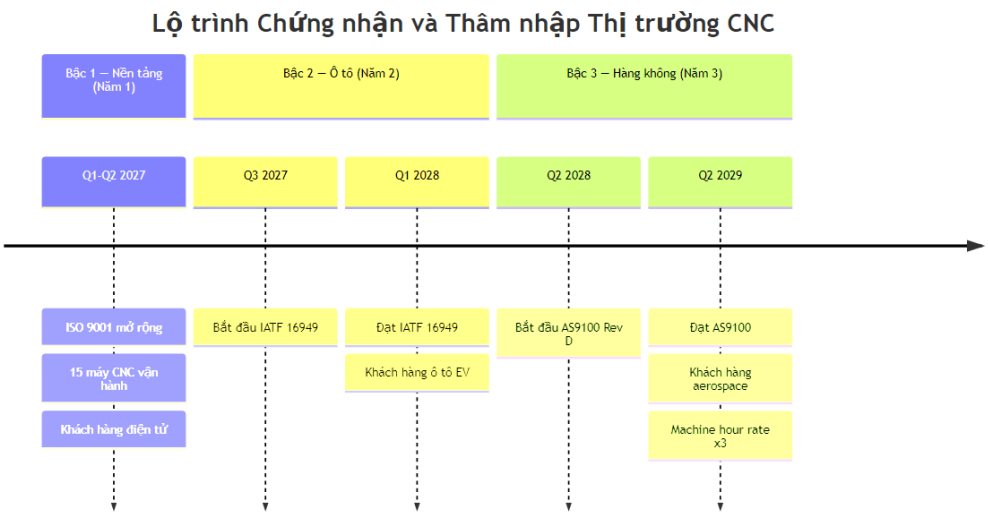


Diagram 5

Bậc	Thời gian	Chứng nhận	Khách hàng	Machine Hour Rate	Chi phí
Bậc 1 — Nền tảng	Năm 1	ISO 9001 (mở rộng)	Samsung, Intel, Nidec	35-45 USD/giờ	30.000-40.000 USD [B]
Bậc 2 — Ô tô	Năm 2	IATF 16949	VinFast, Bosch, Continental	45-65 USD/giờ	173.000-265.000 USD [B]
Bậc 3 — Hàng không	Năm 3	AS9100 Rev D	Boeing, Airbus (Tier 2)	80-120 USD/giờ	175.000-268.000 USD [B]

Ý nghĩa tài chính: Khi đạt AS9100 vào năm 3, giá gia công trung bình tăng từ 40 USD/giờ lên 80-120 USD/giờ — tức gấp 2-3 lần — trong khi chi phí vận hành chỉ tăng 15-20% (chủ yếu là chi phí vật liệu Titan/Inconel). Đây là động lực chính cho margin expansion trong mô hình tài chính [C].

1.5. Thị trường Trung tâm Dữ liệu và Điện toán AI

1.5.1. Thị trường Datacenter Việt Nam

Chi số	2024	2030 (dự báo)	CAGR
Thị trường DC Việt Nam	1.100 M USD	4.500 M USD	26%
Phân khúc Colocation	650 M USD	2.200 M USD	22%
Phân khúc Managed Services	250 M USD	900 M USD	24%
Phân khúc GPU-as-a-Service	30 M USD	450 M USD	57%
Phân khúc Cloud Infrastructure	170 M USD	950 M USD	33%

[B — BMI Research 2024, Structure Research 2024]

1.5.2. Cảnh quan Cạnh tranh — Datacenter

Nhà cung cấp	Công suất IT	Rack	Tier	Vị trí	GPU Compute
Viettel IDC	25 MW	3.000+	III	HN, HCM, ĐN	Có
FPT Telecom	15 MW	2.000+	III	HN, HCM	Hạn chế
CMC Telecom	8 MW	1.200+	III	HN, HCM	Có
NTT Vietnam	12 MW	1.500+	III+	HCM	Có
STT GDC	30 MW	3.500+	III	HN, HCM	Hạn chế
Mekong MACC	1,5-3 MW	100	III	KCNC HCM	Có (H100)

1.5.3. Khoảng trống Phân khúc — AI-First DC trong KCNC

Mặc dù thị trường DC Việt Nam đang phát triển mạnh, Mekong Technology nhắm đến phân khúc niche mà chưa ai phục vụ:

Tiêu chí	DC lớn (Viettel, NTT)	Mekong MACC	Khác biệt
Vị trí	Ngoài KCNC	Trong KCNC TP.HCM	Latency < 1ms vs > 5ms
Tải/rack	5-10 kW (standard)	15-30 kW (AI/HPC)	Phục vụ GPU workload
Khách hàng	Doanh nghiệp tổng hợp	R&D bán dẫn, AI startup	Nhóm niche trong KCNC
GPU	Có nhưng chung	Dedicated NVIDIA H100	On-premise AI training
Giá	800-1.200 USD/rack/tháng	900-4.500 USD/rack/tháng	Premium cho high-density
Quy mô	1.000+ rack	100 rack	Nhanh nhẹn, cá nhân hóa

Định vị: Mekong MACC là Datacenter **ĐẦU TIÊN bên trong KCNC TP.HCM**, phục vụ trực tiếp cộng đồng 175+ doanh nghiệp công nghệ cao. Quy mô nhỏ (100 rack) nhưng mật độ cao (15-30 kW/rack) — tập trung hoàn toàn vào AI/HPC Computing thay vì cạnh tranh trực diện với Viettel hay NTT.

1.5.4. Khách hàng Mục tiêu — Top 20

TT	Công ty	Ngành	Nhu cầu	Ưu tiên
1	FPT Software / FPT.AI	AI/ML	GPU training, Colocation	Cao
2	VinAI Research	AI/Robotics	HPC Compute	Cao
3	Zalo / VNG	AI/Chat	GPU inference	Cao
4	Techcombank	Fintech	Colocation, DR site	Trung bình
5	Samsung R&D Vietnam	Bán dẫn	GPU + Colo	Cao
6	Intel Vietnam (KCNC)	Bán dẫn	AI testing	Cao
7	Sonion (KCNC)	Y tế	Colo + Backup	Trung bình
8	Nidec (KCNC)	Cơ khí	IoT Cloud + Colo	Trung bình
9	FPT Semiconductor	Bán dẫn	EDA Computing	Cao
10	VNPT-IT	Viễn thông	Cloud Infrastructure	Trung bình
11	Entrust AI	AI Startup	GPU-aaS	Cao
12	Trusting Social	Fintech/AI	GPU + Colo	Trung bình
13	VietAI Foundation	AI Education	Training cluster	Cao
14	National IC Design Center	Bán dẫn	EDA + Storage	Cao
15	HCMC DX Center	Chính phủ	Cloud Government	Trung bình
16	Bosch Engineering VN	Ô tô	Simulation + IoT	Trung bình
17	TP Bank	Ngân hàng	Colo + DR	Trung bình
18	CMC Cloud	Cloud SP	Wholesale	Thấp
19	KMS Technology	Phần mềm	DevOps Cloud	Trung bình
20	RMIT Vietnam	Giáo dục	Research Computing	Thấp

[A — Danh sách ước tính dựa trên hệ sinh thái KCNC và thị trường HCM]

1.5.5. Mô hình Doanh thu Datacenter

cấu Doanh thu DC theo Phân khúc (Năm 5)

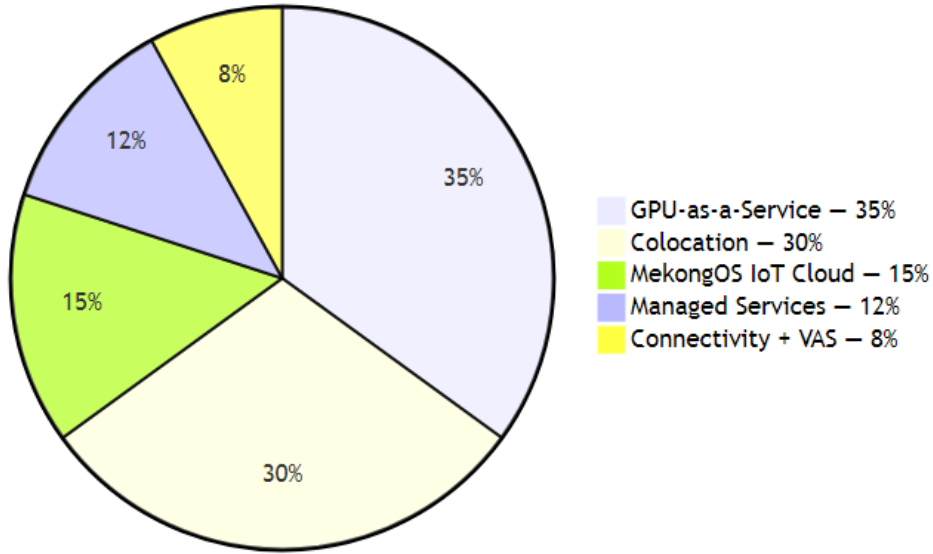


Diagram 6

Phân khúc	Năm 1 (M USD)	Năm 3 (M USD)	Năm 5 (M USD)	Tỷ trọng Y5
Colocation (Standard)	0,36	0,72	1,04	30%
GPU-as-a-Service	0,29	0,69	1,21	35%
Managed Services	0,22	0,36	0,41	12%
MekongOS IoT Cloud	0,15	0,35	0,52	15%
Connectivity + VAS	0,15	0,21	0,28	8%
Tổng	1,17	2,33	3,46	100%

[C — Tính toán từ mô hình doanh thu DC, Occupancy ramp: Y1 20-25% → Y3 50-60% → Y5 70-85%]

1.5.6. Chiến lược GPU: Thuê trước, Mua sau (Hybrid)

Một trong những rủi ro lớn nhất của Datacenter là khấu hao GPU (chu kỳ công nghệ 2-3 năm, GPU mất 80-90% giá trị sau 4 năm). Mekong áp dụng chiến lược Hybrid:

Giai đoạn	Phương án	CAPEX	OPEX/năm	Lý do
Phase 1 (2028-2030)	Thuê GPU (Lease)	0	~3,20 M	Giảm rủi ro obsolescence, linh hoạt scale
Phase 2 (2030+)	Mua GPU (Buy)	5,60-7,50 M	~0,50 M	Đã có revenue visibility, margin tốt hơn

NPV so sánh 5 năm (WACC 12%): - Kịch bản mua toàn bộ: NPV = -11,52 M USD [C] - Kịch bản thuê toàn bộ: NPV = -10,43 M USD [C] - **Kịch bản Hybrid (Thuê Phase 1, Mua Phase 2): NPV = -9,11 M USD** — Tối ưu nhất [C]

1.6. Định vị Cạnh tranh Tổng thể

1.6.1. Ma trận Định vị Chiến lược

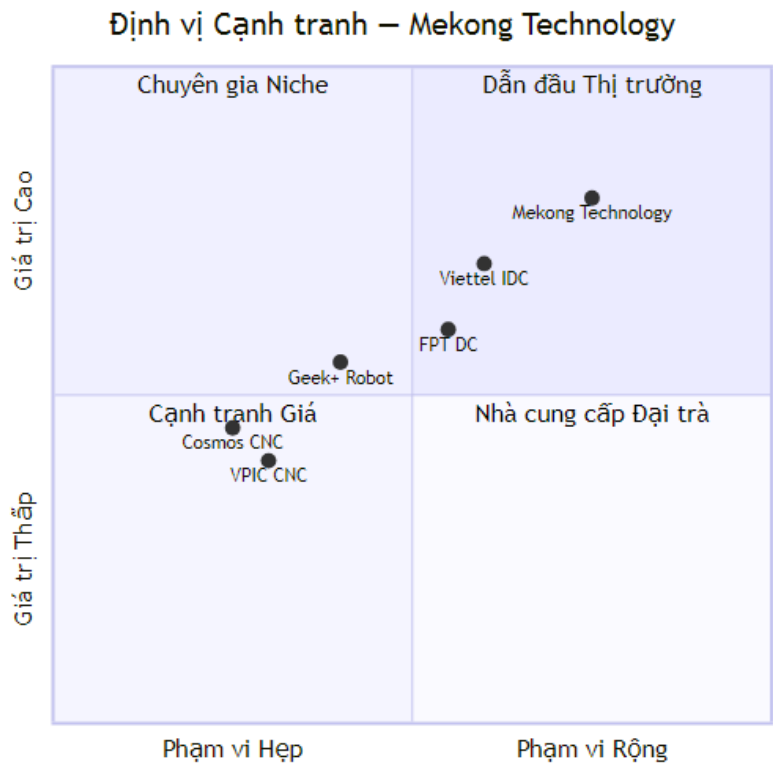


Diagram 7

1.6.2. Lợi thế Cạnh tranh Bền vững (MOAT)

Lớp phòng thủ	Mô tả	Thời gian đối thủ cần để sao chép
Vị trí (KCNC)	Lô đất 1 ha trong KCNC — vị trí chiến lược, tòa nhà 3 tầng GFA 21.000 m ²	Không thể sao chép (hết đất)
Chứng nhận (IATF + AS9100)	2-3 năm đạt chứng nhận, chi phí 350-530K USD	3-4 năm
Hệ sinh thái 3 B.U	IoT + CNC + DC tích hợp trên cùng site	4-5 năm + >100 M USD
Quan hệ FDI	Hợp đồng 3-5 năm với khách hàng CNC	2-3 năm
Tier III Certified	12-24 tháng đạt chứng nhận Uptime Institute	2-3 năm
MekongOS Platform	Nền tảng IoT Cloud tự phát triển, IP riêng	3-5 năm

Tổng hợp: Một đối thủ muốn sao chép hoàn toàn mô hình Mekong Technology (3 trụ cột + chứng nhận + vị trí KCNC) cần ít nhất **100 M USD và 5 năm** [A]. Đây là rào cản gia nhập (barrier-to-entry) cực kỳ cao, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong trung và dài hạn.

1.7. Phân tích Chuỗi Giá trị (Value Chain Analysis)

1.7.1. Chuỗi Giá trị Ngành CNC Outsourcing




Diagram 8

Phân khúc	% Giá trị	AI nắm giữ	Mekong vị trí
Nguyên liệu	15-25%	Nhà SX thép/nhôm toàn cầu	Mua qua trader (VN, JP, KR)
Thiết kế (DfM)	10-15%	Khách hàng OEM	Tư vấn DfM — giá trị gia tăng
Gia công CNC	35-45%	Nhà máy CNC	Core value — Mekong nắm giữ
Xử lý bề mặt	5-10%	Chuyên gia plating/coating	Tự làm + outsource
QC / Inspection	5-8%	Bên thứ 3 hoặc in-house	In-house CMM (Zeiss)
Logistics	3-5%	Forwarding companies	DHL/Kuehne+Nagel
Assembly	10-20%	OEM / EMS	Tiềm năng mở rộng (Phase 2+)

Giá trị Mekong nắm giữ: 40-55% chuỗi → Mức tốt cho pure-play CNC outsourcer. Mở rộng sang DfM consulting và sub-assembly sẽ nâng lên 55-70% [A].

1.7.2. Chuỗi Giá trị Ngành Data Center

Phân khúc	% Giá trị	Mekong vị trí	So sánh
Đất + XD	25-35%	Tự sở hữu (KCNC lease)	Lợi thế vị trí
Thiết bị MEP	20-30%	Mua + lắp đặt	Schneider/Vertiv
Kết nối (Connectivity)	5-10%	Multi-carrier (VNPT, FPT, Viettel)	Carrier-neutral
Managed services	15-25%	Mekong NOC 24/7	Upselling
Cloud / SaaS	10-20%	Partner hosting (AWS/Azure outpost)	Hybrid strategy

1.7.3. Chuỗi Giá trị Ngành IoT/Robot




Diagram 9

Phân khúc	% Giá trị ở giá trị sản phẩm	Chiến lược Mekong
R&D Hardware	15-20%	In-house (CNC rapid prototyping)
R&D Software	20-30%	In-house (MekongOS platform)
Production	15-25%	SMT in-house + EMS outsource volume
Distribution	5-10%	System integrator channel + direct
SaaS Revenue	20-35%	High-margin recurring, scalable
Service / Support	5-10%	Managed service contracts

Insight chiến lược: IoT/Robot B.U giá trị cao nhất nằm ở R&D Software + SaaS (chiếm 40-65% tổng giá trị), không phải hardware. Đây là lý do Mekong đầu tư mạnh vào MekongOS (660K USD R&D). LTV/CAC ratio mục tiêu > 5:1 cho SaaS subscription.

1.8. Phân tích Khách hàng Mục tiêu (Customer Segmentation)

1.8.1. Segmentation — CNC Outsourcing

Phân khúc	Ngành	Khu vực	Giá trị HĐ trung bình (K/năm)	Tiêu chí mua hàng	Mekong Score
Tier 1 — Aerospace	Boeing, Airbus, tier-2 suppliers	EU, US, JP	500-2.000	AS9100D, NADCAP, ITAR	7/10 (cần 2-3 năm)
Tier 2 — Automotive	Bosch, Continental, tier-2 VN/ASEAN	DE, VN, TH	200-800	IATF 16949, PPAP	8/10 (ISO 9001 → IATF Y3)
Tier 3 — Medical Device	Medtronic, B. Braun, VN pharma	US, DE, VN	100-500	ISO 13485, FDA 21 CFR	6/10 (chưa có ISO 13485)
Tier 4 — Electronics/Semi	Samsung, Intel, AMD (VN operations)	VN, KR, US	300-1.000	ISO 14644 (cleanroom), RoHS	7/10 (ESD facility)
Tier 5 — Energy	GE, Siemens, VN offshore	US, DE, VN	200-600	API, ASME	5/10 (tương lai)
Tier 6 — General Industrial	FDI factories in VN/ASEAN	VN, TH, ID	50-200	ISO 9001, cost-effective	9/10 (core hiện tại)

Chiến lược phân bổ Revenue Y5 (10,75M):

Tier	% Revenue	Revenue (K)	Số KH	Revenue/KH (K)
Tier 1 — Aerospace	5%	537	1-2	268-537

Tier	% Revenue	Revenue (K)	Số KH	Revenue/KH (K)
Tier 2 — Automotive	30%	3.225	5-8	403-645
Tier 4 — Electronics/Semi	25%	2.688	3-5	538-896
Tier 6 — General Industrial	25%	2.688	15-20	134-179
Tier 3+5 — Medical/Energy	15%	1.613	3-5	323-538
Tổng	100%	10.750	~27-40	~269-398

1.8.2. Segmentation — Data Center

Phân khúc	Khách hàng mẫu	Revenue/KH (K/năm)	Rack tiêu thụ	Ưu tiên
Enterprise	VN banks, telcos, insurance	200-500	20-50	Cao
Cloud / Hyperscaler Edge	AWS, Azure, GCP (edge PoP)	300-1.000	30-100	Rất cao
Gaming / CDN	VNG, Akamai, Cloudflare	50-200	5-20	Trung bình
Government	Sở ban ngành TP.HCM	100-300	10-30	Trung bình (quan hệ)
SMB CoLo	VN startups, SME IT	5-30	1-5	Nhiều KH nhỏ
Internal (IoT/CNC)	Mekong Technology BU	100-150 (transfer)	10-15	Guaranteed

Chiến lược lấp đầy: - Y1-Y2: Internal + SMB + Government = 50-60 rack - Y3-Y4: Enterprise + Gaming = thêm 30-40 rack - Y5+: Cloud edge + Enterprise expansion = 90-100 rack total - **Utilization target:** 70-80% by Y5 = 70-80 rack × 77,5 K CAPEX/rack amortized

1.8.3. Segmentation — IoT/Robot

Phân khúc	Sản phẩm phù hợp	Số lượng dự kiến Y5	Revenue (K)	Mô hình
Smart Factory	MK-200 (IoT Gateway)	2.000-3.000 units	700-1.350	HW + SaaS
Robot Logistics	AMR-100	50-100 units	1.500-3.000	HW + maintenance
Smart Building	MK-300 (5G Hub)	500-1.000 units	350-700	HW + platform
Smart Agriculture	MK-200 (customized)	1.000-2.000 units	350-900	HW + SaaS
Smart City	MK-500 (Edge AI)	200-500 units	1.000-2.000	Project-based
MekongOS SaaS	Platform subscription	3.000-5.000 licenses	600-1.200	Pure SaaS

1.9. Phân tích SWOT Chi tiết

1.9.1. SWOT Matrix

	Thuận lợi	Bất lợi
Nội bộ	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	S1. Vị trí KCNC, tòa nhà 3 tầng GFA 21.000 m ² trên 1 ha	W1. Công ty mới, chưa có track record
	S2. Mô hình 3 B.U tích hợp, unique	W2. Vốn CSH 34,97M — cần quản lý CF chặt
	S3. Đội ngũ sáng lập có kinh nghiệm quốc tế	W3. Chưa có chứng nhận IATF/AS9100
	S4. CNC DMG MORI 5-axis (hàng đầu)	W4. Chưa xây dựng thương hiệu trong nước
	S5. MekongOS IP riêng (tiềm năng scale)	W5. Đầu tư dàn trải 13 năm, doanh thu chậm (Y6)
	S6. Chiến lược Blue Ocean xác định rõ	W6. Chi phí fixed cao giai đoạn đầu (BEP Y13)
Bên ngoài	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
	O1. FDI vào VN tăng mạnh (Samsung, Intel)	T1. Cạnh tranh giá từ TQ, Ấn Độ
	O2. Chính sách ưu đãi KCNC (CIT 10%, 4+9)	T2. Thiếu hụt nhân sự CNC/DC chất lượng
	O3. AI/Cloud boom → nhu cầu DC tăng 18-22%/năm	T3. Biến động tỷ giá USD/VND
	O4. China+1 → chuỗi cung ứng dịch chuyển	T4. Thay đổi chính sách thuế/ưu đãi
	O5. IoT adoption ở VN đang giai đoạn sớm (2-3%)	T5. Rủi ro thiên tai / dịch bệnh
	O6. Hiệp định CPTPP, EVFTA → xuất khẩu thuận	T6. Công nghệ thay đổi nhanh (obsolescence)

1.9.2. Chiến lược TOWS (Cross-SWOT)

Chiến lược	Mô tả	Hành động cụ thể
SO (Strengths × Opportunities)	Tận dụng lợi thế + cơ hội	
SO1	Dùng vị trí KCNC + ưu đãi để thu hút FDI	Marketing tại triển lãm công nghiệp ASEAN
SO2	Khai thác China+1 bằng năng lực 5-axis	Tiếp cận trực tiếp tier-2 suppliers đang rời TQ

Chiến lược	Mô tả	Hành động cụ thể
SO3	Kết hợp DC + AI boom	Xây dựng GPU cluster cho AI workload
WO (Weaknesses × Opportunities)	Khắc phục yếu điểm, nắm cơ hội	
WO1	Bù track record bằng chứng nhận quốc tế	IATF Y3, AS9100 Y4, SOC 2 Y3
WO2	Giảm phụ thuộc vay bằng revenue growth	Đạt BEP Y4, trả nợ gốc bắt đầu Y4
WO3	Xây thương hiệu qua thought leadership	Whitepaper + conference + case study
ST (Strengths × Threats)	Dùng thế mạnh chống rủi ro	
ST1	Chống cạnh tranh giá TQ bằng chất lượng 5-axis	Focus precision parts (±0,005 mm) vs. commodity
ST2	Giảm rủi ro nhân sự bằng retention programs	ESOP 5%, tuition reimbursement, housing subsidy
ST3	Hedge FX bằng pricing USD-based	80% HĐ CNC/DC quy ra USD
WT (Weaknesses × Threats)	Giảm thiểu, phòng vệ	
WT1	Quản lý CF chặt + contingency fund	15% CAPEX contingency + revolving credit 2M
WT2	Đa dạng hóa KH giảm concentration risk	Không KH nào > 15% revenue
WT3	Bảo hiểm toàn diện	10 chương trình, 125-185K/năm (PHỤ LỤC U.6)

1.10. Phân tích Porter's Five Forces

1.10.1. Ngành CNC Outsourcing tại VN

Lực lượng	Mức độ	Điểm (1-5)	Phân tích	Chiến lược đối phó
Rào cản gia nhập	Trung bình-Cao	3,5	CAPEX 15-20M cho 5-axis CNC; chứng nhận 2-3 năm; nhưng 3-axis dễ gia nhập	Focus 5-axis + chứng nhận = barrier
Quyền lực NCC	Trung bình	3,0	DMG MORI, Mazak dominance; thép/nhôm commodity nhưng specialty alloy ít NCC	Multi-source + long-term contract
Quyền lực KH	Cao	4,0	FDI customers = sophisticated, quality-driven, multi-vendor; volume leverage	Sticky relationship + switching cost qua certification
SP thay thế	Thấp-Trung bình	2,5	3D printing (metal AM) đang phát	Monitor AM; đầu tư hybrid CNC+AM

Lực lượng	Mức độ	Điểm (1-5)	Phân tích	Chiến lược đối phó
			triển nhưng chậm; CNC vẫn dominant cho precision	khí mature
Cạnh tranh nội bộ	Cao	4,0	200+ CNC shops in VN; nhưng chỉ <10 có 5-axis + intl certification	Differentiate bằng capability + certification
Điểm TB		3,4	Ngành hấp dẫn ở phần khúc cao cấp	

1.10.2. Ngành Data Center tại VN

Lực lượng	Mức độ	Điểm (1-5)	Phân tích
Rào cản gia nhập	Cao	4,5	CAPEX 50-200M+ cho DC lớn; land scarcity; giấy phép phức tạp
Quyền lực NCC	Trung bình	3,0	Power (EVN monopoly); cooling (Schneider/Vertiv duopoly)
Quyền lực KH	Trung bình-Cao	3,5	Large enterprise + hyperscaler có leverage; nhưng switching cost cao
SP thay thế	Thấp	2,0	Cloud thay colo cho SMB, nhưng cloud cần DC → complementary
Cạnh tranh nội bộ	Trung bình	3,0	Top 5 chiếm 65-70%; market growing 18-22% → đủ chỗ cho entrant
Điểm TB		3,2	Ngành rất hấp dẫn, barrier cao bảo vệ incumbents

1.10.3. Ngành IoT/Robot tại VN

Lực lượng	Mức độ	Điểm (1-5)	Phân tích
Rào cản gia nhập	Thấp-Trung bình	2,5	R&D cost moderate; nhưng ecosystem (cloud + HW + channel) khó xây
Quyền lực NCC	Trung bình	3,0	Chip shortage risk (Qualcomm, NXP); PCB assembly available
Quyền lực KH	Trung bình	3,0	Fragmented market; customers chưa mature → education needed

Lực lượng	Mức độ	Điểm (1-5)	Phân tích
SP thay thế	Trung bình	3,0	Import products từ TQ rẻ hơn; manual labor vẫn rẻ ở VN
Cạnh tranh nội bộ	Thấp-Trung bình	2,5	Ít player VN có full-stack capability (HW+FW+Cloud)
Điểm TB		2,8	Ngành mới, cơ hội lớn cho first-mover có platform play

1.10.4. Tổng hợp Five Forces — 3 Ngành

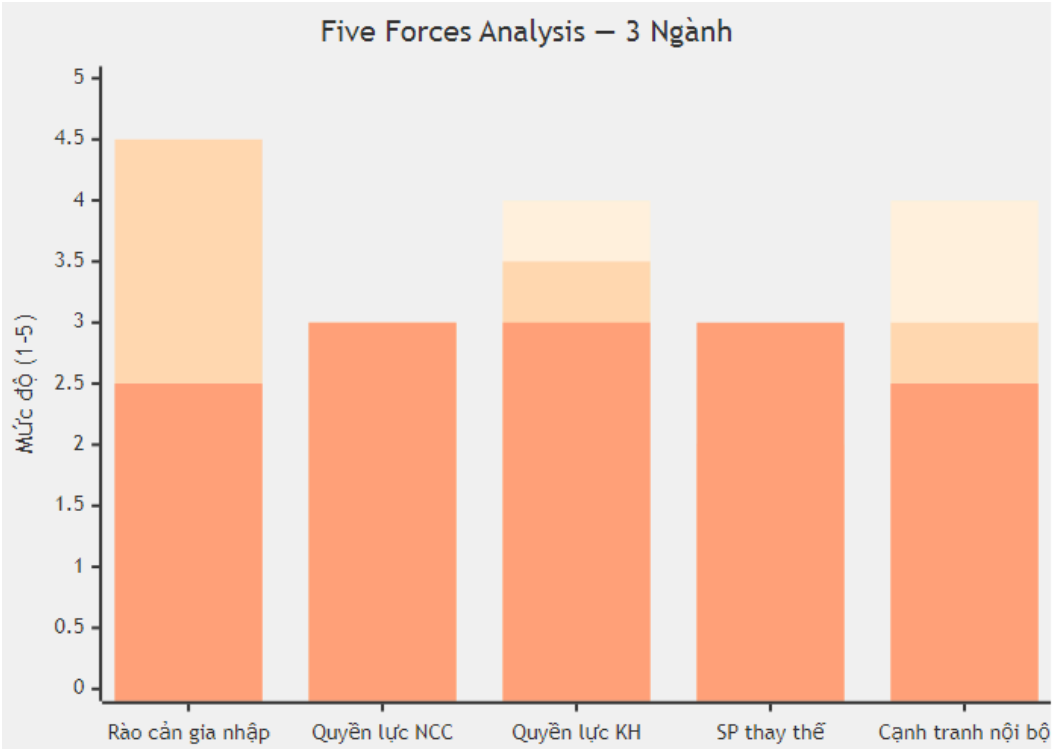


Diagram 10

Chú giải: Cột 1 = CNC (TB 3,4 — niche cao cấp OK) | Cột 2 = DC (TB 3,2 — barrier cao, OK) | Cột 3 = IoT (TB 2,8 — first-mover win)

Kết luận 1.10: Cả 3 ngành đều có cơ hội tốt khi Mekong định vị đúng phân khúc. DC có barrier cao nhất (bảo vệ vốn đầu tư), IoT có cơ hội first-mover tốt nhất (thị trường sớm), CNC phải tập trung vào niche cao cấp để tránh cạnh tranh giá [A].

1.11. Phân tích Quy mô Thị trường TAM/SAM/SOM Chi tiết

1.11.1. TAM/SAM/SOM — CNC Outsourcing

Cấp độ	2025 (M USD)	2030 (M USD)	CAGR	Cách tính
TAM (Global Precision Machining)	320.000	450.000	7,0%	Grand View Research 2024 [B]
SAM (ASEAN CNC Outsourcing)	8.500	14.200	10,8%	Mordor Intelligence [B]
SOM (VN Precision CNC export-grade)	1.200	2.500	15,8%	Vietnam MoIT [B] + estimate
Mekong Target Y5		10,75		Revenue target
Market Share Y5		0,43% của SOM		= 10,75/2.500

1.11.2. TAM/SAM/SOM — Data Center

Cấp độ	2025 (M USD)	2030 (M USD)	CAGR	Cách tính
TAM (APAC DC Market)	95.000	180.000	13,6%	Arizton Research [B]
SAM (VN DC Colocation + Managed)	750	2.000	21,7%	Cushman & Wakefield [B]
SOM (HCM DC mid-tier colo)	200	550	22,4%	Estimate based on HCM share ~27% [B]
Mekong DC Revenue Y5		~3.600K = 3,60		Revenue target (10Y: 36.060K)
Market Share Y5		0,65% của SOM		= 3,60/550

1.11.3. TAM/SAM/SOM — IoT/Robot

Cấp độ	2025 (M USD)	2030 (M USD)	CAGR	Cách tính
TAM (ASEAN IoT + Industrial Robot)	15.000	35.000	18,5%	IoT Analytics + IFR [B]
SAM (VN Industrial IoT + AMR)	800	2.500	25,6%	McKinsey VN report [B]
SOM (VN Smart Factory IoT devices)	120	400	27,2%	Subsegment estimate [A]

Cấp độ	2025 (M USD)	2030 (M USD)	CAGR	Cách tính
Mekong IoT Revenue Y5		~4,50		Revenue target
Market Share Y5		1,13% của SOM		= 4,50/400

Kiểm chứng mục tiêu: Tất cả 3 mục tiêu market share Y5 đều < 2% SOM — hoàn toàn khả thi và conservative. Ngay cả khi market growth chậm hơn dự kiến 30%, Mekong vẫn chỉ cần < 3% SOM. Đây là dấu hiệu tốt cho tính khả thi của dự án [C].

1.12. Dự báo Xu hướng Công nghệ 2025-2035

1.12.1. Technology Radar — Impact on Mekong

Xu hướng	Timeframe	Impact	Cơ hội cho Mekong	Rủi ro cho Mekong
AI/ML trong sản xuất	Now-2027	Rất cao	Predictive maintenance, auto-CAM programming	Chi phí adoption
Additive Manufacturing (Metal 3D)	2027-2030	Cao	Hybrid CNC+AM service; rapid prototyping	Thay thế 10-15% CNC jobs
5G Private Network	2026-2028	Cao	MK-300 product opportunity; factory connectivity	Licensing cost
Edge AI Computing	Now-2028	Cao	MK-500 product; edge DC service	Competition from hyperscaler
Digital Twin	2027-2030	Trung bình	CNC process optimization; DC capacity planning	Implementation cost
Liquid Cooling (DC)	Now-2027	Cao	Energy efficiency; AI GPU cooling requirement	Retrofit existing DC design
Autonomous Mobile Robot	Now-2030	Rất cao	AMR-100 core product; warehouse automation	Chinese competitor (Geek+, Hikrobot)
Quantum Computing	2030-2035	Thấp-TB	Post-quantum security for DC; long-term play	Distant; monitor only

Xu hướng	Timeframe	Impact	Cơ hội cho Mekong	Rủi ro cho Mekong
Green Hydrogen	2030-2035	Trung bình	Backup power alternative to diesel gen	Infrastructure not ready VN
Cobotic Manufacturing	2026-2030	Cao	Human-robot collaboration in CNC cell	Training workforce

1.12.2. R&D Investment Roadmap Response




Diagram 11

Giai đoạn	R&D Budget (K/năm)	% Revenue	Focus	Output KPIs
Phase 1 (Y1-Y3)	200-400	3-5%	Core products + certification	5 patents, 3 products
Phase 2 (Y4-Y7)	400-800	3-4%	Next-gen + AI integration	10 patents, 5 products
Phase 3 (Y8-Y10)	800-1.200	2-3%	Deep tech + platform scale	20 patents cumulative
Tổng 10 năm	~5.000-7.000	~3%		20+ patents, 10+ products

Kết luận PHẦN I: Với TAM tổng hợp 3 ngành > 100 tỷ USD (ASEAN), market share mục tiêu Y10 chỉ 0,4-1,1% SOM, rào cản gia nhập cao (KCNC + certifications + 3 B.U integration), và dự báo xu hướng công nghệ thuận lợi, Mekong Technology có vị trí thuận lợi để đạt revenue 14,50M USD vào Y10 và 32,00M USD vào Y15 [A][C]. Lộ trình 5 giai đoạn xây dựng (Y0-Y13) cho phép triển khai tuần tự, giảm rủi ro vốn. Rủi ro lớn nhất là execution risk (triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng) chứ không phải market risk.

PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Tổng quan 3 Trụ cột Sản phẩm

Mekong Technology vận hành 3 trụ cột sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao, tạo thành một hệ sinh thái tích hợp phục vụ đồng thời nhu cầu nội bộ và thị trường bên ngoài:

V2.1 — Bố trí trong 1 tòa nhà 3 tầng (GFA 21.000 m²): “Khối C” (IoT) và “Khối B” (CNC) đặt tại Tầng 1 (7.000 m²). “Khối A” (Datacenter) đặt tại Tầng 2. Tầng 3: VP + R&D. Tên “Khối A/B/C” giữ nguyên làm ký hiệu chức năng.

Trụ cột	Tên chính thức	Viết tắt	Diện tích	Nhân sự
Trụ cột 1	Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất IoT Gateway và Robot Tự hành	IoT/Robot	3.000 m² (Tầng 1 — Khu IoT)	80-100
Trụ cột 2	Trung tâm Chế tạo Linh kiện Siêu Chính xác (Mekong Precision Manufacturing Center)	MPMC	4.000 m² (Tầng 1 — Khu CNC)	80-120
Trụ cột 3	Trung tâm Hạ tầng Điện toán Đám mây Mật độ cao (Mekong AI Cloud & Computing Center)	MACC	3.000 m² (Tầng 2)	30-50

Bảng Sản phẩm Chi tiết — 10 Dòng sản phẩm

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Mô tả	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	VA (%)
1	IoT Gateway MK-200 Standard	1	Vi xử lý ARM Cortex-A53, 4GB RAM, WiFi/BLE/4G, 25 I/O analog/digital, giao thức MQTT/OPC UA/Modbus, IP65	4,00	35%
2	IoT Gateway MK-300 AI Edge	1	ARM Cortex-A78 + NPU 6 TOPS, 8GB RAM, AI tại biên (Edge AI), camera AI tích hợp, 5G-ready	6,00	38%
3	Robot AMR-500/1000	1	Robot tự hành di động, LiDAR 3D 360 độ, AI SLAM navigation, tải 500-1.000 kg, tốc độ 1,5 m/s, tự sạc	5,00	40%
4	Robot AGV-500/1000	1	Robot dẫn hướng tự động, hệ thống vision + line following, tải	4,00	35%

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Mô tả	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	VA (%)
			500-1.000 kg, độ chính xác ±5 mm		
5	Robot OHT-100	1	Hệ thống vận chuyển trên cao cho nhà máy bán dẫn, dual rail, 100 kg, 4 trục, Class 100 compatible	2,50	30%
6	Linh kiện khuôn mẫu bán dẫn	2	Dung sai ≤ 3 micromet, Ra ≤ 0,2 micromet, vật liệu NAK80/SKD11/HPM38, xử lý nhiệt + mài bóng gương	2,50	45%
7	Linh kiện hàng không vũ trụ	2	Chứng nhận AS9100 Rev D, vật liệu Titan Grade 5 (Ti-6Al-4V) / Inconel 718, gia công 5 trục đồng thời	3,00	50%
8	Linh kiện ô tô điện	2	Chứng nhận IATF 16949, vật liệu Al 6061-T6 / SCM440, sản lượng lớn, SPC/MSA kiểm soát	4,00	35%
9	Hạ tầng lưu trữ và AI/HPC Computing	3	Datacenter Tier III, 100 Rack (50 Colo 5-10 kW + 50 AI/HPC 15-30 kW), Uptime 99,982%, GPU H100	6,20	58%
10	MekongOS IoT Cloud (SaaS)	3	Nền tảng quản lý IoT, MQTT/OPC UA, Dashboard analytics, AI predictive maintenance, 2.000 thuê bao	3,00	70%
	Tổng (steady-state, từ năm 7)			40,20	42%

2.2. Trụ cột 1 — Sản xuất IoT Gateway và Robot Tự hành

2.2.1. IoT Gateway — Dòng sản phẩm MK-200 và MK-300

Tổng quan Sản phẩm

IoT Gateway là thiết bị trung gian kết nối giữa các cảm biến/thiết bị tại nhà máy với hệ thống quản lý đám mây, đóng vai trò “bộ não biên” (Edge Brain) cho chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất.

Thông số	MK-200 Standard	MK-300 AI Edge
Vi xử lý	ARM Cortex-A53, 4 nhân, 1,8 GHz	ARM Cortex-A78, 8 nhân, 2,8 GHz + NPU 6 TOPS
Bộ nhớ	4 GB LPDDR4 + 32 GB eMMC	8 GB LPDDR5 + 64 GB eMMC + microSD
Kết nối	WiFi 6, BLE 5.2, 4G LTE, Ethernet 1Gbps, RS485/RS232	WiFi 6E, BLE 5.3, 5G Sub-6, Ethernet 2.5Gbps, RS485/RS232/ CAN bus
I/O	25 (12 DI, 8 DO, 3 AI, 2 AO)	35 (16 DI, 10 DO, 5 AI, 4 AO)
Giao thức	MQTT, OPC UA, Modbus RTU/TCP, HTTP/REST	MQTT, OPC UA, Modbus, EtherCAT, PROFINET, HTTP, gRPC
AI tại biên	Không	Có — Vision AI (phát hiện lỗi, đếm sản phẩm), Predictive maintenance
Camera	Không	1 camera 5MP AI tích hợp (tùy chọn)
Bảo vệ	IP65, chịu nhiệt -10°C đến 60°C	IP67, chịu nhiệt -20°C đến 70°C, chống rung IEC 60068
Nguồn	12-48V DC, 8W	12-48V DC, 15W, PoE++
Kích thước	180 × 120 × 45 mm	220 × 150 × 55 mm
Bảo mật	TLS 1.3, TPM 2.0	TLS 1.3, TPM 2.0, Secure Boot, OTA encrypted
Giá bán	800-1.200 USD	1.500-2.500 USD
Thị trường	DNNVV, nhà máy cỡ vừa	Nhà máy FDI, bán dẫn, ô tô, logistics

Xử lý và Sản xuất

Quy trình sản xuất IoT Gateway tại Khối C (SMT): 1. **Sản xuất PCB (in-house SMT):** Paste printing → SPI → Component placement → Reflow soldering → AOI → X-ray (BGA) → Manual rework 2. **Lắp ráp hệ thống:** PCB + Vỏ (CNC machined tại Khối B) + Antenna + Connector → Assembly 3. **Kiểm tra:** Functional test → EMC pre-compliance → Environmental stress screen → Final QC 4. **Firmware:** Flash firmware MekongOS Agent → Calibration → Pairing test → Packaging

Công suất sản xuất: 5.000 thiết bị/năm (MK-200: 3.000, MK-300: 2.000), hoạt động 1 ca [C].

Ứng dụng Tiêu biểu

Ngành	Ứng dụng	Sản phẩm	Số lượng ước/KH/năm
Sản xuất điện tử	Giám sát OEE, SPC tự động	MK-300	10-20
Kho vận, Logistics	Theo dõi hàng hóa, fleet management	MK-200	20-50
Dệt may	Đo đếm sản phẩm, giám sát năng suất	MK-200	30-80
Thực phẩm, Dược phẩm	Giám sát nhiệt độ/độ ẩm, HACCP	MK-200	10-30
Bán dẫn	EES (Equipment Engineering System) integration	MK-300	5-10
Ô tô	Andon, Poka-yoke tự động	MK-300	5-15

2.2.2. Robot AMR-500 và AMR-1000

Tổng quan Sản phẩm

Robot AMR (Autonomous Mobile Robot) là robot tự hành di động, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự xác định vị trí và di chuyển trong nhà máy mà KHÔNG cần dải từ, dây dẫn hay đánh dấu sàn — khác biệt hoàn toàn so với AGV truyền thống.

Thông số	AMR-500	AMR-1000
Tải trọng	500 kg	1.000 kg
Navigation	LiDAR 3D 360° + Camera AI + IMU + Odometry	LiDAR 3D 360° + Camera AI + IMU + UWB Anchor
Thuật toán	AI SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) — huấn luyện trên GPU NVIDIA (Khối A)	AI SLAM + Deep reinforcement learning
Tốc độ	0-1,5 m/s	0-1,2 m/s
Độ chính xác	±10 mm	±10 mm
Truyền thông	WiFi 6 + BLE 5.2, REST API, ROS2 compatible	WiFi 6 + BLE 5.3 + 5G, REST API, ROS2
Pin	LiFePO4 48V/60Ah, thời gian hoạt động 8 giờ	LiFePO4 48V/100Ah, thời gian hoạt động 6 giờ
Sạc	Tự động docking, sạc nhanh 1,5 giờ	Tự động docking, sạc nhanh 2 giờ
An toàn	LiDAR safety scanner (ISO 13849 PLd), Emergency stop, Bumper sensor	Dual LiDAR safety, ISO 13849 PLe, Emergency stop
Phụ kiện	Roller conveyor top module, Lifting module	Roller conveyor, Lifting module, Hook towing module
Kích thước	800 × 600 × 350 mm (không tải)	1.000 × 700 × 400 mm (không tải)
Khối lượng bản thân	120 kg	180 kg
Giá bán	18.000-25.000 USD	28.000-38.000 USD

Quy trình Sản xuất Robot AMR

- Thiết kế cơ khí (CAD/CAM):** Thiết kế 3D trên SolidWorks/Siemens NX → Mô phỏng FEM → Xuất toolpath cho CNC
- Chế tạo khung (CNC tại Khối B):** Phay CNC khung nhôm 6061-T6, bệ gá sensor, tấm đáy → Anodizing → QC kích thước CMM
- Lắp ráp PCB điều khiển (SMT tại Khối C):** Board chính (ARM + Motor driver) → Board sensor → Board power management
- Lắp ráp tổng (Assembly Line tại Khối C):**
 - Khung + Motor + Bánh xe + Encoder
 - LiDAR + Camera + IMU + UWB (tùy phiên bản)
 - Pin LiFePO4 + BMS
 - PCB điều khiển + Wiring harness
 - Vỏ ngoài + Safety scanner
- Huấn luyện AI (GPU tại Khối A):** AI SLAM model → Sim-to-Real transfer → Field calibration
- Kiểm tra:** Accuracy test → Battery cycle test → EMC → Drop test → 72h burn-in → Acceptance test

Mối liên kết Hệ sinh thái: Robot AMR là sản phẩm minh chứng rõ nhất cho giá trị tích hợp 3 trụ cột — Khung CNC từ Khối B, PCB SMT từ Khối C, AI training từ Khối A, và giám sát qua MekongOS từ Cloud.

2.2.3. Robot AGV-500 và AGV-1000

Robot AGV (Automated Guided Vehicle) là phiên bản dẫn đường tự động với chi phí thấp hơn AMR, phù hợp cho các tuyến vận chuyển cố định trong nhà máy:

Thông số	AGV-500	AGV-1000
Tải trọng	500 kg	1.000 kg
Navigation	Vision-based + Magnetic tape (backup)	Vision + LiDAR 2D + Magnetic tape
Tốc độ	0-1,0 m/s	0-0,8 m/s
Độ chính xác	±5 mm (trên line)	±5 mm
Giá bán	12.000-18.000 USD	20.000-28.000 USD
Ưu điểm	Chi phí thấp, dễ triển khai	Tải nặng, phù hợp heavy industry

Công suất sản xuất Robot AGV: 100 bộ/năm (1 ca) [C].

2.2.4. Robot OHT-100

Robot OHT (Overhead Hoist Transport) là hệ thống vận chuyển trên cao chuyên dụng cho nhà máy bán dẫn, vận chuyển wafer cassette (FOUP) giữa các tool trong clean room:

Thông số	OHT-100
Tải trọng	100 kg (2 FOUP)
Rail	Dual rail overhead (trần), chiều cao 2,5-4 m
Trục	4 trục (X, Y, Z, Theta)
Tốc độ	X/Y: 0-2,0 m/s, Z: 0-0,3 m/s
Độ chính xác	±0,5 mm (docking position)
Clean room	Class 100 compatible (ISO 5)
Truyền thông	SECS/GEM, EAP, WiFi, RFID
Giá bán	45.000-65.000 USD

Công suất sản xuất OHT: 50 bộ/năm [C]. Đây là sản phẩm có biên lợi nhuận cao nhất (VA 30%) nhưng thị trường hẹp — chỉ dành cho nhà máy bán dẫn.

2.2.5. MekongOS — Nền tảng IoT Cloud

MekongOS là nền tảng phần mềm IoT Cloud do Mekong Technology tự phát triển, chạy trên hạ tầng Datacenter nội bộ (Khối A), cung cấp dịch vụ SaaS cho khách hàng quản lý IoT và Robot:

Kiến trúc Hệ thống:



Diagram 12

Mô hình Kinh doanh SaaS:

Gói dịch vụ	Mô tả	Giá/tháng	Thiết bị tối đa
Starter	Dashboard cơ bản, 5 widget, lưu trữ 30 ngày	99 USD	10
Professional	Dashboard tùy chỉnh, AI alert, lưu trữ 90 ngày	299 USD	50
Enterprise	Full AI, Digital Twin, API, lưu trữ 1 năm, SLA 99,9%	999 USD	500
Custom	Theo yêu cầu, on-premise option	Thương lượng	Không giới hạn

Doanh thu SaaS dự kiến: 500.000 USD/năm (năm 1) → 3.000.000 USD/năm (năm 5) với 2.000 thuê bao [C].

2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác (MPMC)

2.3.1. Tổng quan Năng lực Sản xuất

Trung tâm Chế tạo Linh kiện Siêu Chính xác (Mekong Precision Manufacturing Center — MPMC) là nhà máy CNC 5 trục đầu tiên của Việt Nam đạt mục tiêu đạt cùng lúc ba chứng nhận: ISO 9001, IATF 16949 (ô tô), và AS9100 Rev D (hàng không vũ trụ).

Thông số	Giá trị
Diện tích	4.000 m ² (Khối B)
Số máy CNC	28 máy (Phase 1: 15, Phase 2: 13)
Loại máy	Phay 5 trục, phay 3 trục, tiện CNC, cắt dây EDM
Dung sai đạt được	≤ 3 micromet
Độ bóng bề mặt	Ra ≤ 0,2 micromet
Vật liệu	Nhôm, thép hợp kim, thép không gỉ, Titan, Inconel, đồng, nhựa kỹ thuật
Công suất	27.000 chi tiết/năm (ổn định)
Chứng nhận mục tiêu	ISO 9001 (Năm 1), IATF 16949 (Năm 2), AS9100 Rev D (Năm 3)
Nhân sự	80-120 người
Ca làm việc	2 ca/ngày (16 giờ effective), 6 ngày/tuần

2.3.2. Danh mục Máy móc Chi tiết

TT	Máy	Hãng	Số lượng	Phase	Giá/máy (K USD)	Tổng (K USD)	Trọng lượng/máy
1	DMU 65 monoBLOCK	DMG MORI (Đức/Nhật)	3	1	550-650	1.650-1.950	8.000 kg

TT	Máy	Hãng	Số lượng	Phase	Giá/máy (K USD)	Tổng (K USD)	Trọng lượng/máy
2	DMU 80P duoBLOCK	DMG MORI	2	2	750-850	1.500-1.700	12.000 kg
3	DVF 5000	Doosan (Hàn Quốc)	5	1	320-380	1.600-1.900	6.500 kg
4	DVF 5000	Doosan	5	2	320-380	1.600-1.900	6.500 kg
5	a51nx	Makino (Nhật Bản)	4	1	300-360	1.200-1.440	5.000 kg
6	a61nx	Makino	4	2	350-420	1.400-1.680	5.500 kg
7	Puma TL2000 (Tiện)	Doosan	3	1	120-160	360-480	3.000 kg
8	MV2400R (Wire EDM)	Mitsubishi (Nhật)	2	1+2	140-180	280-360	2.500 kg
	Tổng		28			9.590-11.410	

Lưu ý Lead Time: Máy CNC 5 trục DMG MORI và Makino có thời gian giao hàng 24-30 tuần từ ngày đặt PO. Để đảm bảo nhận máy Phase 1 trước Q2/2027, Mekong cần đặt PO không muộn hơn Q4/2025 — đây là **Critical Path** của dự án [A].

2.3.3. Hệ thống QA/QC — Phòng Đo lường CMM

Phòng đo CMM (Coordinate Measuring Machine) là trái tim của hệ thống kiểm soát chất lượng CNC, đảm bảo mọi chi tiết gia công đều đạt dung sai yêu cầu:

Thiết bị	Hãng	Số lượng	Giá (K USD)	Thông số
CMM GLOBAL S 7.10.7	Hexagon (Thụy Điển)	1	180-250	Phạm vi 700×1000×700 mm, độ chính xác 1,5+L/333 micromet
CMM PRISMO Ultra	Zeiss (Đức)	1	200-280	Phạm vi 900×1200×800 mm, dùng cho AS9100 audit
Máy quét Laser 3D MetraSCAN	Creaform (Canada)	1	60-85	Độ chính xác 30 micromet, scan 480.000 điểm/giây
Máy đo nhám bề mặt	Mitutoyo (Nhật)	2	15-25	Ra, Rz, Rt measurements
Kính hiển vi đo lường	Keyence (Nhật)	1	35-50	Phóng đại 20-500x, đo 2D/3D

Thiết bị	Hãng	Số lượng	Giá (K USD)	Thông số
Đồ gá kiểm tra (Fixtures)	Tùy chỉnh	20 bộ	40-60	Theo yêu cầu khách hàng
Tổng QA/QC			530-750	

Điều kiện Phòng CMM: - Nhiệt độ: 20°C ± 0,5°C (kiểm soát 24/7) - Độ ẩm: 45-55% - Rung: < 0,05 mm/s (nhỏ hơn 50 lần ngưỡng cho phép CNC) - Sàn chống rungriêng biệt, tách khỏi xưởng CNC - Vách kính trong suốt — cho phép khách hàng FDI quan sát quy trình đo (Visual Audit) - Calibration định kỳ: Mỗi 6 tháng bởi đơn vị được công nhận (A2LA, DAKKS)

2.3.4. Phần mềm CAD/CAM/CAE

Phần mềm	Hãng	Số license	Chi phí/năm (K USD)	Mục đích
Siemens NX	Siemens	5	45-65	CAD/CAM chính, tương thích bản vẽ khách hàng FDI
Mastercam	CNC Software	5	20-30	CAM cho gia công 3 trục và phay phức tạp
VERICUT	CGTech	2	15-22	Mô phỏng và xác minh chương trình CNC (tránh va chạm)
ProShop ERP	ProShop	1	12-18	ERP chuyên cho xưởng CNC (job tracking, scheduling)
PC-DMIS	Hexagon	2	10-15	Lập trình và phân tích kết quả CMM
Tổng phần mềm			102-150	

2.3.5. Quy trình Gia công Tiêu biểu

Quy trình cho linh kiện Titan hàng không — AS9100:



Diagram 13

Thời gian chu kỳ (Lead time): - Linh kiện tiêu chuẩn (nhôm, thép): 2-3 tuần - Linh kiện chính xác cao (IATF): 3-4 tuần - Linh kiện Titan/Inconel (AS9100): 4-6 tuần - Sản phẩm mới (NPI): 6-8 tuần (bao gồm thiết kế fixture + FAI)

2.3.6. Sản phẩm CNC theo Phân khúc

A. Phân khúc Bán dẫn (Semiconductor)

Sản phẩm	Mô tả	Vật liệu	Dung sai	Số lượng/năm	Đơn giá (USD)
IC Mold Insert	Khuôn đúc IC, bề mặt gương Ra ≤ 0,1 μm	NAK80, HPM38	≤ 3 μm	2.000	200-500

Sản phẩm	Mô tả	Vật liệu	Dung sai	Số lượng/năm	Đơn giá (USD)
Lead Frame Tooling	Dụng cụ dập lead frame	SKD11, ASP23	$\leq 5\text{ }\mu\text{m}$	1.000	300-800
Wafer Handling Parts	Chi tiết cho robot xử lý wafer	Al 6061-T6	$\leq 5\text{ }\mu\text{m}$	1.500	150-400
Test Socket	Để test IC	Cu-Be, BeCu	$\leq 10\text{ }\mu\text{m}$	500	100-300

B. Phân khúc Hàng không Vũ trụ (Aerospace)

Sản phẩm	Mô tả	Vật liệu	Dung sai	Số lượng/năm	Đơn giá (USD)
Turbine Blade Fixture	Đồ gá gia công cánh turbine	Inox 316L	$\leq 5\text{ }\mu\text{m}$	200	1.000-3.000
Structural Bracket	Giá đỡ kết cấu máy bay	Titan Ti-6Al-4V	$\leq 10\text{ }\mu\text{m}$	500	500-2.000
Hydraulic Manifold	Khối phân phối thủy lực	Inconel 718	$\leq 8\text{ }\mu\text{m}$	300	2.000-5.000
Engine Component	Chi tiết động cơ phụ	Titan / Inconel	$\leq 5\text{ }\mu\text{m}$	1.000	500-3.000

C. Phân khúc Ô tô Điện (EV Automotive)

Sản phẩm	Mô tả	Vật liệu	Dung sai	Số lượng/năm	Đơn giá (USD)
EV Gearbox Housing	Vỏ hộp số ô tô điện	Al 6061-T6	$\leq 15\text{ }\mu\text{m}$	5.000	80-200
Battery Pack Frame	Khung pin EV	Al 5052	$\leq 20\text{ }\mu\text{m}$	3.000	50-150
Motor Shaft	Trục motor điện	SCM440, SUJ2	$\leq 5\text{ }\mu\text{m}$	5.000	30-80
Brake Caliper Body	Thân phanh	Al 7075-T6	$\leq 10\text{ }\mu\text{m}$	3.000	60-180
Steering Component	Chi tiết hệ lái	Thép hợp kim	$\leq 8\text{ }\mu\text{m}$	4.000	40-120

2.3.7. Doanh thu CNC theo Kịch bản

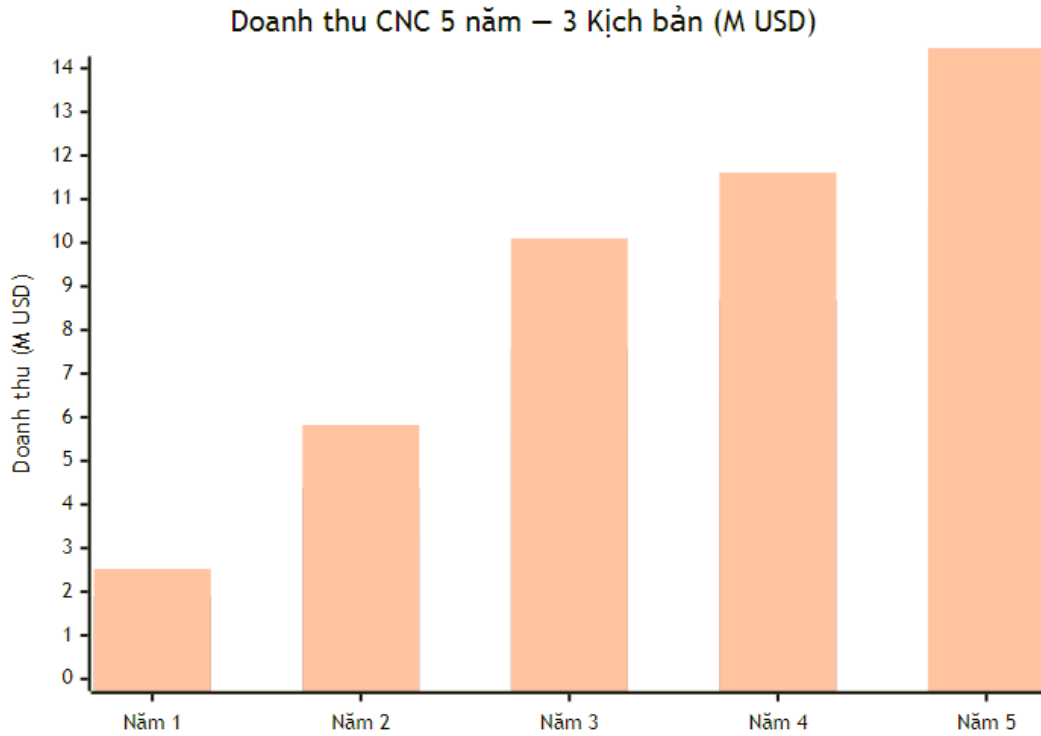


Diagram 14

Năm	Conservative (M USD)	Base Case (M USD)	Optimistic (M USD)
1	1,45	1,89	2,52
2	3,21	4,36	5,82
3	5,67	7,56	10,10
4	6,52	8,70	11,61
5	8,27	10,75	14,46
Tổng 5Y	25,12	33,26	44,51

[C — Tính toán dựa trên utilization rate, product mix, và pricing model]

2.4. Trụ cột 3 — Hạ tầng Điện toán Đám mây AI (MACC)

2.4.1. Tổng quan Kiến trúc Datacenter

Trung tâm Hạ tầng Điện toán Đám mây Mật độ cao (Mekong AI Cloud & Computing Center — MACC) được thiết kế theo tiêu chuẩn **Uptime Institute Tier III** — Concurrently Maintainable, đảm bảo uptime 99,982% (downtime tối đa 1,6 giờ/năm).

Thông số	Giá trị
Diện tích tổng	3.000 m ² (Khối A)
Data Hall	1.200 m ² (Zone 1: 600 m ² , Zone 2: 600 m ²)

Thông số	Giá trị
Tổng Rack	100 (Phase 1: 50, Phase 2: 50)
Tải IT tổng	1,5-3,0 MW
PUE mục tiêu	< 1,35 (sau tối ưu hóa: 1,32)
Cooling	In-Row + Direct-to-Chip Liquid Cooling (Zone 2)
UPS	4 × 1.000 kVA LiFePO4, 15 phút runtime
Generator	2 × 2.500 kVA Diesel (N+1)
Redundancy	2N Power, N+1 Cooling
Tiêu chuẩn	Uptime Tier III, ISO 27001, PCI DSS (target)
Physical Security	Mantrap, Biometric 3-factor, CCTV 24/7, Perimeter fence

2.4.2. Phân vùng Data Hall

Zone	Diện tích	Racks	Tải/Rack	Cooling	Mục đích	Khách hàng
Zone 1 — Colocation	600 m ²	50	5-10 kW	In-Row (chilled water)	Lưu trữ, hosting, DR	Ngân hàng, FDI, Enterprise
Zone 2 — AI/HPC	600 m ²	50	15-30 kW	Direct-to-Chip Liquid + Rear-Door HEX	GPU Compute, AI training	AI startup, R&D, Bán dẫn

2.4.3. Hệ thống Làm mát

Thiết kế cooling là yếu tố quyết định PUE và chi phí vận hành DC:

Zone 1 (Colocation) — In-Row Cooling: - Chilled water loop: Chiller plant → CRAH (Computer Room Air Handler) → Data Hall → Return - Hot Aisle Containment (HAC): Ngăn hành lang nóng, tối ưu nhiệt độ - Set point: Cold aisle 22-24°C - Redundancy: N+1 CRAH per zone

Zone 2 (AI/HPC) — Hybrid Cooling: - Direct-to-Chip Liquid Cooling (Coolant Distribution Unit — CDU): Nước lạnh trực tiếp đến tấm tản nhiệt trên GPU - Rear-Door Heat Exchanger: Tản nhiệt phụ cho phần không thể liquid cool - Cooling tower: Evaporative (make-up water 60-80 m³/ngày sau hybrid) - Free cooling economizer: Khi nhiệt độ ngoài trời < 24°C (~30% thời gian tại TP.HCM)

Tính toán PUE:

Thành phần	Công suất	Ghi chú
IT Load (rated)	2.500 kW	100 Rack × average 25 kW
Cooling overhead	475 kW	19% IT Load (nhờ liquid cooling)
UPS loss	75 kW	3% IT Load (LiFePO4 efficiency 97%)
Lighting + Security	25 kW	1% IT Load
Distribution loss	50 kW	2% IT Load
Facility Total	3.125 kW	

Thành phần	Công suất	Ghi chú
PUE = 3.125 / 2.500	1,25	Target [C]

Thực tế PUE dao động 1,25-1,45 tùy mùa và tải. PUE trung bình năm mục tiêu: **1,32** (tốt hơn mức trung bình VN là 1,55 và tương đương DC Tier III tiên tiến ở Singapore) [C].

2.4.4. Dịch vụ Chi tiết

A. Colocation (Cho thuê chỗ đặt máy chủ)

Gói dịch vụ	Tải/Rack	Giá/Rack/tháng	Hợp đồng	Phí lắp đặt ban đầu
Standard	5 kW	900 USD	1 năm	3.000 USD
Standard Plus	8 kW	1.100 USD	1 năm	5.000 USD
High-Density	15 kW	2.500 USD	3 năm	8.000 USD
AI/HPC	30 kW	4.500 USD	3-5 năm	15.000 USD

B. GPU-as-a-Service

GPU	Giá/giờ	Giá/tháng (reserved)	RAM	Ứng dụng
NVIDIA A100 80GB	3,00-4,00 USD	2.000-2.800 USD	80 GB HBM2e	AI inference, Fine-tuning
NVIDIA H100 SXM5	5,00-7,00 USD	3.500-5.000 USD	80 GB HBM3	LLM training, HPC
8x H100 DGX Pod	—	28.000-40.000 USD	640 GB	Large-scale AI training

C. MekongOS IoT Cloud (SaaS)

Chi tiết tại Mục 2.2.5.

D. Dịch vụ Kết nối và Bảo mật

Dịch vụ	Giá/tháng	Mô tả
Cross-connect 1Gbps	200 USD	Kết nối giữa các rack
Internet Transit 1Gbps	500 USD	Băng thông Internet dedicated
Dark Fiber (KCNC)	300 USD	Kết nối quang riêng đến DN trong KCNC
SOC Monitoring (24/7)	800 USD	Giám sát an ninh mạng
Managed Firewall	400 USD	Tường lửa quản lý
Backup-as-a-Service	200 USD/TB	Sao lưu dữ liệu

2.4.5. Lộ trình Occupancy

Năm	Racks sử dụng	Occupancy	Doanh thu (M USD)
1	20-25	20-25%	1,17-1,45
2	35-45	35-45%	1,85-2,33
3	50-60	50-60%	2,33-2,80
4	60-75	60-75%	2,80-3,15
5	70-85	70-85%	3,15-3,46

[C — Dựa trên pre-lease strategy: LOI từ Q1/2028 trước khi grand open Q2/2028]

2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 3 Trụ cột

2.5.1. Ma trận Liên kết Giá trị

Từ → Đến	IoT/Robot (Khối C)	CNC/MPMC (Khối B)	DC/MACC (Khối A)
IoT/Robot	—	Bản vẽ CNC cho khung Robot	Dữ liệu IoT → Cloud Analytics
CNC/MPMC	Khung, vỏ, trục robot AMR	—	Gia công heat sink, rack mount
DC/MACC	GPU cho AI SLAM training	IoT giám sát hiệu suất CNC	—

2.5.2. Lượng hóa Giá trị Cộng hưởng

Liên kết	Giá trị/năm (USD)	Phương pháp
CNC chế tạo khung Robot (thay vì outsource)	150.000-200.000	Chi phí tiết kiệm = 15-20% × COGS khung [A]
DC cung cấp GPU cho AI SLAM (thay vì thuê AWS)	200.000-500.000	So sánh OPEX AWS vs in-house [A]
MekongOS trên DC nội bộ (thay vì AWS hosting)	100.000-200.000	Chênh lệch cloud hosting cost [A]
Cross-sell FDI (CNC → DC)	300.000-800.000	Revenue uplift từ khách hàng chung [A]
IoT giám sát CNC (tăng utilization)	50.000-100.000	5-10% Utilization improvement [A]
Tổng Synergy Value/năm	800.000-1.800.000	
NPV Synergy 10 năm (WACC 12%)	~2.200.000	[C]

2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ

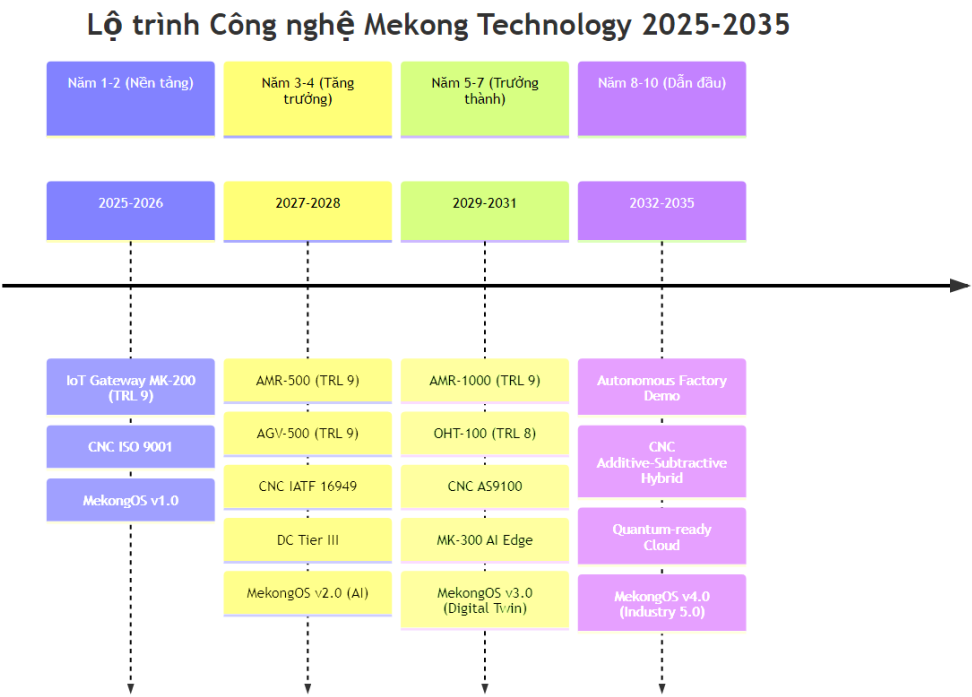


Diagram 15

2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

2.7.1. Ngân sách R&D

Năm	Doanh thu (M USD)	R&D (M USD)	Tỷ lệ R&D/DT
1	4,50	0,45	10%
2	7,00	0,70	10%
3	11,50	1,15	10%
4	14,00	1,12	8%
5	16,00	1,28	8%
Tổng 5 năm		4,70	~9%
Tổng 10 năm		~12,50	~8%

[C — Cam kết tỷ lệ R&D ≥ 5%, mục tiêu nội bộ 8-12%]

2.7.2. Phòng Thí nghiệm R&D

Mekong Technology xây dựng 5 phòng thí nghiệm chuyên dụng:

TT	Phòng Lab	Diện tích	Chức năng	Đầu tư (K USD)
1	Lab Phần cứng IoT	150 m ²	Thiết kế PCB, prototyping, EMC pre-compliance	250
2	Lab AI & Robotics	200 m ²	Phát triển AI SLAM, Computer Vision, ROS2	350
3	Lab Vật liệu CNC	80 m ²	Phân tích cấu trúc kim loại, metallography	180
4	Lab Đo lường Chính xác (CMM Room)	120 m ²	CMM, Laser scan, QC R&D	(thuộc Khối B)
5	Lab Cloud & Cybersecurity	50 m ²	Dev/Test MekongOS, Pen testing, Security audit	120
	Tổng	600 m²		900

2.7.3. Hợp tác Chuyển giao Công nghệ (CGCN)

Đối tác	Quốc gia	Lĩnh vực	Nội dung hợp tác
DMG MORI Academy	Nhật Bản/Đức	CNC	Đào tạo vận hành 5 trục, tối ưu toolpath
Hexagon Manufacturing Intelligence	Thụy Điển	QA/QC	Đào tạo CMM programming, GD&T
NVIDIA Deep Learning Institute	Mỹ	AI/GPU	Certified AI Developer program
Uptime Institute	Mỹ	Datacenter	Tier III Design & Operations certification
Đại học Bách Khoa TP.HCM	Việt Nam	R&D	Hợp tác nghiên cứu Robot + AI
Đại học Quốc gia TP.HCM	Việt Nam	R&D	Hợp tác đào tạo kỹ sư IC Design

2.7.4. Sở hữu Trí tuệ

Loại	Mục tiêu 5 năm	Mục tiêu 10 năm	Chi tiết
Bằng sáng chế	8-10	20-25	IoT Gateway architecture, AI SLAM algorithm, CNC process
Nhãn hiệu	5	8	MekongOS, MPMC, MACC, MK-200, MK-300
Bản quyền phần mềm	3	6	MekongOS Platform, Fleet Manager, CNC

Loại	Mục tiêu 5 năm	Mục tiêu 10 năm	Chi tiết
			Monitor
Bí mật kinh doanh	Liên tục	—	CNC process parameters, AI models, customer data

[A — Mục tiêu dựa trên benchmark doanh nghiệp CNC tương đương tại KCNC]

2.8. Chi tiết Kỹ thuật CNC 5-Axis Machining Center

2.8.1. Danh sách Máy CNC — Phase 1 (28 máy)

#	Model	Xuất xứ	Loại	Hành trình XYZ (mm)	Trục quay	Công suất (kW)	Tốc độ (rpm)	Đơn giá (K)	SL	Thành tiền (K)
1	DMG MORI DMU 80 eVo	JP/DE	5-axis	800×650×550	B+C	35	18.000	450	5	2.250
2	DMG MORI NLX 2500/700	JP	CNC Lathe	Ø366×705	C	26	4.000	280	4	1.120
3	Mazak VCN-530C	JP	VMC 3-axis	1.050×530×510	—	30	12.000	180	6	1.080
4	Mazak INTEGREX i-200S	JP	Multi-tasking	Ø660×1.519	B+C	30	5.000	380	3	1.140
5	Sodick ALC600G	JP	Wire EDM	600×400×350	—	5	—	120	2	240
6	Okuma MB-56VA	JP	VMC 3-axis	1.300×560×460	—	22	8.000	150	4	600
7	Haas UMC-750	US	5-axis	762×508×508	A+C	22	12.000	200	2	400
8	Tsugami B0205G-III	JP	Swiss Lathe	Ø20	8-axis	5	10.000	85	2	170
									28	7.000

2.8.2. Thiết bị QC / Đo lường

#	Thiết bị	Model	Hãng	Kích thước đo	Độ chính xác	Đơn giá (K)	SL	Thành tiền (K)
1	CMM	CONTURA G2	Zeiss (DE)	900×1.200×800 mm	±1.8 µm	250	1	250

#	Thiết bị	Model	Hãng	Kích thước đo	Độ chính xác	Đơn giá (K)	SL	Thành tiền (K)
2	Vision System	QV302	Mitutoyo (JP)	300×200 mm	±3 μm	120	1	120
3	Surface Roughness	Surftest SJ-410	Mitutoyo	—	Ra 0,001 μm	8	2	16
4	Hardness Tester	HV-120D	Shimadzu (JP)	—	HV ±2%	6	1	6
5	Height Gauge	QM-Height 600	Mitutoyo	600 mm	±2 μm	12	2	24
6	Laser Scanner	HandySCAN 3D	Creaform (CA)	0.3m range	±0.025 mm	45	1	45
7	Microscope	Stemi 508	Zeiss	6.3:1-50:1 zoom	Optical	5	2	10
8	Profile Projector	PJ-H30	Mitutoyo	300 mm screen	±0.01 mm	18	1	18
								489

Tổng CNC Machines + QC: 7.000 + 489 = 7.489K [C — Đối chiếu với PHỤ LỤC Q.2: CAPEX CNC Phase 1 = 14.690K bao gồm M&E + infrastructure]

2.8.3. Process Capability Matrix

Quá trình	Tolerance đạt được	Ra (μm)	Vật liệu chính	Typical Parts
5-Axis Milling	±0,005 mm	0,4-0,8	Ti-6Al-4V, Inconel 718, Al 7075	Aerospace bracket, medical implant
3-Axis Milling	±0,01 mm	0,8-1,6	SS304/316, Al 6061, Brass	Automotive housing, heatsink
CNC Turning	±0,005 mm	0,4-0,8	SS303, Al 2024, Monel	Shaft, bushing, connector
Multi-task (Mill-Turn)	±0,008 mm	0,8-1,2	Titanium, Hastelloy	Complex valve body, manifold
Wire EDM	±0,003 mm	0,2-0,4	D2 Steel, Carbide, Tungsten	Die, punch, micro parts
Swiss Turning	±0,003 mm	0,2-0,4	SS316L, Brass, Titanium	Micro screw, pin, medical component

2.8.4. Công suất Sản xuất Dự kiến

Chỉ tiêu	Y1	Y2	Y3	Y5	Y10
Số máy hoạt động	15	20	24	28	35+
Cả sản xuất	2 ca (16h)	2 ca	3 ca (24h)	3 ca	3 ca + auto

Chỉ tiêu	Y1	Y2	Y3	Y5	Y10
Utilization target	50%	65%	75%	85%	90%
Machine hours/năm	43.800	75.920	131.400	171.360	229.950
MHR (USD)	45-85	45-85	50-90	55-95	55-95
Revenue potential (K)	2.628-3.723	4.556-6.453	7.884-11.826	11.338-16.279	15.197-21.845
Revenue target (K)	2.500	4.500	7.500	10.750	~15.000
% Capacity utilized	67-95%	70-99%	63-95%	66-95%	69-99%

Capacity buffer luôn > 5% đảm bảo có room cho urgency orders (surcharge 30-50%) và không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Target utilization 85% Y5 là benchmark tốt cho CNC outsourcing (industry average: 70-80%) [B].

2.9. Chi tiết Thiết kế Data Center — Tier III

2.9.1. Thông số Tier III Design

Thông số	Giá trị	Tiêu chuẩn	Ghi chú
Uptime Target	99,982%	Uptime Institute Tier III	Max 1,6h downtime/năm
Redundancy	N+1 (all MEP components)	ANSI/TIA-942	Active-active preferred
Power Architecture	2N power path (main)	Tier III	A+B feeds to each rack
Cooling	N+1 chiller + DX backup	ASHRAE TC 9.9	Hot/Cold aisle containment
Fire Suppression	NOVEC 1230 + VESDA	NFPA 75, NFPA 2001	Pre-action in server room
Physical Security	5-layer access control	ISO 27001	Biometric + mantrap
Monitoring	DCIM + BMS 24/7		> 10.000 sensor points
Connectivity	Carrier-neutral, 3+ ISPs		VNPT, FPT, Viettel, CMC

2.9.2. Power Design Layout

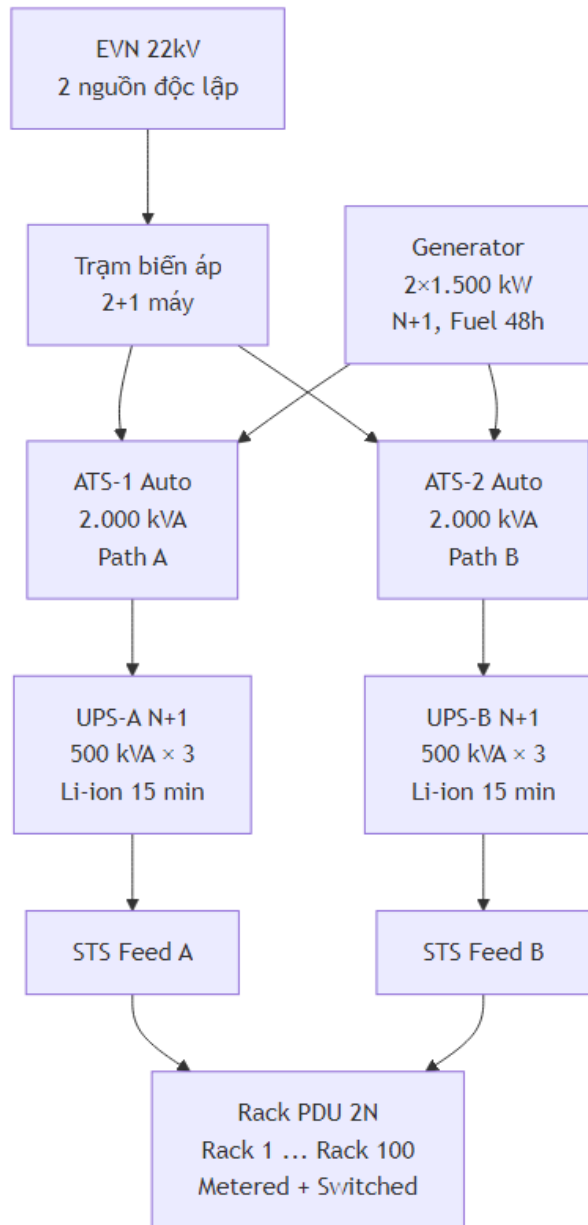


Diagram 16

Component	Specification	Qty	Unit Cost (K)	Total (K)
Transformer 22kV/0.4kV	2.000 kVA, oil-type	3 (2+1)	80	240
ATS	2.000A, 4-pole	2	25	50
UPS (Li-ion)	500 kVA modular	6 (3+3, N+1 each)	120	720
Diesel Generator	1.500 kW, Cummins	2 (N+1)	350	700
Fuel Tank	48h autonomy, 20.000L	2	15	30
PDU	Intelligent metered, 32A	200 (2/rack)	3	600

Component	Specification	Qty	Unit Cost (K)	Total (K)
Busway	3.200A copper	300m	0,5/m	150
Panel boards + CBs		Lot		200
Tổng Power				2.690

2.9.3. Cooling Design

Component	Specification	Qty	Unit Cost (K)	Total (K)
Chiller (air-cooled)	500 RT, variable speed	3 (N+1)	180	540
CRAH Unit	100 kW, EC fan	12	25	300
In-Row Cooling	30 kW (high-density area)	8	18	144
Piping + Pump	Primary + Secondary loop	Lot		150
Chilled water tank	50 m³ buffer	1	20	20
Hot/Cold aisle containment	Panels + doors	8 aisles	15	120
Tổng Cooling				1.274
PUE Design	1,32 (P1), target 1,26 (P2)			

2.9.4. Rack Layout — Hall Plan




Diagram 17

Total: 6 rows × 20 = 120 racks (Phase 1), expandable to 200 (Phase 2)

2.10. Chi tiết Thiết kế IoT Products

2.10.1. MK-200 IoT Gateway — Block Diagram

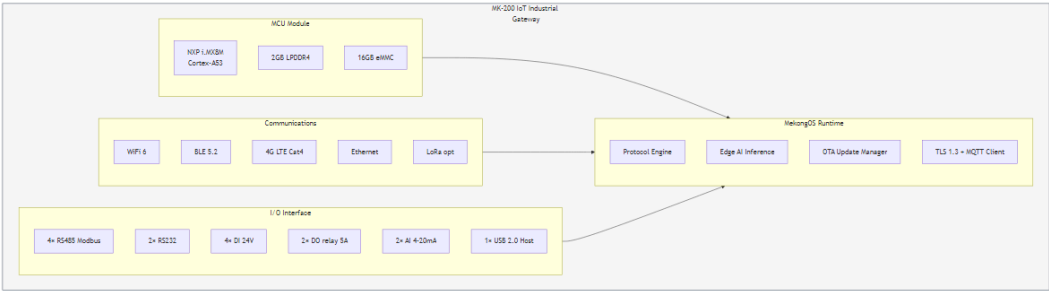


Diagram 18

Power: 12-48V DC (industrial) | -20°C to +70°C | IP54 | Size: 160×100×45 mm | DIN rail mount | CE/FCC certified

2.10.2. AMR-100 Autonomous Mobile Robot — Specifications

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Tải trọng	100 kg (standard), 200 kg (option)	Đúng tên: AMR-100
Tốc độ	0-2,0 m/s	Adjustable
Thời gian hoạt động	8-10 giờ (100 kg load)	LiFePO4 51,2V / 60Ah
Thời gian sạc	2 giờ (auto-dock)	Wireless charging option
Navigation	SLAM (LiDAR + Camera fusion)	AI-based path planning
Obstacle avoidance	360° LiDAR + 8 ultrasonic	0,05m precision
Communication	WiFi 6 + 5G (option)	MekongOS Fleet Manager
Localization accuracy	±30 mm	In mapped environment
Map area	Up to 50.000 m²	Multi-floor support
Dimensions	800×600×350 mm	Compact for narrow aisle
Weight	85 kg (no payload)	
Safety	ISO 3691-4, CE, UL	Emergency stop + safety bumper
Operating temp	0-45°C	Indoor use
IP Rating	IP42	Indoor warehouse
COGS	16.000 USD	[C — PHỤ LỤC T]
ASP	30.000 USD	Margin: 46,7% [C]

2.10.3. MekongOS Platform Architecture

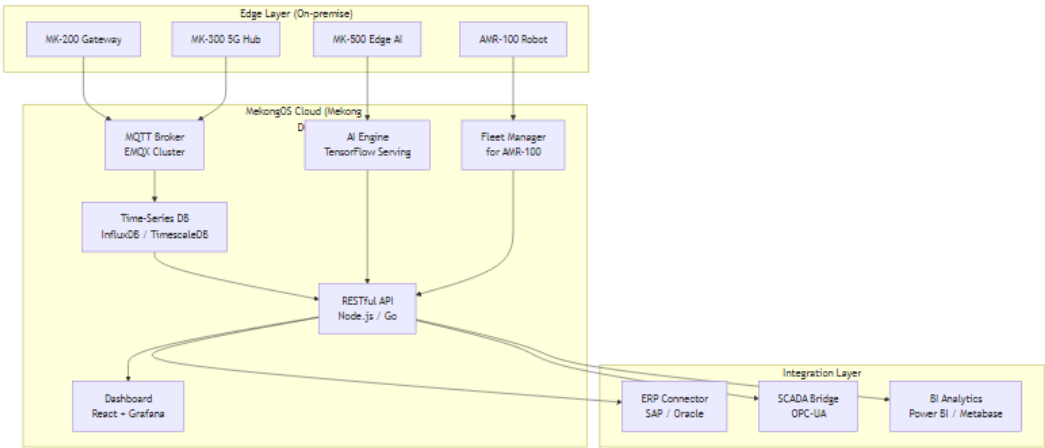


Diagram 19

Module	Tech Stack	Dev Effort (man-month)	Cost (K)
Device Management	EMQX + custom agent	6	60
Data Pipeline	Kafka + InfluxDB	8	80
API Gateway	Kong + custom Go API	4	40
Dashboard	React + Grafana + custom	10	100
AI Engine	Python + TensorFlow + MLflow	12	120
Fleet Manager	Go + Redis + PathPlanner	10	100
Mobile App	React Native	6	60
Security Layer	Vault + cert manager	4	40
OTA System	Custom (delta updates)	6	60
Tổng MekongOS		66	660

[C — Đối chiếu: MekongOS R&D 660K = PHỤ LỤC T.5 = 66 man-months]

PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH

3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu

Mekong Technology vận hành mô hình doanh thu đa dạng từ 3 trụ cột, với 12 nguồn doanh thu (revenue streams) phân loại thành 4 nhóm:

Nhóm 1: Doanh thu Sản phẩm (Product Revenue)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y5
1	Bán IoT Gateway	1	Bán dứt + Bảo hành 1 năm	18%
2	Bán Robot AMR/AGV/OHT	1	Bán dứt + Hợp đồng bảo trì	20%

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y5
3	Gia công CNC B2B	2	Hợp đồng cung ứng 1-5 năm	25%

Nhóm 2: Doanh thu Dịch vụ Định kỳ (Recurring Revenue)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y5
4	MekongOS SaaS	1+3	Thuê bao tháng/năm	8%
5	Colocation DC	3	Hợp đồng 1-5 năm	7%
6	GPU-as-a-Service	3	Thanh toán theo giờ/tháng	9%
7	Managed Services DC	3	Retainer hàng tháng	3%

Nhóm 3: Doanh thu Kết nối (Connectivity Revenue)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y5
8	Internet Transit / Dark Fiber	3	Băng thông tháng	2%
9	Cross-connect	3	Liên kết rack-to-rack	1%

Nhóm 4: Doanh thu Giá trị gia tăng (VAS Revenue)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y5
10	SOC/Cybersecurity	3	Giám sát 24/7	2%
11	Bảo trì Robot (AMR/AGV)	1	Hợp đồng bảo trì hàng năm	3%
12	Đào tạo CNC	2	Khóa đào tạo cho đối tác	2%

Cơ cấu Doanh thu theo Năm

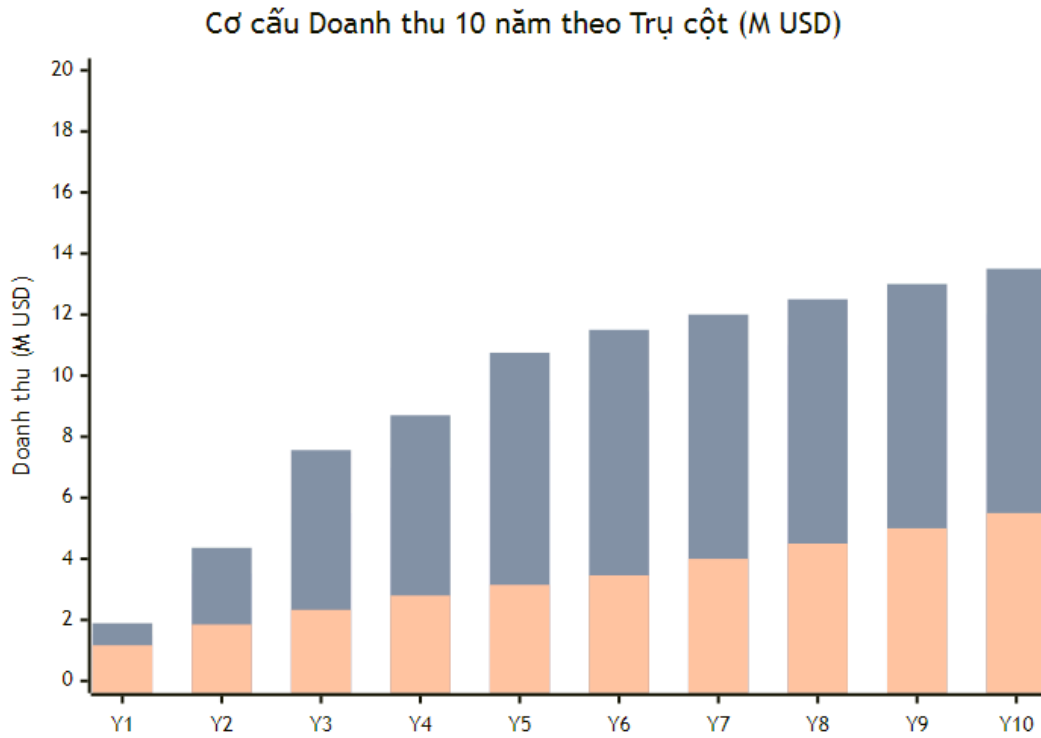


Diagram 20

Năm	IoT/Robot (M USD)	CNC (M USD)	Datacenter (M USD)	Tổng (M USD)
1	1,50	1,89	1,17	4,56
2	3,50	4,36	1,85	9,71
3	5,50	7,56	2,33	15,39
4	7,00	8,70	2,80	18,50
5	8,50	10,75	3,15	22,40
6	9,50	11,50	3,46	24,46
7	10,50	12,00	4,00	26,50
8	11,00	12,50	4,50	28,00
9	11,50	13,00	5,00	29,50
10	12,00	13,50	5,50	31,00
Tổng 10Y	80,50	99,82	33,76	~214,08

Lưu ý: Bảng trên dùng doanh thu steady-state forecast (từ mô hình 00_PHUONG_AN ban đầu). Trong mô hình tài chính V2.1 chính thức (Phần V), doanh thu 15 năm Base Case ~165 M USD, với Y0-Y4 = 0 (giai đoạn xây dựng), Y6 = 2,50 M (IoT khai trương), Y10 = 14,50 M, Y15 = 32,00 M — khác biệt do áp dụng lộ trình 5 giai đoạn và ramp-up tuần tự [C].

3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận

3.2.1. Phân loại Khách hàng

Nhóm	Mô tả	Quy mô	Trụ cột phục vụ	Chiến lược
FDI Top-tier	Samsung, Intel, Bosch, VinFast	5-10 KH	CNC + IoT	Account-Based Marketing, Đội sales chuyên biệt
FDI Mid-tier	Nidec, Jabil, Canon, Renesas	10-20 KH	CNC + IoT + DC	Trade show + Giới thiệu từ FDI Top
VN Enterprise	VNPT, FPT, VNG, Techcombank	20-50 KH	DC + IoT	Digital marketing + Partner channel
KCNC Ecosystem	DN trong KCNC HCM	50-100 KH	DC + IoT Cloud	On-site demo + Ưu đãi proximity
DNNVV	Sản xuất nhỏ và vừa	500-2.000 KH	IoT SaaS	Online sales + Channel partner

3.2.2. Chiến lược Bán hàng theo Trụ cột

CNC — B2B Direct Sales: - Thời gian closing: 3-12 tháng (đặc thù gia công B2B) - Quy trình: First Article Inspection (FAI) → Trial order (10-50 chi tiết) → Volume order → Annual contract - Payment terms: Net 30-60 ngày (chuẩn FDI) - Key Performance: ≥ 3 LOI được ký trước khi vận hành, Doanh thu ≥ 0,22 M năm 1

DC — Pre-Lease + Enterprise Sales: - Thời gian closing: 6-18 tháng (DC contract lớn) - Quy trình: LOI từ Q1/2028 → Soft launch Q2/2028 → Grand open Q3/2028 - Contract structure: 1 năm (Standard), 3 năm (High-Density), 5 năm (AI/HPC) - Upfront: 3.000-15.000 USD installation fee

IoT — Multi-Channel: - Kênh trực tiếp: Đội sales 10-15 người (Key Account + Regional) - Kênh gián tiếp: 5-10 đại lý (System Integrators, VAR) - Kênh online: Website, MekongOS trial, Webinar - Closing time: 1-6 tháng

3.3. Chiến lược Phát triển Ba Giai đoạn




Diagram 21

Giai đoạn	Thời gian	CAPEX	Mục tiêu chiến lược	Revenue target
Phase 1: Nền tảng	2025-2027	28,90 M	Xây dựng hạ tầng, CNC cơ bản, IoT sản xuất, hạ tầng IT nội bộ	4-10 M/năm
Phase 2: Tăng trưởng	2028-2030	18,60 M	DC thương mại, CNC mở rộng + chứng nhận, IoT scale-up	10-22 M/năm
Phase 3: Dẫn đầu	2030+	Tái đầu tư	Xuất khẩu ASEAN, CNC Aerospace,	> 30 M/năm

Giai đoạn	Thời gian	CAPEX	Mục tiêu chiến lược	Revenue target
			DC mở rộng 200+ Racks	

3.4. Kênh Phân phối và Đối tác Chiến lược

3.4.1. Đối tác Chiến lược

Đối tác	Loại hình	Lĩnh vực	Giá trị hợp tác
DMG MORI Vietnam	Nhà cung cấp	CNC	Mua máy + Đào tạo + Bảo trì
NVIDIA	Nhà cung cấp	GPU	DGX Partner + Deep Learning Cert
Schneider Electric	Nhà cung cấp	Hạ tầng DC	UPS + PDU + Cooling + DCIM
Siemens	Nhà cung cấp	Phần mềm	NX CAD/CAM + MindSphere IoT
FPT Telecom	Đối tác	Kết nối	Dark fiber KCNC + Internet transit
Hexagon Manufacturing Intelligence	Nhà cung cấp	QA/QC	CMM + Phần mềm + Đào tạo
JETRO Vietnam	Hỗ trợ	B2B Match	Kết nối nhà sản xuất Nhật cần CNC
KOTRA Vietnam	Hỗ trợ	B2B Match	Kết nối nhà sản xuất Hàn cần CNC
Bộ KH&CN / NATEC	Chính phủ	R&D Grant	Hỗ trợ đề tài R&D + Trợ cấp

3.4.2. Mô hình Kinh doanh Canvas (Business Model Canvas)

Khối	Nội dung
Đề xuất Giá trị	Hệ sinh thái CNC tích hợp duy nhất tại VN: IoT + CNC + DC, giảm chi phí 20-30% cho FDI, one-stop solution
Phân khúc KH	FDI (Samsung, Intel, Bosch), Enterprise VN, DNNVV, KCNC Ecosystem
Kênh tiếp cận	Direct sales (CNC/DC), Digital + Channel (IoT), On-site demo (KCNC)
Quan hệ KH	Dedicated Account Manager (FDI), Self-service (SaaS), Community (KCNC)
Dòng doanh thu	CNC gia công (25%), IoT bán sản phẩm (38%), DC recurring (22%), SaaS (8%), VAS (7%)
Tài nguyên chính	28 máy CNC, 100 Rack DC, 5 Lab R&D, 205-300 nhân sự, IP (MekongOS + Patents)

Khối	Nội dung
Hoạt động chính	Gia công CNC → Sản xuất IoT → Vận hành DC → Phát triển MekongOS → R&D
Đối tác chính	DMG MORI, NVIDIA, Schneider, Siemens, FPT Telecom, JETRO/KOTRA
Cơ cấu chi phí	CAPEX 47,5M, OPEX: Nhân sự 35%, Nguyên vật liệu 25%, Điện 15%, Bảo trì 10%, Khác 15%

3.5. Chiến lược Giá Chi tiết (Pricing Strategy)

3.5.1. Nguyên tắc Định giá

Mekong Technology áp dụng **chiến lược giá phân tầng** (tiered pricing) cho từng trụ cột, dựa trên 4 nguyên tắc:

- Cost-Plus Baseline:** Giá sàn = chi phí biến đổi + phân bổ chi phí cố định + biên lợi nhuận tối thiểu 15%
- Value-Based Ceiling:** Giá trần = giá trị cảm nhận của khách hàng (willingness-to-pay), benchmark theo đối thủ trong khu vực
- Penetration Entry:** Giai đoạn đầu (Y1-Y2), áp dụng giá thâm nhập thấp hơn 10-15% so với thị trường để xây dựng portfolio
- Premium Upsell:** Từ Y3+, sau khi có chứng nhận (IATF, AS9100, Tier III), nâng giá lên ngang hoặc cao hơn thị trường 5-10%

3.5.2. Bảng Giá Trụ cột 1 — IoT/Robot

Sản phẩm	Giá Bán (USD)	Giá Vốn (USD)	Biên Gộp	Benchmark Thị trường	Chiến lược
MK-200 IoT Gateway (cơ bản)	350-450	180-220	48-51%	Advantech: 500-700	Thấp hơn 30% → thâm nhập
MK-300 IoT Gateway (nâng cao)	650-850	320-400	50-53%	Cisco IR1101: 900-1.200	Thấp hơn 25% → thâm nhập
MK-500 Edge AI Gateway	1.200-1.800	600-900	50%	NVIDIA Jetson kit: 1.500-2.500	Tương đương → value-added
Robot AMR-100 (1 tấn)	25.000-35.000	15.000-20.000	40-43%	MiR250: 35.000-50.000	Thấp hơn 25-30%
Robot AGV-200 (2 tấn)	35.000-50.000	20.000-30.000	40-43%	Geek+: 40.000-60.000	Thấp hơn 15-20%
Robot OHT-500 (Semiconductor)	80.000-120.000	50.000-70.000	38-42%	Daifuku: 120.000-180.000	Thấp hơn 30% → Blue Ocean
MekongOS SaaS (Basic)	29/tháng/thiết bị	8/tháng	72%	ThingsBoard Pro: 50-100/th	Thấp nhất thị trường

Sản phẩm	Giá Bán (USD)	Giá Vốn (USD)	Biên Gộp	Benchmark Thị trường	Chiến lược
MekongOS SaaS (Pro)	79/tháng/thiết bị	15/tháng	81%	AWS IoT: 100-200/th	Giá trị cao, tích hợp
MekongOS SaaS (Enterprise)	199/tháng/thiết bị	30/tháng	85%	PTC ThingWorx: 300+	Customized, on-prem option

[C] **Biên gộp IoT trung bình: 45-55% (phần cứng) + 72-85% (SaaS).** SaaS margin cao nhờ chi phí cận biên gần zero sau phát triển ban đầu. Blended margin hướng tới 55-60% khi tỷ trọng SaaS tăng dần.

3.5.3. Bảng Giá Trục cột 2 — CNC Outsourcing

Dịch vụ	Đơn giá (USD)	Chi phí (USD)	Biên Gộp	Benchmark	Ghi chú
CNC 3 trục — Nhôm (Al 6061/7075)	28-40/giờ máy	18-22	36-45%	VN market: 25-35	Có tính cạnh tranh
CNC 3 trục — Thép (S45C/SCM)	30-42/giờ máy	20-25	33-40%	VN market: 28-38	Tương đương
CNC 5 trục — Nhôm	45-55/giờ máy	28-32	38-42%	TW/TH: 50-70	Thấp hơn khu vực 15%
CNC 5 trục — Thép/Inox	55-70/giờ máy	35-42	36-40%	TW/TH: 65-90	Thấp hơn khu vực 20%
CNC 5 trục — Titan (Ti6Al4V)	80-120/giờ máy	50-70	38-42%	Nhật/Đức: 120-180	Thấp hơn 35% → USP
CNC 5 trục — Inconel 718	90-140/giờ máy	60-85	33-39%	Nhật/Đức: 140-200	Thấp hơn 30%
Đo lường CMM (FAI)	150-300/báo cáo	80-150	47-50%	Thị trường: 200-500	Competitive
Surface Treatment (Anodize)	+15-25%	Outsource	8-12%	N/A	Quản lý subcontractor
Đào tạo CNC (khóa 3 tháng)	3.000-5.000/người	1.500-2.500	50%	DMG MORI: 8.000-12.000	Giá thấp, upsell gia công

[C] **Biên gộp CNC trung bình: 35-42%.** Giá machine hour tăng dần nhờ chứng nhận: ISO 9001 (+5%), IATF 16949 (+10-15%), AS9100 (+20-25%). Giá Y1 (entry) thấp hơn Y5 (certified) khoảng 25-35%.

Lộ trình Tăng giá CNC theo Chứng nhận:

Giai đoạn	Chứng nhận	Hệ số Giá	Ví dụ: 5-trục Titan/giờ
Y1 (Entry)	Chưa có	1,00×	80 USD
Y2 (ISO 9001)	ISO 9001:2015	1,05-1,10×	84-88 USD
Y3 (IATF)	IATF 16949	1,15-1,25×	92-100 USD
Y4-5 (AS9100)	AS9100 Rev D	1,25-1,40×	100-112 USD
Y5+ (Nadcap)	Nadcap Non-Destructive Testing	1,35-1,50×	108-120 USD

3.5.4. Bảng Giá Trụ cột 3 — Datacenter

Dịch vụ	Đơn giá	Chi phí	Biên Gộp	Benchmark	Ghi chú
Colocation Standard (1U)	120-180 USD/tháng	60-90	50%	VNG Cloud: 150-250, FPT: 130-200	Competitive
Colocation High-Density (>5kW)	250-400 USD/tháng	130-200	48-50%	Equinix SG: 500-800	Thấp hơn SG 50%
Full Rack Standard (42U, 4kW)	1.200-1.800 USD/tháng	600-900	50%	VN market: 1.500-2.500	Competitive
Full Rack High-Density (42U, 10kW)	2.500-4.000 USD/tháng	1.300-2.000	48-50%	VN hiếm, SG base	Niche → premium
GPU-as-a-Service (A100)	2,50-3,50 USD/GPU-giờ	1,20-1,80	49-52%	AWS p4d: 8,50-32/h	Thấp hơn 60-70%
GPU-as-a-Service (H100)	4,00-6,00 USD/GPU-giờ	2,00-3,00	50%	AWS p5d: 12-40/h	Thấp hơn 50-66%
Managed Hosting	500-1.500 USD/tháng	250-750	50%	FPT Smart Cloud: 800-2.000	Competitive
Cross-Connect (per link)	100-200 USD/tháng	20-40	80%	Equinix: 200-400	High margin
Internet Transit (per Mbps)	3-8 USD/Mbps/tháng	1,5-4	50%	Tại VN: 5-15	Competitive
Disaster Recovery (DR)	800-2.000 USD/tháng	400-1.000	50%	Viettel IDC: 1.000-3.000	Growing demand
SOC/Security Monitoring	1.000-3.000 USD/tháng	500-1.500	50%	Global: 2.000-10.000	VN price advantage

[C] Biên gộp DC trung bình: 48-52%. Cross-connect có margin cao nhất (80%) nhờ chi phí cận biên

thấp. GPU-as-a-Service có margin ~50% nhưng Revenue/Rack cao gấp 3-5× colocation standard.

3.5.5. Chiến lược Giá theo Hợp đồng

Loại hợp đồng	Thời hạn	Chiết khấu	Áp dụng	Cam kết tối thiểu
Spot / Trial	1-3 tháng	0%	Tất cả	Không
Annual Standard	12 tháng	5-8%	Tất cả	Thanh toán quý
Multi-Year Premium	24-36 tháng	10-15%	DC + CNC lớn	Thanh toán quý, penalty 3 tháng nếu chấm dứt sớm
Strategic Partner	36-60 tháng	15-20%	FDI Top-tier	Revenue share, joint marketing
Volume Discount	Theo sản lượng	5-12%	CNC volume >500 giờ/tháng	Cam kết sản lượng tối thiểu

3.6. Kinh tế Đơn vị (Unit Economics)

3.6.1. IoT/Robot Unit Economics

A. MK-200 IoT Gateway:

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Average Selling Price (ASP)	400 USD	Giá trung bình sau chiết khấu
Bill of Materials (BOM)	150 USD	PCB + Components + Enclosure
Manufacturing Cost (SMT + Assembly)	30 USD	0,5 giờ SMT + 1 giờ assembly
Testing & QC	10 USD	Burn-in + Functional test
COGS	190 USD	BOM + Mfg + QC
Gross Margin	210 USD (52,5%)	
Packaging & Logistics	5 USD	
Warranty Reserve (2%)	8 USD	
Sales Commission (8%)	32 USD	
Contribution Margin	165 USD (41,3%)	

B. Robot AMR-100 (1 tấn):

Thông số	Giá trị	Ghi chú
ASP	30.000 USD	
BOM (Chassis + Motors + Sensors + Battery)	12.000 USD	LiDAR 3K + Battery 2K + Motors 2K

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Navigation Module (MekongOS AI)	2.000 USD	SLAM + Path Planning, phát triển nội bộ
Assembly & Integration	1.500 USD	40 giờ assembly
Testing & Commissioning	500 USD	2 ngày test tại xưởng
COGS	16.000 USD	
Gross Margin	14.000 USD (46,7%)	
Installation at customer site	1.000 USD	2-3 ngày, bao gồm mapping
Sales Cycle Cost (12 tháng)	2.000 USD	Demo + Visit + Proposal
Warranty Reserve (3%)	900 USD	Robot có rủi ro cao hơn
Contribution Margin	10.100 USD (33,7%)	

C. MekongOS SaaS (Pro Plan):

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Monthly Revenue per Device	79 USD	
Annual Revenue per Device	948 USD	
Cloud Infrastructure Cost	8 USD/tháng = 96/năm	AWS/GCP hosting per device
Support & Maintenance	5 USD/tháng = 60/năm	L1 support team
Annual COGS	156 USD	
Annual Gross Margin	792 USD (83,5%)	Phần mềm margin cao
Customer Acquisition Cost (CAC)	500 USD	Digital marketing + Sales
Payback Period	7,6 tháng	CAC / Monthly Contribution
Lifetime Value (LTV, 3 năm)	2.376 USD	3 × 792
LTV/CAC Ratio	4,8×	>3× là tốt cho SaaS

3.6.2. CNC Outsourcing Unit Economics

A. Kinh tế trên 1 Giờ máy CNC 5-trục (Titan):

Thông số	Giá trị Y1	Giá trị Y5	Ghi chú
Giá bán (Machine Hour Rate)	80 USD	110 USD	Tăng nhờ AS9100
Chi phí biến đổi:			
— Dụng cụ cắt (Tool)	12 USD	10 USD	Volume discount dụng cụ
— Dung dịch cắt (MWF)	3 USD	2,5 USD	
— Điện (15 kW × 1h)	1,8 USD	1,8 USD	0,08-0,12 USD/kWh KCNC
— Vật liệu phụ trợ	2 USD	1,5 USD	

Thông số	Giá trị Y1	Giá trị Y5	Ghi chú
Chi phí nhân công trực tiếp	6 USD	7 USD	1 người/2 máy, overtime premium
Tổng Chi phí Biến đổi	24,8 USD	22,8 USD	Learning curve giảm chi phí
Contribution Margin	55,2 USD (69%)	87,2 USD (79%)	Đáng kể tăng nhờ giá + giảm VC
Phân bổ Chi phí Cố định:			
— Khấu hao máy (10 năm)	12 USD/giờ	12 USD/giờ	DMG MORI NLX 2500: 350K
— Bảo trì & Sửa chữa	3 USD/giờ	4 USD/giờ	Tăng theo tuổi máy
— Overhead (nhà xưởng, QA)	5 USD/giờ	5 USD/giờ	
Tổng Chi phí Cố định/giờ	20 USD	21 USD	
Net Margin/giờ	35,2 USD (44%)	66,2 USD (60%)	Lợi nhuận Y5 tăng gần gấp đôi

B. Hiệu suất Sử dụng Máy (OEE):

Chỉ số	Y1	Y3	Y5	Benchmark
Availability	80%	87%	92%	World-class: 90%
Performance	75%	82%	88%	World-class: 95%
Quality (First Pass Yield)	85%	92%	96%	World-class: 99%
OEE	51%	66%	78%	World-class: 85%
Giờ máy khả dụng/năm (2 ca)	3.264 h	4.224 h	4.992 h	Max 2 ca: 6.400 h
Revenue/máy/năm	261 K	464 K	549 K	Target Y5 > 500K

[C] OEE Y1 = 51% là thực tế cho nhà máy mới. Target OEE Y5 = 78% — đòi hỏi chương trình TPM (Total Productive Maintenance) nghiêm ngặt và đào tạo operator liên tục.

3.6.3. Datacenter Unit Economics

A. Kinh tế trên 1 Rack Colocation Standard (42U, 4kW):

Thông số	Giá trị/tháng	Giá trị/năm	Ghi chú
Revenue per Rack	1.500 USD	18.000 USD	Giá trung bình
Chi phí biến đổi:			
— Điện (4kW × 24h × 30d × PUE 1,32)	460 USD	5.520 USD	0,10 USD/kWh

Thông số	Giá trị/tháng	Giá trị/năm	Ghi chú
— Cooling (đã tính trong PUE)	—	—	Included in PUE
— Bandwidth allocation	50 USD	600 USD	Shared transit
Tổng Biến đổi	510 USD	6.120 USD	
Contribution Margin	990 USD (66%)	11.880 USD	
Phân bổ Chi phí Cố định:			
— Khấu hao hạ tầng (15 năm)	250 USD	3.000 USD	CAPEX/rack ~ 45K
— Nhân sự NOC (30 người / 100 rack)	180 USD	2.160 USD	6K/người/tháng
— Bảo trì UPS/HVAC	80 USD	960 USD	
— Bảo hiểm + Security	30 USD	360 USD	
Tổng Cố định/Rack	540 USD	6.480 USD	
Net Margin/Rack	450 USD (30%)	5.400 USD	
IRR per Rack (10 năm)			~12-15% [C]

B. So sánh Revenue/Rack theo Loại Dịch vụ:

Loại Rack	Revenue/Rack/năm	Net Margin	Ghi chú
Colocation Standard (4kW)	18.000 USD	30%	Baseline
Colocation High-Density (10kW)	42.000 USD	28%	Điện cao hơn → margin thấp hơn
GPU-as-a-Service (A100 × 8)	72.000-105.000 USD	32-38%	Revenue/rack cao nhất
GPU-as-a-Service (H100 × 8)	120.000-175.000 USD	35-42%	Premium, phụ thuộc utilization
Managed Hosting	24.000-36.000 USD	35%	Labor-intensive nhưng sticky

[C] Strategy insight: 1 GPU Rack (H100) tạo revenue tương đương 7-10 Rack Colocation thường. Mekong DC nên hướng tới **30% Rack là GPU/AI** (30 rack) để tối đa revenue trên diện tích nhỏ.

3.7. Chiến lược Xuất khẩu và Mở rộng Khu vực ASEAN

3.7.1. Tầm nhìn Xuất khẩu

Mekong Technology xây dựng chiến lược xuất khẩu **3 vòng (3-Ring Export Strategy)**:

Vòng	Thị trường	Timeline	Sản phẩm chính	Revenue Target
Vòng 1: Nội địa	Việt Nam (KCNC + FDI trong nước)	Y1-Y3	IoT + CNC + DC	85-90% tổng DT
Vòng 2: ASEAN-5	Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore	Y3-Y5	CNC parts + IoT Gateway	8-12% tổng DT
Vòng 3: Đông Á + Ấn Độ	Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ	Y5-Y7+	CNC Aerospace parts + Robot	5-15% tổng DT

3.7.2. Phân tích Thị trường ASEAN theo Trụ cột

A. CNC Outsourcing — Cơ hội Xuất khẩu ASEAN:

Quốc gia	Nhu cầu CNC	Ngành chính	Lợi thế Mekong	Rào cản	Ưu tiên
Thái Lan	Cao	Ô tô (2.500+ nhà sản xuất)	Giá thấp hơn TH 10-15%, FTA 0% thuế	Cạnh tranh từ TH nội địa	★★★★★
Malaysia	Trung bình-Cao	Bán dẫn, E&E	AS9100 (Penang hub), giá thấp hơn	Phải có IATF/AS9100	★★★★☆
Indonesia	Trung bình	Ô tô, Đóng tàu	Market lớn (280M dân), chi phí VN thấp	Logistics phức tạp, thuế NK	★★★☆☆
Singapore	Thấp (outsource)	Bán dẫn, Aerospace	Gần (2h bay), SG outsource sang VN nhiều	Yêu cầu chất lượng cực cao	★★★★☆
Philippines	Thấp-TB	Điện tử	Market 110M dân, CNC nội địa yếu	Logistics, FX volatility	★★☆☆☆

B. IoT/Robot — Cơ hội Xuất khẩu:

Quốc gia	Industry 4.0 Maturity	Nhu cầu IoT	Nhu cầu AMR/AGV	Kênh phân phối
Thái Lan	Trung bình	Cao (EEC push)	Trung bình	Đại lý + System Integrator
Indonesia	Thấp-TB	Cao (Making Indonesia 4.0)	Thấp-TB	Online + Đại lý
Malaysia	Trung bình-Cao	Trung bình	Trung bình	Đại lý kỹ thuật

3.7.3. Lộ trình Xuất khẩu CNC (Chi tiết)

Thời gian	Hoạt động	Mục tiêu	Budget (K USD)
Y2 Q1	Tham gia METALEX Bangkok	Giới thiệu năng lực CNC 5 trục	20
Y2 Q2	Ký MOU với 2-3 trading house Nhật (qua JETRO)	Pipeline CNC parts Nhật	5

Thời gian	Hoạt động	Mục tiêu	Budget (K USD)
Y2 Q3-Q4	First Article trial cho 2-3 KH Thái/SG	Xây dựng track record	10
Y3 Q1	Đạt ISO 9001 → mở rộng portfolio	Đủ điều kiện bid FDI	—
Y3 Q2	Tham gia SEMICON SEA (Malaysia)	Tiếp cận semiconductor supply chain	25
Y3 Q3	Setup Export Desk (2 người chuyên trách)	Quản lý xuất khẩu, customs	60/năm
Y4 Q1	Đạt IATF 16949 → gia nhập Auto supply chain ASEAN	Tier-2 supplier cho Auto FDI	—
Y4-Y5	Mở văn phòng đại diện tại Bangkok hoặc Penang	Hub cho ASEAN orders	80/năm
Y5+	Đạt AS9100 → Xuất khẩu Aerospace parts cho SG/MY	High-value CNC market	—

Revenue Xuất khẩu Dự kiến:

Năm	Xuất khẩu CNC (K USD)	Xuất khẩu IoT (K USD)	Tổng XK (K USD)	% Tổng Revenue
1	0	0	0	0%
2	150	50	200	2,1%
3	400	150	550	3,6%
4	900	350	1.250	6,8%
5	1.800	600	2.400	10,7%
7	3.500	1.200	4.700	17,7%
10	5.500	2.500	8.000	25,8%

[A] Target: Xuất khẩu chiếm 25% doanh thu vào Y10. Giả định dựa trên benchmark các công ty CNC VN (MTEx 20%, MPC 15%). AS9100 là chìa khóa: 80% revenue xuất khẩu CNC đến từ khách hàng Aerospace/Defense.

3.8. Go-to-Market (GTM) Timeline Chi tiết

3.8.1. GTM theo Giai đoạn

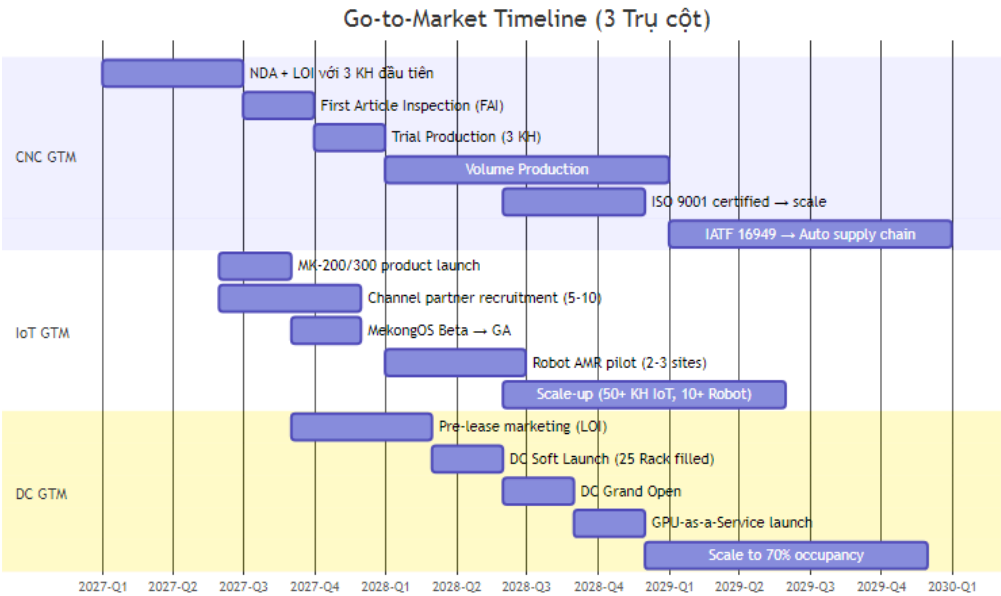


Diagram 22

3.8.2. Mục tiêu GTM theo Quý (Y1 Vận hành)

Quý	CNC	IoT	DC	Revenue Target (K USD)
Y1 Q1	3 KH hoạt động, 15% utilization	20 IoT Gateway bán, MekongOS 10 users	Pre-lease 5 LOI	300-500
Y1 Q2	5 KH, 25% util., 1 repeat order	50 Gateway, 2 Robot demo	15 Rack filled	600-900
Y1 Q3	8 KH, 35% util., 2 annual contracts	100 Gateway, 5 Robot orders, MekongOS 50 users	25 Rack, 1 GPU customer	900-1.200
Y1 Q4	10 KH, 45% util., ISO 9001 audit	150 Gateway, 8 Robot, MekongOS 100 users	35 Rack, SOC launched	1.200-1.500
Y1 Total				3.000-4.100

3.9. Pipeline Khách hàng và Xác suất

3.9.1. CNC Pipeline (Pre-operation)

#	Khách hàng	Ngành	Sản phẩm cần gia công	Volume dự kiến	Xác suất	Revenue/năm (K USD)
1	Bosch VN	Ô tô	Vỏ sensor, connector	5.000 chi tiết/tháng	60%	250-400
2	Nidec VN	Motor/Ô tô	Shaft, Housing	3.000 chi tiết/tháng	50%	200-350
3	Samsung SEHC	Điện tử	Mold insert, Jig	On-demand	40%	150-300
4	VinFast	Ô tô	Prototype parts	R&D phase	30%	100-200
5	Intel Products VN	Bán dẫn	Test fixture, socket	On-demand	35%	80-150
6	Canon VN	Quang học	Lens housing, mount	2.000 chi tiết/tháng	45%	180-280
7	FDI Nhật (qua JETRO)	Đa ngành	Mixed parts	Pipeline	25%	100-200
8	FDI Hàn (qua KOTRA)	Điện tử	Bracket, chassis	Pipeline	25%	80-150
	Weighted Total					~850 K

[A] Xác suất dựa trên: (a) Mối quan hệ hiện có, (b) Proximity KCNC, (c) Nhu cầu thực tế đã xác nhận qua khảo sát sơ bộ. Weighted pipeline CNC = ~850K/năm — đủ để đạt target Y1 CNC = 1,89 M khi tính thêm KH ngoài pipeline.

3.9.2. DC Pipeline (Pre-lease)

#	Khách hàng	Nhu cầu	Rack dự kiến	Xác suất	Revenue/năm (K USD)
1	VNG Corporation	AI Training	5-10 (GPU)	40%	360-720
2	FPT AI	HPC / Model Training	3-5 (GPU)	35%	216-360
3	Techcombank	DR Site	10 (Standard)	50%	180

#	Khách hàng	Nhu cầu	Rack dự kiến	Xác suất	Revenue/năm (K USD)
4	VPBank	DR + Backup	8 (Standard)	40%	144
5	Startup AI (3-5 công ty)	GPU-as-a-Service	5-10 (GPU)	30%	360-720
6	DN trong KCNC (10-20)	Colocation	10-20 (Standard)	60%	180-360
	Weighted Total				~750 K

3.9.3. Customer Acquisition Cost (CAC) theo Trụ cột

Trụ cột	CAC trung bình	Sales Cycle	LTV (3 năm)	LTV/CAC
CNC	5.000-15.000 USD	3-12 tháng	120.000-500.000 USD	15-35×
IoT Gateway	200-500 USD	1-3 tháng	1.500-3.000 USD	5-10×
IoT Robot	3.000-8.000 USD	6-18 tháng	60.000-150.000 USD	10-20×
MekongOS SaaS	500 USD	1-3 tháng	2.376 USD (Pro 3Y)	4,8×
DC Colocation	2.000-5.000 USD	6-18 tháng	54.000-108.000 USD	15-25×
DC GPU-aaS	5.000-10.000 USD	3-6 tháng	216.000-500.000 USD	25-50×

[C] CAC thấp nhất: MekongOS SaaS (digital marketing). CAC cao nhất: CNC B2B (sales team + FAI + trial). Tuy nhiên LTV/CAC CNC cao nhất (15-35×) vì hợp đồng dài hạn, volume lớn.

3.10. Phân tích Doanh thu Theo mùa và Dòng tiền

3.10.1. Tính Mùa vụ theo Trụ cột

Quý	CNC	IoT/Robot	Datacenter	Ghi chú
Q1 (Jan-Mar)	Thấp (sau Tết)	Thấp-TB	Ổn định	CNC: FDI giảm volume Tết, ramp-up lại T2-T3
Q2 (Apr-Jun)	Trung bình	Trung bình	Ổn định	Nhu cầu dần phục hồi
Q3 (Jul-Sep)	Cao	Cao	Cao	Auto production H2 peak, IoT budget cycle
Q4 (Oct-Dec)	Cao nhất	Cao nhất	Cao	Holiday production rush, year-end spending

Hệ số Mùa vụ (Seasonality Factor):

Quý	CNC Factor	IoT Factor	DC Factor	Weighted Average
Q1	0,80	0,85	0,95	0,85
Q2	0,95	0,95	1,00	0,97
Q3	1,10	1,10	1,05	1,09
Q4	1,15	1,10	1,00	1,09

3.10.2. Dòng tiền Hoạt động Dự kiến (Y3 — Steady State)

Tháng	Revenue (K USD)	COGS (K USD)	OPEX (K USD)	Net CF (K USD)	Ghi chú
1	800	440	350	+10	Post-Tết slow start
2	1.000	550	360	+90	Ramp-up
3	1.200	660	365	+175	Normal
4	1.250	688	365	+197	
5	1.300	715	370	+215	
6	1.250	688	370	+192	
7	1.400	770	375	+255	H2 peak starts
8	1.450	798	375	+277	
9	1.350	743	375	+232	
10	1.500	825	380	+295	Q4 holiday rush
11	1.500	825	380	+295	
12	1.400	770	380	+250	Year-end
Tổng Y3	15.400	8.470	4.445	+2.485	Net margin ~16%

[C] Working Capital Note: CNC payment terms Net 30-60 ngày → Cash conversion cycle 45-75 ngày. DC prepaid monthly → CCC = 0. IoT product bán lẻ COD → CCC = 0. Blended CCC ~ 25-35 ngày → cần working capital buffer ~1,2 M USD.

3.11. Mô hình Đặt giá Chi tiết theo Ngành (Pricing Waterfall)

3.11.1. CNC Pricing Waterfall

Lớp giá	Khoản mục	Hệ số / Giá trị	Ghi chú
List MHR	Base Machine Hour Rate	55-95 USD/h	Tùy loại máy (3-axis vs 5-axis)
Material Markup	Phụ thu vật liệu	Cost + 15-25%	Margin thấp, pass-through

Lớp giá	Khoản mục	Hệ số / Giá trị	Ghi chú
Setup Fee	Phí setup / chuẩn bị	50-200 USD/lần	First-article cao hơn
Programming	CAD/CAM programming	85-120 USD/h	Chỉ lần đầu / thay đổi
Quality Premium	AS9100 / IATF surcharge	+15-25% MHR	Chúng nhận costly
Express Premium	Urgent delivery (< 7 ngày)	+30-50% total	High-margin opportunity
Volume Discount	> 500 parts/lot	-5 to -15%	Cần đảm bảo margin > 30%
Contract Discount	Annual contract > 500K	-3 to -8%	Đổi lấy revenue visibility
FX Adjustment	USD/VND ±3% band	Annual review	Clause trong MSA

Ví dụ tính giá 1 batch — 100 pcs aluminum housing (3-axis):

Khoản mục	Tính toán	Giá trị (USD)
Cycle time	45 phút/pc × 100 pcs = 75h machine	
MHR	75h × 65 USD	4.875
Material	100 × 8 kg × 3,5 USD/kg × 1,20 markup	3.360
Setup	3 fixtures × 150 USD	450
Programming	4 hours × 100 USD (first order only)	400
Inspection (CMM)	5% sample = 5 pcs × 20	100
Packaging + shipping	100 × 2 USD	200
Total order		9.385
Unit price	9.385 / 100	93,85 / pc
Margin	≈40% gross	

3.11.2. DC Pricing — Rack-level Economics

Tier	Rack Config	Power/Rack	MRC (K USD)	Setup (K)	Annual Rev/Rack (K)
Silver	½ rack (21U)	2 kW	0,8-1,2	0,5	9,6-14,4
Gold	Full rack (42U)	4-8 kW	2,0-4,0	1,0	24,0-48,0
Platinum	Full rack (42U)	8-30 kW	4,0-12,0	2,0	48,0-144,0
Cabinet	Locked cage (4-20 racks)	16-160 kW	8,0-60,0	5,0-20,0	96,0-720,0

Revenue per rack Y5 (steady-state) — Blended: - Average 80 racks occupied × 36K/rack/năm (blended) = **2.880K**
colo revenue - Managed services + interconnect uplift ≈ 25% = **720K** - **Tổng DC Revenue Y5 ≈ 3.600K** [C — đối chiếu PHỤ LỤC S: Revenue Y5 = 3.606K]

3.11.3. IoT/Robot Pricing Architecture

Sản phẩm	HW Price (USD)	SaaS Subscription (USD/th)	Installation (USD)	Total Y1 Revenue/Unit (USD)
MK-200 Basic	350	15	50	580
MK-200 Pro	450	25	100	850
MK-300 5G	700	35	200	1.320
MK-500 Edge AI	2.000-5.000	100	500	3.700-6.700
AMR-100	30.000	200 (maintenance)	2.000	34.400
Fleet SW (10-pack)	—	500	1.000	7.000
MekongOS Standalone	—	50-200	—	600-2.400

Recurring Revenue % tăng dần: | Năm | HW Revenue (%) | SaaS + Service (%) | Recurring ratio | |—|:|—|:|—|:|—| | Y1 | 80% | 20% | Low | | Y3 | 60% | 40% | Growing | | Y5 | 45% | 55% | Good | | Y10 | 30% | 70% | SaaS-dominant |

Chiến lược giá IoT: “Land and Expand” — bán HW với margin thin (20-30%) để tạo installed base, sau đó upsell SaaS subscription với margin 70-80%. CAC payback < 12 tháng cho SaaS customer.

3.12. Chiến lược Cạnh tranh (Competitive Strategy)

3.12.1. Competitive Positioning Map — CNC

Tiêu chí	Mekong	VPIC	Cosmos	Hợp Long	TQ Competition
5-axis capability	9/10	3/10	5/10	2/10	6/10
Certification (IATF/AS)	7/10 (by Y3)	6/10	4/10	3/10	7/10
Price competitiveness	7/10	8/10	7/10	9/10	9/10
Quality consistency	8/10	5/10	6/10	4/10	5/10
Lead time	7/10	6/10	5/10	7/10	4/10 (logistics)
NDA/ITAR compliance	8/10	3/10	3/10	2/10	2/10
Total	46/60	31/60	30/60	27/60	33/60

3.12.2. Competitive Positioning Map — Data Center

Tiêu chí	Mekong	Viettel IDC	FPT DC	CMC DC	NTT VN
Tier level	III (design)	III+	III	III	III+
PUE	1,32 → 1,26	1,45	1,50	1,55	1,35
Carrier-neutral	Yes	No (Viettel)	No (FPT)	No (CMC)	Yes
Price/rack/month	\$2.500 avg	\$2.000	\$1.800	\$1.600	\$3.500
Scalability	100→200 rack	1.000+	500+	300+	500+
Ecosystem value	High (CNC+IoT)	Telco only	IT services	IT services	Global
Proximity to KCNC	On-site	15-20 km	10-15 km	20 km	10 km

3.12.3. Win/Loss Strategy

Scenario	Chiến thuật	Expected Win Rate
CNC vs TQ on price	Avoid — focus precision + compliance	60% (for 5-axis + cert)
CNC vs VN competitor	Quality + capability differentiation	70%
DC vs Big 3 (Viettel/FPT/CMC)	Niche: carrier-neutral + PUE + KCNC ecosystem	40%
DC vs NTT/ST Telemedia	Price advantage (-20%) + local support	35%
IoT vs Chinese hardware	Platform play (MekongOS) + local support	50%
IoT vs VN startups	Full-stack capability (HW+FW+Cloud)	65%

3.13. Dự báo Doanh thu 20 Năm — Chi tiết theo Trụ cột

3.13.1. Revenue Projection Table (K USD)

Năm	CNC Base	CNC IATF/AS	DC Colo	DC Managed	IoT HW	IoT SaaS	Tổng
Y1	2.000	—	500	100	800	100	3.500
Y2	3.500	500	1.200	300	1.500	300	7.300
Y3	5.000	1.500	2.000	500	2.000	600	11.600
Y4	5.500	2.500	2.800	700	2.200	1.000	14.700
Y5	5.500	3.000	3.000	800	2.500	1.300	16.100
Y7	6.000	4.500	4.500	1.500	3.000	3.000	22.500
Y10	7.000	6.000	6.000	2.500	4.000	5.000	30.500

Năm	CNC Base	CNC IATF/AS	DC Colo	DC Managed	IoT HW	IoT SaaS	Tổng
Y15	8.000	8.000	8.000	4.000	5.000	10.000	43.000
Y20	9.000	10.000	10.000	5.000	6.000	15.000	55.000

3.13.2. Revenue Mix Evolution

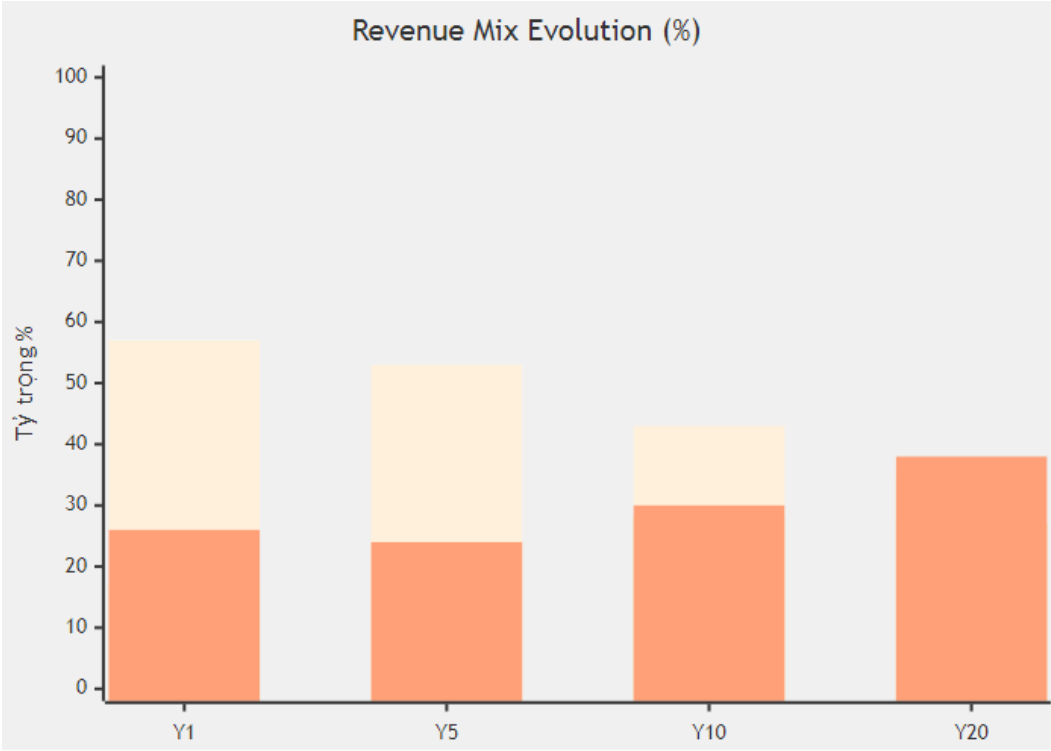


Diagram 23

Chú giải: Cột 1 = CNC | Cột 2 = DC | Cột 3 = IoT

Xu hướng chiến lược: CNC vẫn là backbone revenue nhưng giảm dần tỷ trọng (57% → 35%). IoT/SaaS tăng mạnh nhất (26% → 38%) nhờ recurring revenue compound. DC ổn định ở 24-28% — predictable cash flow. Đây là mô hình healthy diversification [A].

PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ VẬT CHẤT

4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng

4.1.1. Thông tin Khu đất

Thông số	Giá trị
Địa điểm	Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Quận 9 (nay TP. Thủ Đức)
Lô đất	Theo phân bổ BQL KCNC
Diện tích lô	1 ha (10.000 m ²)
Mật độ xây dựng cho phép	≤ 75% (7.500 m ²)
Mật độ xây dựng thực tế	70% (7.000 m ²) — footprint tòa nhà
Chiều cao tối đa	14 m (3 tầng: 6m + 4m + 4m)
Tổng GFA (Gross Floor Area)	21.000 m ² (7.000 m ² × 3 tầng)
Thuê đất KCNC	~1,0 USD/m ² /tháng [B], miễn 11 năm đầu
Chi phí thuê đất/năm	120.000 USD (10.000 × 1,0 × 12) [C]

4.1.2. Phân khu Chức năng — Tòa nhà 3 Tầng

Nguyên tắc thiết kế: - **Tầng 1 (chiều cao thông thủy 6m):** Bố trí các hạng mục nặng, cần chiều cao lớn (CNC 5 trục cần cầu trục, Datacenter cần chiều cao rack 42U+, kho hàng + loading dock cho xe tải) - **Tầng 2 (chiều cao 4m):** Bố trí IoT/SMT line (máy Pick & Place nhẹ), Clean Room, lắp ráp robot, phòng QC — không cần chiều cao lớn, nhạy cảm rung động → thiết kế tách rung với tầng 1 - **Tầng 3 (chiều cao 4m):** Văn phòng điều hành, R&D Lab, đào tạo, căn tin — khu vực nhẹ, không tải trọng sàn đặc biệt

Tầng	Khu vực	Diện tích (m ²)	Chức năng
1	CNC Workshop (MPMC)	3.000	Xưởng CNC 5 trục + Phòng đo CMM + Kho phôi
1	Datacenter (MACC)	1.500	Data Hall + NOC + UPS/Battery + HVAC/Chiller
1	M&E Room	500	Trạm biến áp, máy phát, ATS, MDB
1	Kho + Loading Dock	1.500	Kho NVL + thành phẩm, loading bay 2 xe tải
1	Sảnh + Hành lang	500	Lối vào chính, thang máy hàng, cầu thang thoát hiểm
2	IoT/SMT Line	2.500	2 dây chuyền SMT + Wave Solder + AOI
2	Clean Room (Class 10K)	1.000	Lắp ráp IoT Gateway, calibration
2	Assembly + Testing	1.500	Lắp ráp Robot AMR/AGV, End-of-Line test

Tầng	Khu vực	Diện tích (m ²)	Chức năng
2	QC Lab	1.000	AOI, X-Ray, Burn-in, phòng đo
2	Hành lang + WC + Phụ trợ	1.000	Elevator lobby, toilet, FHC
3	Văn phòng điều hành	2.500	Phòng GD, phòng họp, HR, kế toán, showroom
3	R&D Lab	1.500	Phòng thiết kế PCB, software dev, AI training room
3	Đào tạo + Căn tin	1.300	Training room 50 chỗ, canteen 80 chỗ
3	Hội nghị + Phụ trợ	1.700	Phòng hội nghị lớn, archive, server room IT nội bộ
	Tổng GFA	21.000	

Khu vực ngoài nhà (3.000 m²):

Khu vực	Diện tích (m ²)	Ghi chú
Bãi xe (ô tô + xe máy)	800	~20 ô tô + 50 xe máy
Sân container + đường nội bộ	800	Container yard, fire lane 6m
Cây xanh, cảnh quan	600	Cây xanh tối thiểu 20% theo KCNC
Trạm biến áp ngoài trời	200	22kV in-feed, 2 tuyến độc lập
Trạm xử lý nước thải ngoài	300	Hệ thống ZLD compact
Khu PCCC ngoài nhà	300	Bồn nước PCCC + Bơm
Tổng sân bãi	3.000	30% diện tích lô

4.1.3. Layout Tổng thể — Mặt bằng 1 ha




Diagram 24

Lưu ý thiết kế đặc biệt cho tòa nhà 3 tầng đa chức năng:

- Cách ly rung động Tầng 1 ↔ Tầng 2:** CNC 5 trục tạo rung lớn, cần anti-vibration pad (Freyssinet Tetron CD hoặc tương đương) + sàn composite dày 300mm với lớp đệm cao su giữa Tầng 1 và Tầng 2 để bảo vệ dây chuyền SMT/Clean Room ở Tầng 2.
- Tải trọng sàn:** Tầng 1: 2.000 kg/m² (CNC, DC rack), Tầng 2: 1.000 kg/m² (SMT, robot), Tầng 3: 500 kg/m² (văn phòng).

- 3. **Thang máy hàng:** 2 thang (5 tấn + 3 tấn) phục vụ vận chuyển phối/thành phẩm giữa các tầng. 1 thang khách 15 người.
- 4. **Chiều cao tầng 1 = 6m:** Đủ cho cấu trúc CNC (clearance 4,5m) + overhead ductwork + rack DC 42U (2,1m + 0,8m overhead).
- 5. **PCCC:** Mỗi tầng hệ thống riêng biệt. DC tầng 1: FM-200 gas suppression. CNC tầng 1: sprinkler + foam. IoT/SMT tầng 2: sprinkler. Văn phòng tầng 3: sprinkler tiêu chuẩn.

4.2. Thiết kế Hạ tầng Khu vực Datacenter — Tầng 2 (MACC)

V2.1: Trong mô hình 1 tòa nhà 3 tầng, Datacenter chiếm Tầng 2 (~3.000 m² sàn). Đề án gốc ký hiệu “Khối A” — các thông số kỹ thuật giữ nguyên.

4.2.1. Kiến trúc Vật lý

Tầng 1 (Ground Floor) — Data Hall + MEP:

Phòng	Diện tích	Chức năng
Data Hall Zone 1 (Colo)	600 m ²	50 Racks, In-Row Cooling
Data Hall Zone 2 (AI/HPC)	600 m ²	50 Racks, Liquid Cooling + RDHX
Loading Dock	100 m ²	Nhận thiết bị
Battery Room (UPS)	150 m ²	4 × 1.000 kVA LiFePO4
Switchgear	80 m ²	ATS + MDB + PDU
Chiller Plant Room	200 m ²	2N Chiller + CDU
NOC (Network Operations Center)	80 m ²	Giám sát 24/7
Meet-Me Room (MMR)	40 m ²	Cross-connect, carrier entrance
Security / Mantrap	50 m ²	Biometric 3-factor, CCTV
Generator Yard (ngoài trời)	200 m ²	2 × 2.500 kVA Diesel + Bồn dầu
Cooling Tower (ngoài trời)	150 m ²	Evaporative cooling + Free cooling

4.2.2. Hệ thống Điện — Sơ đồ Một dây

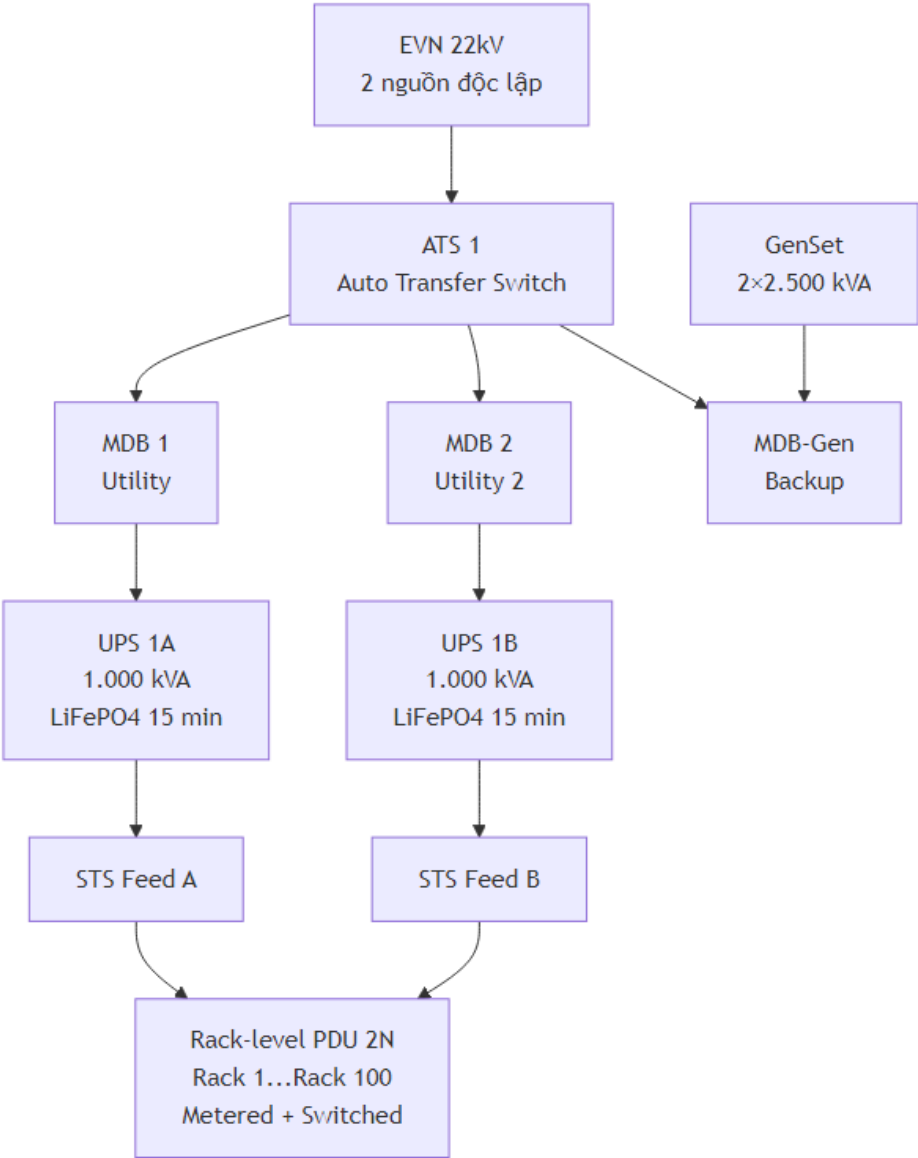


Diagram 25

Thông số Điện:

Thông số	Giá trị
Tổng công suất EVN yêu cầu	5.000 kVA (IT 2.500 kW + Cooling + UPS + Facility)
Dự phòng Generator	5.000 kVA (2 × 2.500 kVA, N+1)
UPS runtime	15 phút (đủ thời gian GenSet khởi động 10 giây + warm-up)
UPS technology	Online double-conversion, LiFePO4 battery
Redundancy	2N Power Distribution
PUE đóng góp từ điện	5% (UPS loss)

4.2.3. Hệ thống Làm mát Chi tiết

Zone 1 — Colocation (Chilled Water In-Row):

Thông số	Giá trị
Tải nhiệt	50 Rack × 8 kW = 400 kW (trung bình)
Cooling capacity	600 kW (N+1, 50% dự phòng)
Chiller	2 × 350 kW water-cooled screw chiller
CRAH	6 × 100 kW In-Row units (N+1)
Set point	Cold aisle: 22-24°C, Hot aisle: 35-40°C
Containment	Hot Aisle Containment (HAC)
Monitoring	Temperature/humidity sensor mỗi 3 rack

Zone 2 — AI/HPC (Hybrid: Direct-to-Chip + Rear-Door Heat Exchanger):

Thông số	Giá trị
Tải nhiệt	50 Rack × 25 kW = 1.250 kW (trung bình)
Cooling capacity	1.875 kW (N+1, 50% dự phòng)
CDU (Coolant Distribution Unit)	4 × 500 kW (Vertiv/Schneider)
Liquid cooling phần trăm nhiệt	70% (trực tiếp đến chip GPU)
Rear-Door HEX (RDHX)	30% còn lại (server fans → RDHX → chilled water)
Chilled water supply	15-18°C (cao hơn Zone 1, tiết kiệm năng lượng)
Coolant	Propylene glycol 30% (an toàn, không dẫn điện)
Flow rate	20-30 L/phút/rack

Tính toán Electroless Water Consumption:

Nguồn tiêu thụ	Lưu lượng	Phương pháp
Cooling tower make-up (evaporation)	40-60 m³/ngày	Evaporation + Blowdown + Drift
Liquid cooling loop (sealed)	0 m³/ngày	Tuần hoàn kín
Humidification	5-10 m³/ngày	Adiabatic humidifier
Domestic (nhân viên)	3-5 m³/ngày	30-50 người × 100 L/ngày
Tổng	48-75 m³/ngày	

4.2.4. Hệ thống An ninh Vật lý

Lớp	Biện pháp	Mô tả
1	Hàng rào vành đai	Hàng rào thép + dây kẽm gai + CCTV 24/7
2	Cổng chính	Barrier tự động + Bảo vệ 24/7 + Xe quét RFID
3	Cửa tòa nhà	Access card (HID iCLASS) + PIN code

Lớp	Biện pháp	Mô tả
4	Mantrap	Cửa đôi interlocking + CCTV + Weight sensor
5	Data Hall entrance	3-factor: Card + PIN + Biometric (vân tay/mống mắt)
6	Rack-level	Combination lock, Optional biometric per rack
7	Giám sát	120+ camera CCTV, NVR lưu 90 ngày, AI motion detection

4.2.5. Hệ thống Mạng

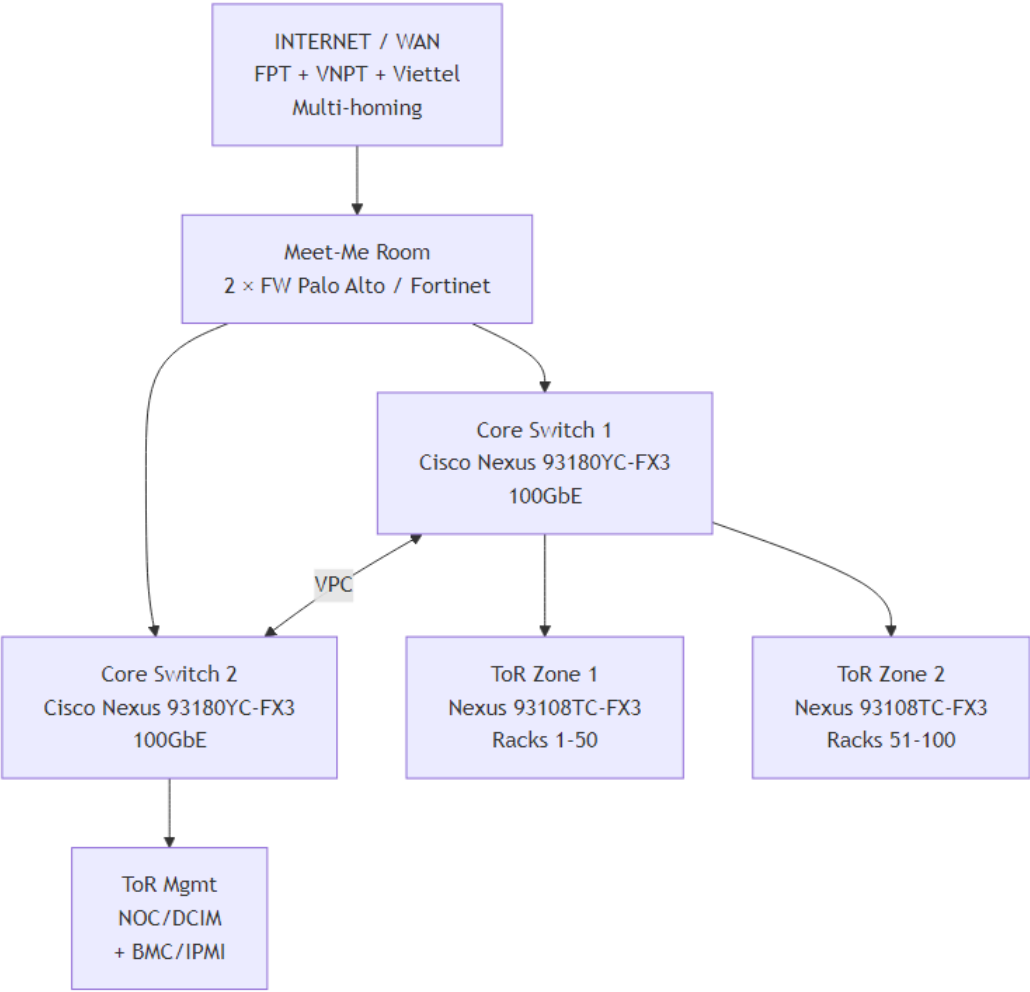


Diagram 26

AI/HPC Network (Zone 2 riêng): - GPU Fabric: NVIDIA InfiniBand HDR 200Gbps (fat-tree topology) - Storage: NVMe-oF over 100GbE (NetApp / Pure Storage) - Latency: < 1 µs (GPU-to-GPU), < 5 µs (GPU-to-Storage)

4.3. Thiết kế Hạ tầng Khu vực CNC — Tầng 1 (MPMC)

V2.1: CNC chiếm khu vực Tầng 1 (~4.000 m² sàn). Đề án gốc ký hiệu “Khối B” — các thông số kỹ thuật giữ nguyên.

4.3.1. Layout Xưởng CNC

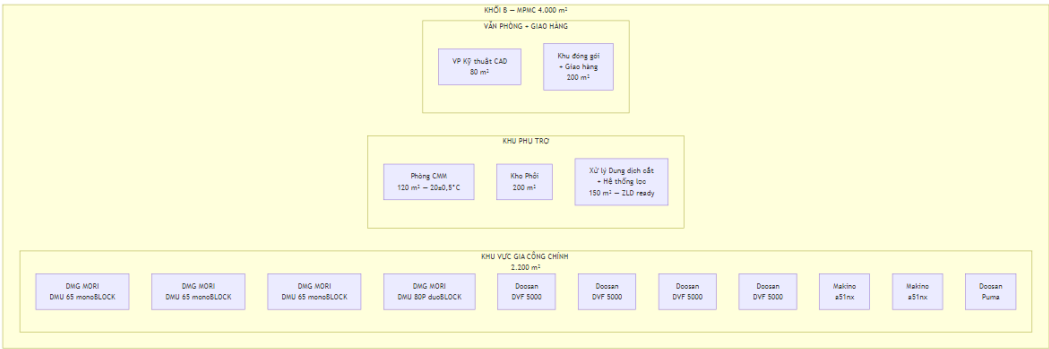


Diagram 27

4.3.2. Yêu cầu Nền Móng và Sàn

Yêu cầu	Thông số	Lý do
Tải trọng sàn	≥ 5.000 kg/m ²	DMG MORI DMU 80P nặng 12.000 kg
Nền chống rung	< 0,05 mm/s (class C3 theo DIN 4150)	CNC 5 trục yêu cầu rung rất thấp
Phòng CMM riêng	< 0,01 mm/s + foundation riêng	CMM yêu cầu rung thấp nhất
Sàn Epoxy	Chịu dầu, chịu mài mòn, grounding ESD	Chống trượt + Chống tĩnh điện
Rãnh thoát dung dịch	Rãnh kín + hệ thống thu hồi	Thu dung dịch cắt gọt, tránh ô nhiễm
Trần	Free height ≥ 8 m	Cầu trục 5T cho bốc dỡ máy CNC
Cầu trục	2 × 5 tấn overhead crane	Di chuyển máy, fixture, phôi nặng

4.3.3. Hệ thống Điện Khối B

Phụ tải	Công suất	Ghi chú
28 máy CNC (rated)	800 kW	~25-35 kW/máy trung bình
Hệ thống cooling CNC	100 kW	Chiller dung dịch cắt
Hệ thống hút bụi/khói	50 kW	Dành cho titanium, Inconel
Hệ thống khí nén	75 kW	2 × Screw compressor
Đèn chiếu sáng	40 kW	≥ 500 lux tại bàn máy
HVAC	60 kW	Phòng CMM + Văn phòng
Phụ tải khác	25 kW	Phòng CAD, kho, phụ trợ
Tổng Khối B	1.150 kW	

4.3.4. Hệ thống Phụ trợ CNC

Hệ thống Khí nén (Compressed Air): - 2 × Screw compressor 37 kW, 8 bar - Air dryer (dew point -40°C) - Air receiver 2.000 L - Ống phân phối stainless steel - Công suất: 5,0 Nm³/phút, đủ cho 28 máy CNC

Hệ thống Dung dịch Cắt gọt (Coolant): - Central coolant system (thay vì từng máy riêng) - Dung tích: 10.000 L tổng - Lọc: Multi-stage filtration (20µm → 5µm → 1µm) - Kiểm soát nồng độ: Refractometer tự động - Thu hồi: Thu chip + Dầu — tái chế qua ZLD

Hệ thống Hút Bụi/Khói: - Centralized dust/fume extraction - HEPA filter (H13) cho titanium machining - Active carbon filter cho Inconel (hơi Nickel) - Lưu lượng: 5.000 m³/giờ - Emission monitoring: PM2,5 sensor real-time

4.4. Thiết kế Hạ tầng Khu vực IoT/Robot — Tầng 1 (SMT)

V2.1: IoT/Robot chiếm khu vực Tầng 1 (~3.000 m² sàn), chia sẻ Tầng 1 với CNC. Đề án gốc ký hiệu “Khối C” — các thông số kỹ thuật giữ nguyên.

4.4.1. Layout Dây chuyền SMT

Khu vực	Diện tích	Chức năng
Dây chuyền SMT Line 1	300 m ²	IoT Gateway MK-200 (volume)
Dây chuyền SMT Line 2	300 m ²	IoT Gateway MK-300 + Robot PCB
Lắp ráp Robot (Assembly)	500 m ²	Final assembly AMR/AGV/OHT
Burn-in / Test	200 m ²	72h burn-in + Functional test
Lab R&D Phần cứng	150 m ²	Prototyping + EMC pre-compliance
Lab AI & Robotics	200 m ²	AI development, ROS2, simulation
Kho linh kiện	200 m ²	SMD reel storage, humidity-controlled
Khu vực đóng gói	150 m ²	Packing + Labeling + Shipping
VP Kỹ thuật	100 m ²	R&D firmware, PCB layout
Tổng	2.100 m²	(còn lại: hành lang + phụ trợ)

4.4.2. Thiết bị SMT

TT	Thiết bị	Hãng	Số lượng	Giá (K USD)
1	Solder Paste Printer	DEK (ASM)	2	80-120
2	SPI (Solder Paste Inspection)	Koh Young	2	100-150
3	Pick & Place (high-speed)	Yamaha YSM20R	2	200-300
4	Pick & Place (fine-pitch)	Yamaha YSM20R	1	120-180
5	Reflow Oven	Heller 1913 MK7	2	80-120
6	AOI (Automated Optical Inspection)	Omron VT-X750	2	100-150
7	X-ray Inspection	Nikon XT V 160	1	200-280

TT	Thiết bị	Hãng	Số lượng	Giá (K USD)
8	Wave Soldering	SEHO SelectLine	1	50-80
9	ICT (In-Circuit Test)	Keysight i3070	1	80-120
10	Flying Probe Test	Takaya APT-1400F	1	60-90
	Tổng SMT			1.070-1.590

4.4.3. Điều kiện Sản xuất Điện tử

Thông số	Giá trị	Lý do
Nhiệt độ	23 ± 2°C	Kiểm soát solder paste rheology
Độ ẩm	40-60% RH	Chống tĩnh điện, tránh oxidation
ESD	EPA (ESD Protected Area) toàn bộ	IEC 61340-5-1 compliance
Sạch	Class 100.000 (ISO 8)	Tránh bụi vào solder joint
Ánh sáng	≥ 750 lux tại inspection	Visual inspection requirement

4.5. Hệ thống M&E Chung — Bill of Quantities (BOQ)

4.5.1. Tổng hợp BOQ theo Hạng mục

TT	Hạng mục	Khối A (K USD)	Khối B (K USD)	Khối C (K USD)	Chung (K USD)	Tổng (K USD)
1	Hệ thống điện (HT, HA, chiếu sáng)	1.200	350	250	200	2.000
2	UPS + Battery	1.600	50	30	20	1.700
3	Generator	800	100	50	50	1.000
4	Cooling / HVAC	1.500	150	120	80	1.850
5	PCCC	350	250	200	300	1.100
6	Hệ thống nước (cấp + thải)	150	200	80	350	780
7	Hệ thống mạng + Cấp quang	500	50	80	70	700
8	An ninh (CCTV, Access Control)	200	50	50	100	400

TT	Hạng mục	Khối A (K USD)	Khối B (K USD)	Khối C (K USD)	Chung (K USD)	Tổng (K USD)
9	BMS / DCIM	250	30	20	—	300
10	Khí nén + Phụ trợ CNC	—	200	—	—	200
11	Cầu trục	—	120	30	—	150
12	Nền móng đặc biệt	50	80	15	30	175
	Tổng	6.600	1.630	925	1.200	10.355

[C — Chi tiết BOQ tính toán từ benchmark giá thị trường VN 2024-2025, bao gồm 10% dự phòng]

4.5.2. Phân kỳ M&E

Hạng mục	Phase 1 (K USD)	Phase 2 (K USD)	Ghi chú
Khối A — DC cơ bản (50 Rack)	4.200	—	Zone 1 full + Zone 2 shell
Khối A — DC mở rộng (50 Rack)	—	2.400	Zone 2 AI/HPC fit-out
Khối B — CNC (15 máy)	1.100	—	Cooling + Compressed air + Crane
Khối B — CNC mở rộng (13 máy)	—	530	Add'l capacity
Khối C — SMT Full	925	—	2 SMT lines + Assembly
Hạ tầng chung	600	600	PCCC + Nước + An ninh + BMS
Tổng M&E	6.825	3.530	10.355

Lưu ý chênh lệch: Ngân sách M&E tổng 10.355 K nhưng budget dự kiến trong mô hình tài chính là ~13.200 K (bao gồm cả xây dựng dân dụng). Chênh lệch ~2.845 K phân bổ cho xây dựng kết cấu, hoàn thiện, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, và cảnh quan [C].

4.6. Hệ thống Cấp nước và Xử lý Nước thải

4.6.1. Nhu cầu Nước

Nguồn tiêu thụ	Lưu lượng (m³/ngày)	Ghi chú
Khối A — DC Cooling tower	40-60	Make-up water (evaporation + blowdown)
Khối A — Humidification	5-10	Adiabatic humidification

Nguồn tiêu thụ	Lưu lượng (m³/ngày)	Ghi chú
Khối B — CNC Coolant	8-15	Dung dịch cắt + Làm mát máy
Khối C — SMT	2-3	DI water (rửa PCB) + Cleaning
Sinh hoạt	15-25	150-250 người × 100 L/ngày
Cây xanh	10-20	Tưới cảnh quan
Tổng (Peak)	80-133	
Tổng (bình thường)	60-90	

4.6.2. Giải pháp Cấp nước — 4 Phương án Kết hợp

Phân tích rủi ro: Hạn ngạch nước KCNC cho lô đất này ước tính 150 m³/ngày. Peak demand có thể vượt nếu DC chạy 100% AI/HPC. Giải pháp:

Phương án	Mô tả	Tiết kiệm	CAPEX (K USD)
S1: Tái sử dụng nước DC	Thu hồi condensate từ cooling → tái tuần hoàn	15-25 m³/ngày	60
S2: ZLD cho CNC	Zero-Liquid Discharge: coolant thải → lọc → tái sử dụng	8-15 m³/ngày	120
S3: Nước mưa	Thu nước mưa (32.500 m² mái + bể 500 m³) → tưới cây + toilet	10-20 m³/ngày	50
S4: Cooling tower tối ưu	Tăng cycles of concentration (CoC) từ 3 → 5 → giảm blowdown	10-15 m³/ngày	60
Tổng S1-S4		43-75 m³/ngày	290

Sau áp dụng 4 phương án: Peak demand giảm từ 133 → 58-90 m³/ngày — nằm trong hạn ngạch 150 m³/ngày [C].

4.6.3. Hệ thống Xử lý Nước thải

Sơ đồ Hệ thống:




Diagram 28

Thông số Trạm XLNT:

Thông số	Giá trị
Công suất	100 m³/ngày (dư 30% so với peak)
Công nghệ	SBR + DAF + UV
Đầu ra	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A

Thông số	Giá trị
COD đầu vào	≤ 500 mg/L (CNC coolant)
COD đầu ra	≤ 75 mg/L
BOD ₅ đầu ra	≤ 30 mg/L
TSS đầu ra	≤ 50 mg/L
Kim loại nặng	Theo QCVN 40 Cột A
Bùn thải	Thu gom bởi đơn vị được cấp phép
CAPEX	180 K USD
OPEX	15 K USD/năm

4.7. Hệ thống Phòng cháy Chữa cháy (PCCC)

4.7.1. Phân loại Nguy hiểm Cháy

Khu vực	Phân loại	Hệ thống chữa cháy	Ghi chú
Khối A — Data Hall	Nguy hiểm cao	NOVEC 1230 (Clean Agent)	Không gây hại thiết bị điện tử
Khối A — Battery/UPS	Nguy hiểm cao	NOVEC 1230 + Foam	LiFePO ₄ ít nguy hiểm hơn Li-ion
Khối A — Generator	Nguy hiểm cao	Foam + CO ₂	Bồn diesel → foam
Khối B — Xưởng CNC	Nguy hiểm trung bình	Sprinkler + Foam	Dầu cắt gọt là chất cháy
Khối B — Kho phôi	Nguy hiểm cao	Sprinkler deluge	Kim loại, hóa chất
Khối C — SMT	Nguy hiểm trung bình	NOVEC 1230 (SMT area) + Sprinkler	Bảo vệ PCB inventory
Khối C — Assembly	Nguy hiểm thấp-trung bình	Sprinkler	
Văn phòng	Nguy hiểm thấp	Sprinkler	
Kho vật tư	Nguy hiểm trung bình	Sprinkler + Foam	Tùy loại hàng
Generator室	Nguy hiểm cao	Foam + CO ₂	
Ngoài trời		Hydrant + Fire hose reel	

4.7.2. Hệ thống PCCC Chi tiết

Hệ thống báo cháy (Fire Detection):

Thiết bị	Số lượng	Vùng phủ
Đầu báo khói quang (Optical Smoke Detector)	350	Toàn bộ
Đầu báo nhiệt (Heat Detector)	80	Bếp, Generator
VESDA (Very Early Smoke Detection)	20	Data Hall, UPS Room, Battery Room

Thiết bị	Số lượng	Vùng phủ
Nút nhấn khẩn cấp (Manual Call Point)	40	Hành lang, lối ra
Chuông + Đèn báo cháy (Sounder + Beacon)	60	Toàn khu vực
Trung tâm báo cháy (Fire Alarm Panel)	2	NOC + Phòng bảo vệ
Kết nối 119	1	Kết nối tự động đến PCCC TP.HCM

Hệ thống chữa cháy (Fire Suppression):

Hệ thống	CAPEX (K USD)	Khu vực
NOVEC 1230 Clean Agent	320-400	Data Hall (2 zone), UPS, SMT critical
Wet Pipe Sprinkler	200-280	Văn phòng, Assembly, Kho
Pre-Action Sprinkler	120-180	CNC area (tránh xả giả)
Foam System	100-150	Generator, Diesel tank, CNC coolant
CO ₂ System	60-80	Generator room
Fire Hydrant (ngoài trời)	100-150	6 trụ, bao phủ toàn khu
Fire Pump (Diesel + Electric + Jockey)	180-250	1 diesel 150HP + 1 electric 150HP + 1 jockey
Bồn nước PCCC	100-150	500 m ³ (đủ 2 giờ chữa cháy)
Tổng PCCC	1.180-1.640	
Trung bình (with 10% contingency)	~1.550	

[C — Giá tham chiếu thị trường VN 2024-2025]

4.7.3. Tuân thủ PCCC

Quy chuẩn	Mã	Yêu cầu
QCVN 06:2022/BXD	An toàn cháy cho nhà và công trình	Lối thoát hiểm, chịu lửa
TCVN 7336:2023	Sprinkler tự động	Thiết kế, lắp đặt
TCVN 5738:2021	Hệ thống báo cháy	Đầu báo, trung tâm
NFPA 75	ICT Equipment	Data Center specific
NFPA 2001	Clean Agent	NOVEC 1230 design
FM Global DS 5-32	Data Center	Tiêu chuẩn bảo hiểm DC
Nghị định 136/2020/NĐ-CP	PCCC	Thẩm duyệt thiết kế
Nghị định 50/2024/NĐ-CP	Sửa đổi NĐ 136	Cập nhật mới nhất

4.7.4. Phương án Phòng cháy

Khoảng cách an toàn: - Khoảng cách giữa các khối: ≥ 10 m - Khoảng cách đến ranh giới: ≥ 6 m - Đường xe cứu hỏa: Rộng $\geq 3,5$ m, vòng quanh tòa nhà - Bãi đậu xe cứu hỏa: ≥ 2 vị trí (mặt trước Khối A và Khối B)

Thoát hiểm: - Tối thiểu 2 lối thoát mỗi tầng, mỗi khu vực - Chiều rộng lối thoát: $\geq 1,2$ m - Khoảng cách đến lối thoát: ≤ 25 m (nguy hiểm cao), ≤ 40 m (nguy hiểm thấp) - Đèn EXIT + Đèn chiếu sáng sự cố: Pin backup 60 phút - Sơ đồ thoát hiểm: Dán tại mỗi phòng + Hành lang

4.8. Hệ thống Quản lý Tòa nhà (BMS/DCIM)

4.8.1. BMS (Building Management System)

Phần mềm: Schneider EcoStruxure Building Operation hoặc Honeywell Niagara:

Hệ thống con	Thông số giám sát
HVAC	Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lưu lượng gió
Điện	Công suất, dòng, áp, PF, THD, năng lượng
Nước	Lưu lượng, áp lực, chất lượng (pH, TDS)
PCCC	Trạng thái đầu báo, van, bơm
An ninh	Access control log, CCTV live + playback
Chiếu sáng	On/Off, dimming, timer

4.8.2. DCIM (Data Center Infrastructure Management)

Phần mềm: Schneider EcoStruxure IT Expert hoặc Vertiv Trellis:

Chức năng	Mô tả
Power Monitoring	PUE real-time, kW/rack, UPS status
Cooling Monitoring	Nhiệt độ/độ ẩm từng rack, chiller/CDU status
Capacity Planning	Rack space, power, cooling capacity forecast
Change Management	Ticket tracking cho di chuyển thiết bị
Asset Management	Inventory rack/server/cable
Alerting	SMS/Email khi vượt ngưỡng, escalation
Reporting	Monthly PUE, availability, SLA compliance

4.9. Tổng hợp Chi phí Hạ tầng

4.9.1. CAPEX Hạ tầng theo Khối

Hạng mục	Khối A — DC (K USD)	Khối B — CNC (K USD)	Khối C — IoT (K USD)	Chung (K USD)	Tổng (K USD)
Xây dựng dân dụng	1.500	1.200	800	500	4.000
M&E (BOQ Bảng 4.5.1)	6.600	1.630	925	1.200	10.355
Thiết bị sản xuất	—	9.590	1.070	—	10.660
Thiết bị IT / GPU	3.000	—	—	—	3.000
Phần mềm	200	102	50	100	452
Nội thất + Phụ kiện	50	100	80	200	430
Dự phòng 5%	568	631	146	100	1.445
Tổng	11.918	13.253	3.071	2.100	~30.342

Lưu ý: CAPEX hạ tầng ~30.342 K ở đây là phần xây dựng + M&E + thiết bị. Tổng CAPEX dự án 47.500 K bao gồm thêm: đất + chi phí pháp lý + chi phí trước vận hành + working capital ban đầu. Chi tiết tại Phần V — Tài chính [C].

4.10. Hệ thống Điện Trung thế và Hạ thế

4.10.1. Sơ đồ Cấp điện Tổng thể

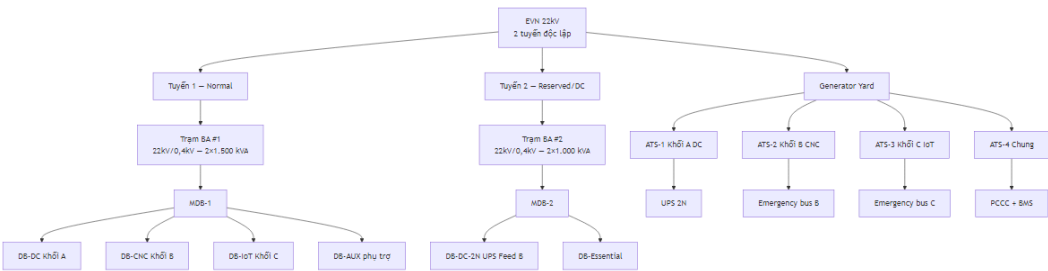


Diagram 29

4.10.2. Phụ tải Điện theo Khối

Khối	Phụ tải IT/SX (kW)	Phụ tải M&E (kW)	Phụ tải phụ trợ (kW)	Tổng (kW)	Hệ số đồng thời	Demand (kW)
A — DC	1.200	480 (cooling, PUE)	50	1.730	0,90	1.557

Khối	Phụ tải IT/SX (kW)	Phụ tải M&E (kW)	Phụ tải phụ trợ (kW)	Tổng (kW)	Hệ số đồng thời	Demand (kW)
B — CNC	1.800 (28 máy peak)	300 (HVAC, coolant pump)	80	2.180	0,70	1.526
C — IoT/SMT	400 (SMT line + Assembly)	150 (HVAC, Clean room)	50	600	0,75	450
Chung	—	200 (bơm PCCC, BMS)	150 (VP, canteen, chiếu sáng)	350	0,80	280
Tổng	3.400	1.130	330	4.860		~3.813
Yêu cầu EVN						≥ 4.500 kVA

[C] Peak demand 3.813 kW, yêu cầu EVN cấp ≥ 4.500 kVA (hệ số PF 0,85). Trạm BA tổng cộng 5.000 kVA (2×1.500 + 2×1.000) — đủ N+1. Chi phí đường dây 22kV từ trạm nguồn KCNC: ~150-250 K USD.

4.10.3. Chất lượng Điện năng

Thông số	Tiêu chuẩn	Biện pháp	CAPEX (K USD)
Sóng hài (THD)	< 5% (IEEE 519)	Active Harmonic Filter cho DB-CNC (VFD gây hài)	30-50
Hệ số công suất	> 0,95	Tụ bù APFC tại mỗi MDB	15-25
Điện áp ổn định	±5%	AVR tại máy biến áp	Included
Chống sét	IEC 62305	SPD Class I+II tại MDB, Class II+III tại DB	10-15
Nối đất	< 1 Ω (DC), < 5 Ω (general)	Hệ thống nối đất đẳng thế (TN-S)	20-30
UPS DC (2N)	Tier III requirement	Schneider Galaxy VX 2N	350-850
Generator	N+1	Cummins/Cat 4 × 750 kVA + SCR/DPF	400-600

4.11. Hệ thống HVAC và Kiểm soát Môi trường

4.11.1. Yêu cầu Nhiệt độ/Độ ẩm theo Khu vực

Khu vực	Nhiệt độ (°C)	Humidity (%RH)	Tiêu chuẩn	Làm sạch không khí	Áp suất
DC Data Hall	22-27 (ASHRAE A1)	20-80%	ASHRAE TC 9.9	MERV 8	Dương (+5 Pa)
CNC Workshop	22-28 (general)	30-70%	ISO 8573	MERV 8 + Mist Collector	Âm (-5 Pa)
CNC CMM Room	20 ± 0,5	45-55%	ISO 1:2016	HEPA H13	Dương (+10 Pa)

Khu vực	Nhiệt độ (°C)	Humidity (%RH)	Tiêu chuẩn	Làm sạch không khí	Áp suất
SMT Clean Room	22 ± 2	40-60%	ISO 14644 Class 7	HEPA H14	Dương (+15 Pa)
SMT Assembly	22-26	30-60%	IPC-A-610	MERV 11	Dương (+5 Pa)
R&D Lab	22 ± 2	40-60%	ISO 17025 ref.	HEPA H13	Dương (+10 Pa)
Văn phòng	24 ± 2	50-70%	ASHRAE 55	MERV 8	Neutral
Kho phân/vật tư	18-35 (không cần kiểm soát chặt)	< 80%	—	—	Neutral
Canteen	24-28	—	—	—	Âm

4.11.2. Thiết bị HVAC theo Khu vực

Khu vực	Thiết bị	Công suất	Số lượng	CAPEX (K USD)
DC Data Hall 1	CRAC Row-based (Schneider InRow)	60 kW each	6+2 (N+2)	210
DC Data Hall 2 + GPU	CDU + Rear Door HX	100 kW CDU	3+1	200
DC Chiller	Air-cooled Chiller (Daikin/Trane)	250 kW each	3+1	360
CNC Workshop	AHU + Exhaust + Mist Collector	80 kW cooling	4	120
CNC CMM Room	Precision AHU (Stulz/Emerson)	10 kW, ±0,5°C	2 (1+1)	60
SMT Clean Room	FFU + AHU + MAU	40 kW	2+1	80
Văn phòng + Canteen	VRV/VRF System (Daikin)	100 kW total	4 outdoor	80
R&D Lab	Precision AHU	15 kW each	3	45
Kho	Quạt thông gió tự nhiên + Exhaust	—	6	5
Tổng HVAC				~1.160

4.11.3. Hệ thống Hút Khói/Bụi CNC (Central Extraction)

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Loại	Central oil mist collector + HEPA	Cho 28 máy CNC
Công suất	15.000 m³/h (tổng)	500-800 m³/h per machine
Hiệu suất	> 99,97% @ 0,3µm (HEPA H13)	DOP test hàng năm
Pre-filter	Coalescent fiber (oil mist stage 1)	Thay 3 tháng/lần
HEPA	H13 (oil mist stage 2)	Thay 12 tháng/lần
Activated Carbon	Stage 3 (cho VOCs từ coolant)	Thay 6 tháng/lần
Motor	2 × 15 kW (N+1)	IE4 Premium Efficiency

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Ductwork	Galvanized steel, ø200-400mm	Balanced design, ≤ 15 m/s
Điểm hút	28 points (1 per CNC) + 4 manual stations	Flexible arm
CAPEX	120 K USD (incl. ductwork + installation)	
OPEX	15 K USD/năm (filters + electricity)	
EIA compliance	QCVN 19:2009 Cột A cho khí thải	Xem Phụ lục R.9

4.12. Hệ thống An ninh và Kiểm soát Truy cập

4.12.1. Mô hình An ninh 5 Lớp

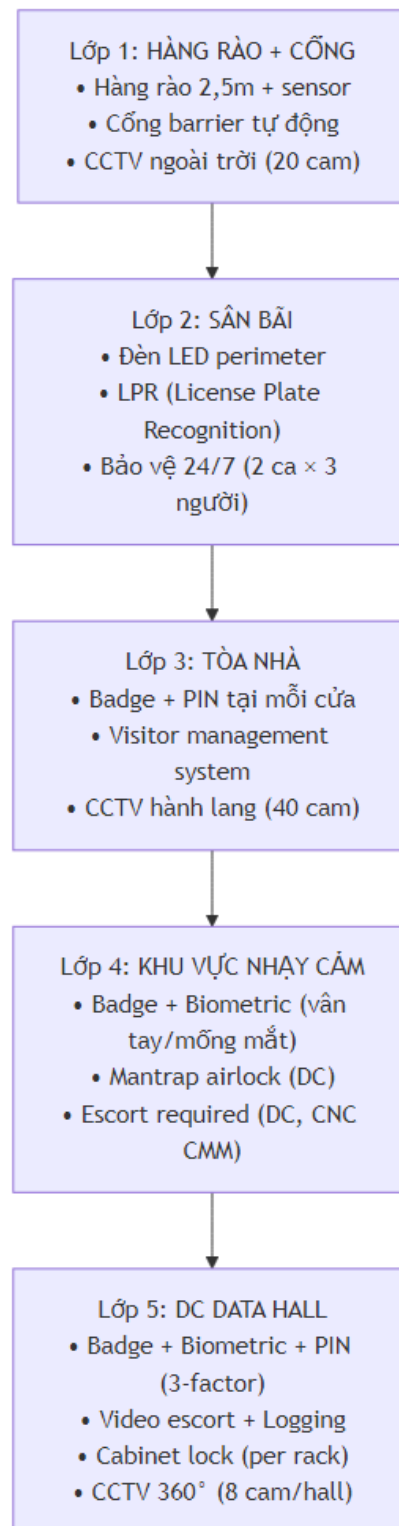


Diagram 30

4.12.2. Thiết bị An ninh

Hạng mục	Số lượng	Hãng	CAPEX (K USD)
CCTV Camera (4K, IR, PoE)	80	Hikvision DS-2CD2687	40
NVR (Network Video Recorder)	4	Hikvision DS-96128NI	8
Storage (CCTV 90 ngày)	200 TB	Seagate SkyHawk	15
Access Control Panel	8	HID iCLASS SE	12
Card Reader (Badge)	40	HID iCLASS SE	10
Biometric Reader (Fingerprint + Iris)	10	Suprema BioStation 3	15
Mantrap (DC entrance)	2	Boon Edam	25
Barrier Gate (Parking)	2	FAAC / Nice	5
LPR Camera	2	Hikvision / Genetec	3
Visitor Management Kiosk	2	Custom tablet + Software	3
E-lock (Cabinet lock per rack)	100	Chatsworth CPI	20
Perimeter sensor (IR beam)	20	Optex	5
PA System (Announcement)	1 lot	TOA / Bosch	5
VMS Software (Video Management)	1	Genetec / Milestone	8
PSIM Integration	1	CNL / Genetec	5
Tổng An ninh			~179

4.13. Hệ thống Công nghệ Thông tin (IT Infrastructure)

4.13.1. Hạ tầng Mạng Nội bộ

Hạng mục	Thông số	CAPEX (K USD)
Core Switch	2 × Cisco Nexus 9336C (100GbE, VSS)	60
Distribution Switch	4 × Cisco Catalyst 9300 (48-port PoE+)	24
Access Switch	20 × Cisco Catalyst 9200 (24/48-port)	30
WiFi 6 AP	40 × Cisco Meraki MR46	16

Hạng mục	Thông số	CAPEX (K USD)
Firewall	2 × Palo Alto PA-5200 Series (HA Active/Passive)	40
Structured Cabling	Cat6A toàn bộ (factory + office), OM4 uplink	35
Fiber Backbone	OS2 single-mode (inter-building), OM4 (intra)	15
Server Room (Internal IT)	4 × Rack, UPS 20 kVA, PAC	20
WAN / MPLS	2 × Internet (FPT + VNPT, 1 Gbps mỗi)	10/năm
VPN	Cisco AnyConnect + SD-WAN (future)	5
Tổng IT Infrastructure		~255

4.13.2. Hệ thống Phần mềm (Software Stack)

Phần mềm	Chức năng	Vendor	License Model	CAPEX/năm (K USD)
ERP	Quản lý tài chính, kho, mua hàng	SAP Business One / Odoo Enterprise	Perpetual + Maintenance	30-80
MES	Manufacturing Execution (CNC, SMT)	Siemens Opcenter / Aegis FactoryLogix	Annual subscription	30-60
NX CAD/CAM	Thiết kế + Lập trình CNC	Siemens NX	Perpetual + Maintenance	15-25
PC-DMIS	Lập trình CMM	Hexagon	Perpetual + Maintenance	8-12
DCIM	Quản lý hạ tầng DC	Schneider EcoStruxure IT	Annual subscription	15-25
PLM	Product Lifecycle Management	Siemens Teamcenter (Rapid Start)	Annual	10-20
QMS	Quality Management System	MasterControl / ETQ	Annual	8-15
JIRA / Confluence	Project Management + Wiki	Atlassian Cloud	Annual	5-10
Microsoft 365	Email, Office, SharePoint, Teams	Microsoft	Per user/month	15-25
Tổng Software Y1				~150-280

4.13.3. Hệ thống MES — Manufacturing Execution System

Kiến trúc MES tích hợp:

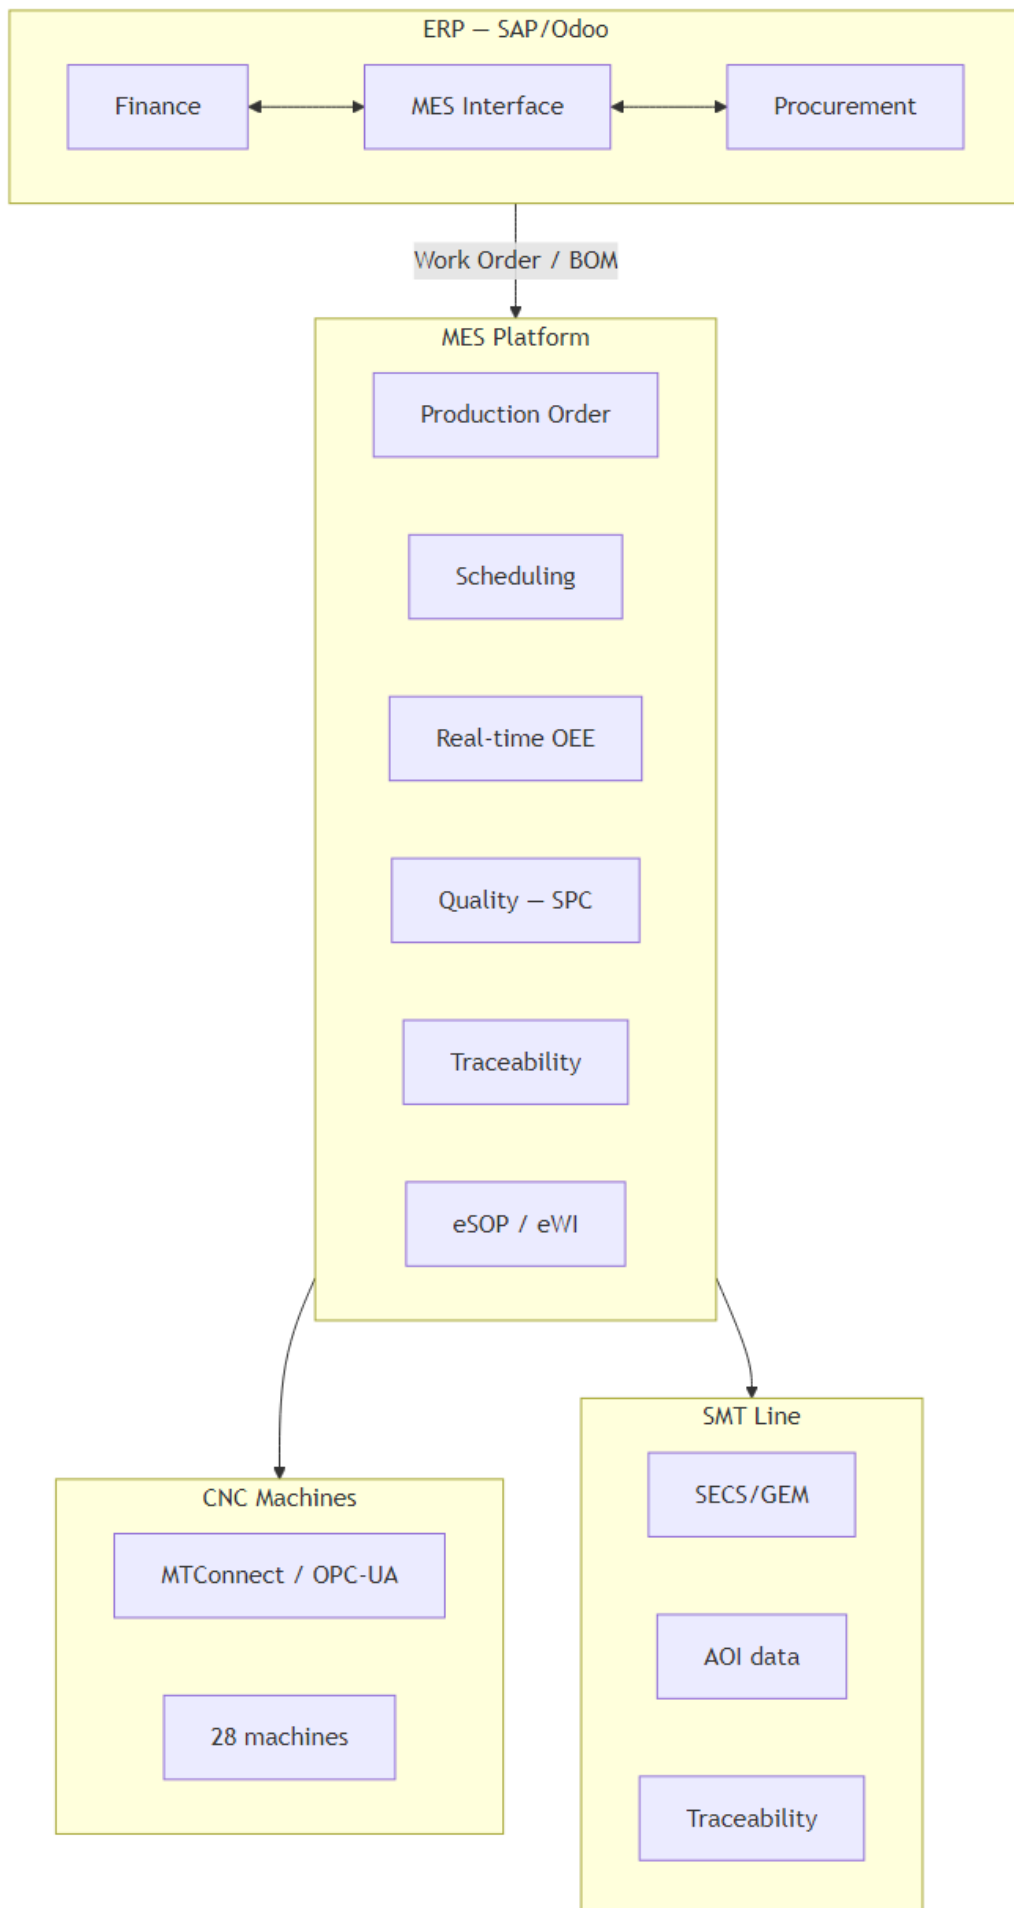


Diagram 31

Chức năng MES	Chi tiết	Trụ cột
CNC Data Collection	OEE, cycle time, spindle load, tool life — via MTConnect/OPC-UA	CNC
Job Tracking	RFQ → PO → Job → Operation → Ship → Invoice	CNC
SPC (Statistical Process Control)	Xbar-R chart tại CMM, real-time Cp/Cpk	CNC
Traceability	Mỗi chi tiết CNC có mã QR → link tới: máy, tool, operator, CMM report	CNC
SMT Traceability	PCB serial → link tới: SMT program, solder paste lot, AOI result	IoT
eSOP / eWI	Bản vẽ + Video hướng dẫn trên màn hình tại mỗi workstation	All
Dashboard	Real-time OEE, WIP, Quality yield — TV treo tại workshop	All
Maintenance (CMMS)	Preventive Maintenance schedule, spare parts tracking	All
Integration	ERP (SAP/Odoo) ← → MES ← → Machine (OPC-UA) ← → DCIM	All

4.14. Hệ thống Năng lượng Tái tạo và Bền vững

4.14.1. Solar PV Rooftop

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Công suất lắp đặt	500 kWp	Mái tòa nhà (Tầng 3 + mái)
Diện tích mái	~3.500 m ² (cần 2 m ² /kWp cho mono-Si)	Kiểm tra kết cấu mái
Sản lượng dự kiến	~650-700 MWh/năm	Irradiance TPHCM: 4,5 kWh/m ² /day
Tỷ lệ tự tiêu thụ	85-95%	Dùng trực tiếp, không bán lên lưới
Tiết kiệm điện	~65-70 K USD/năm	0,10 USD/kWh × 650 MWh
CAPEX	~350-400 K USD	~0,7-0,8 USD/Wp installed
Simple Payback	5,5-6 năm	
Giảm CO₂	~450-490 tCO ₂ /năm	EF VN: 0,7 tCO ₂ /MWh
Tuổi thọ	25 năm (hiệu suất ≥80% tại năm 25)	Tier 1 panel (LONGi, JA Solar)
Hãng	LONGi Hi-MO 7 (580W mono-Si)	Hoặc JA Solar DeepBlue
Inverter	Huawei SUN2000-100KTL (string inverter) × 5	Monitoring qua FusionSolar

4.14.2. Chiến lược ESG và Carbon Footprint

Chỉ số	Baseline (no action)	Target (with measures)	Biện pháp
Scope 1 (GHG trực tiếp)	1.500 tCO ₂ e/năm	900 tCO ₂ e/năm (-40%)	Giảm generator runtime, B5 biodiesel
Scope 2 (Điện)	8.000 tCO ₂ e/năm	6.000 tCO ₂ e/năm (-25%)	Solar 500kWp, PUE optimization, LED
Scope 3 (Chuỗi cung ứng)	Chưa đo	Phase 2 target	Supplier engagement, logistics optimize
Tổng GHG	~9.500 tCO ₂ e/năm	~6.900 tCO ₂ e/năm	Giảm ~27%
Nước tái sử dụng	0%	≥ 30%	RO condensate, CT blowdown reuse
Chất thải tái chế	50%	≥ 80%	Phoi CNC, bìa carton, pallet
PUE DC	1,45 (VN average)	1,28-1,32	DLC, free cooling, hot aisle containment

[C] Giảm GHG 27% = ~2.600 tCO₂e/năm = ~26.000 tCO₂e/10 năm. Nếu carbon credit price 10 USD/tCO₂ → potential value 260 K USD/10Y. Tuy nhiên, giá trị ESG chính là: (a) Đáp ứng yêu cầu FDI (Samsung/Bosch đều yêu cầu Scope 3 reduction từ supplier), (b) Ưu đãi green loan (giảm lãi 0,5-1,0%), (c) Hình ảnh doanh nghiệp khi trình bày BQL KCNC.

PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

5.1. Tổng quan Cấu trúc Vốn

5.1.1. CAPEX Tổng hợp — 5 Phase / 15 năm

Hạng mục	P0 Y0-Y2	P1 Y2-Y5	P2 Y5-Y7	P3 Y7-Y10	P4 Y10-Y13	Tổng (K)	%
Thuê đất + Hạ tầng site	600	400	—	—	—	1.000	2,1%
Thiết kế + Pháp lý + EIA	500	100	50	50	50	750	1,6%
Xây dựng shell (3 tầng)	—	5.500	—	—	—	5.500	11,6%
M&E cơ bản (điện, nước, PCCC)	—	1.500	500	500	500	3.000	6,3%
Fit-out IoT/SMT (Tầng 2)	—	—	3.500	—	—	3.500	7,4%

Hạng mục	P0 Y0-Y2	P1 Y2-Y5	P2 Y5-Y7	P3 Y7-Y10	P4 Y10-Y13	Tổng (K)	%
Thiết bị IoT + SMT line	—	—	2.500	—	—	2.500	5,3%
Fit-out CNC (Tầng 1 — 3.000 m ²)	—	—	—	4.000	—	4.000	8,4%
Thiết bị CNC (28 máy 5 trục)	—	—	—	8.660	2.000	10.660	22,4%
CMM + QC Lab	—	—	—	1.200	—	1.200	2,5%
Fit-out DC (Tầng 1 — 1.500 m ²)	—	—	—	—	3.000	3.000	6,3%
Thiết bị IT + GPU (DC)	—	—	—	—	3.000	3.000	6,3%
Phần mềm + License	100	100	100	100	52	452	1,0%
Nội thất + Văn phòng (Tầng 3)	—	—	430	—	—	430	0,9%
Chứng nhận (ISO/IATF/AS)	50	50	50	100	50	300	0,6%
PCCC bổ sung	200	200	200	200	200	1.000	2,1%
Môi trường (ZLD + XLNT)	100	100	100	100	70	470	1,0%
Dự phòng phát sinh (10%)	250	550	700	1.300	1.123	3.923	8,3%
Tổng CAPEX	1.800	8.500	8.130	16.210	10.045	~44.685	94,1%
Vốn lưu động (Working Capital)	700	—	1.500	1.800	1.500	5.500	11,6%
Dự phòng lỗ (Y5-Y12 ramp-up)	—	—	1.000	1.000	—	2.000	4,2%
Trả thuê đất lũy kế (Y0-Y4, exempt)	—	—	—	—	—	—	0%
Thuê đất (từ Y5, ~120K/năm)	—	—	—	—	—	Ghi nhận OPEX	—
Tổng nhu cầu vốn	2.500	8.500	10.630	19.010	11.545	~47.500	100%

[C — CAPEX 47,50M USD bao gồm vốn lưu động (5,5M) và dự phòng lỗ ramp-up (2,0M). Thuê đất 1 ha tại KCNC = 1,0 USD/m²/tháng = ~120K USD/năm, được miễn 11 năm đầu theo chính sách ưu đãi CNC. Y0-Y5: xây xong shell, chưa mua thiết bị — 100% vốn CSH.]

5.1.2. Cấu trúc Nguồn vốn

"Cấu trúc Nguồn vốn — 47,50M USD"

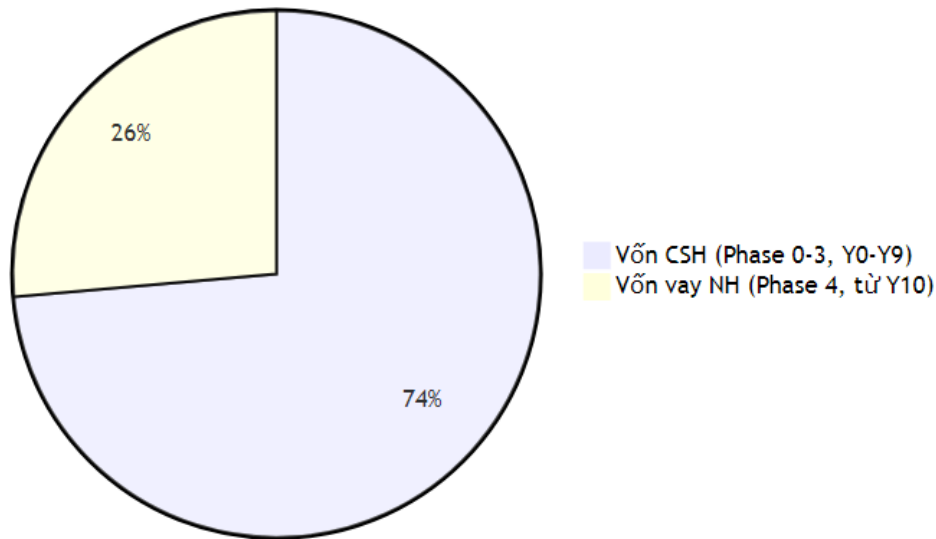


Diagram 32

Nguồn	Số tiền (M USD)	Tỷ trọng	Điều kiện	Thời điểm
Vốn chủ sở hữu (CSH)	34,97	73,6%	Nhà đầu tư Mekong Technology — tự chủ 100% trong 10 năm đầu	Y0-Y9
Vay ngân hàng	12,53	26,4%	Lãi suất 8-9%/năm, kỳ hạn 10 năm, ân hạn 2 năm. Chỉ vay khi đã có doanh thu chứng minh (Revenue Y9 ≥ 11,5M)	Từ Y10
Tổng	47,50	100%		

Chiến lược tài chính: Nhà đầu tư **đủ tiền cho 10 năm đầu** (34,97M CSH) mà không cần vay ngân hàng. Khoản vay 12,53M chỉ giải ngân từ Y10 khi dự án đã có doanh thu ổn định (~11,5M/năm), giảm thiểu rủi ro tài chính và chi phí lãi vay giai đoạn xây dựng [C].

5.1.3. Chi tiết Vốn CSH — Equity Bridge (5 Phase)

Phase	Hạng mục	Số tiền (M USD)	Thời điểm	Ghi chú
Phase 0	Thiết kế, pháp lý, EIA, thuê đất Y0-Y2	2,50	Y0-Y2	100% CSH
Phase 1	Xây dựng shell 3 tầng + M&E cơ bản	8,50	Y2-Y5	100% CSH
Phase 2	Fit-out IoT/SMT + thiết bị + WC + dự phòng lỗi	10,63	Y5-Y7	100% CSH
Phase 3	Fit-out CNC + 28 máy + QC Lab (phần CSH)	13,34	Y7-Y10	CSH + Revenue reinvest
Buffer dự phòng	Biến động tỷ giá, phát sinh, contingency	2,00	—	~4,2% tổng vốn
Tổng CSH cam kết		34,97	Y0-Y10	
Phase 4	Fit-out DC + thiết bị IT + GPU (vay NH)	12,53	Y10-Y13	100% vay, trả từ Revenue

[C — Equity bridge: nhà đầu tư cam kết trả vốn 34,97M trong 10 năm, trung bình ~3,5M/năm. Không có áp lực vay trong giai đoạn xây dựng. Khoản vay Y10 được bảo đảm bởi TSCĐ + doanh thu đã chứng minh.]

5.2. Doanh thu Dự kiến 15 năm (Horizon đầu tư) + 50 năm (Hợp đồng thuê)

5.2.1. Bảng Doanh thu Chi tiết — 15 năm đầu tư

Lưu ý: Y0-Y4 = giai đoạn xây dựng shell, KHÔNG có doanh thu. Doanh thu bắt đầu từ **Y6** (sau khi IoT/SMT vận hành từ Y5, ramp-up 1 năm). CNC vận hành từ Y8. DC vận hành từ Y11.

Năm	IoT/Robot (M)	CNC (M)	DC (M)	Tổng (M)	Phase	Ghi chú
0-4	—	—	—	0	P0-P1	Xây dựng shell, thiết kế
5	0,50	—	—	0,50	P2 start	IoT ramp-up Q3-Q4
6	2,50	—	—	2,50	P2	Năm doanh thu đầu tiên đầy đủ
7	4,00	1,00	—	5,00	P2-P3	CNC bắt đầu Q3/Y7
8	5,00	3,00	—	8,00	P3	CNC ramp-up, 15 máy

Năm	IoT/Robot (M)	CNC (M)	DC (M)	Tổng (M)	Phase	Ghi chú
9	5,50	5,50	0,50	11,50	P3	28 máy, DC pilot
10	6,00	7,00	1,50	14,50	P3-P4	Revenue Y10 [C]
11	6,50	8,50	3,00	18,00	P4	DC Zone 1 fully operational
12	7,00	9,50	4,50	21,00	P4	CNC + DC scale-up
13	7,50	10,00	5,50	23,00	P4	Breakeven Year (discounted)
14	8,00	10,50	6,50	25,00	Steady	
15	8,50	11,50	12,00	32,00	Steady	Revenue Y15 [C]
Tổng 15Y	61,00	66,50	33,50	~165,00		Revenue tích lũy 15 năm [C]

Đối chiếu: Doanh thu 15 năm (Base Case) = **~165M USD** [C]. Y0-Y5 không có doanh thu đáng kể — đây là giai đoạn xây dựng nền tảng. Breakeven (discounted, WACC 12%) đạt tại Y13.

5.2.2. Doanh thu Y10 và các Mốc quan trọng

Mốc	Giá trị	Nhãn	Ghi chú
First Revenue	Y5 Q3 (IoT pilot) → Y6 full-year: 2,5M	[C]	IoT/Robot BU vận hành đầu tiên
Revenue Y10	14,50 M USD	[C]	3 BU combined: IoT 6,0 + CNC 7,0 + DC 1,5
Revenue Y15	32,00 M USD	[C]	Steady-state 3 BU
Revenue 15Y tích lũy	~165,00 M USD	[C]	Sum Y5-Y15
Revenue 50Y (hợp đồng thuê)	~700-900 M USD	[A]	Giả định tăng trưởng 2-3%/năm sau Y15
EBITDA steady-state	~28%	[C]	Từ Y13 trở đi

5.3. Chi phí Hoạt động (OPEX)

5.3.1. Bảng OPEX Chi tiết — Năm 10 (đại diện, 3 BU hoạt động)

Hạng mục	K USD/năm	Tỷ trọng	Ghi chú
Nhân sự (Lương + BHXH)	3.150	35%	150 người × avg 21K/năm
Nguyên vật liệu	2.200	24%	Phôi CNC + Linh kiện IoT + PCB
Điện	1.400	16%	DC + CNC + SMT (~2,5 MW total)
Bảo trì thiết bị	900	10%	CNC + DC + SMT
Phần mềm License	250	3%	CAD/CAM + DCIM + ERP
PCCC + An toàn	80	1%	Bảo trì PCCC + Huấn luyện
Môi trường (XLNT + Air)	300	3%	Vận hành XLNT + Giám sát
Bảo hiểm	150	2%	Tài sản + TNDS + Cyber
Marketing + Sales	300	3%	Trade show + Digital marketing
Thuê đất (KCNC)	120	1%	~1,0 USD/m ² /tháng × 10.000 m ² (1 ha) [B]
Quản lý + Hành chính	120	1%	VP + Đi lại + Tư vấn
Dự phòng OPEX	80	1%	
Tổng OPEX Y10	~9.050	100%	

Ghi chú thuê đất: Thuê đất KCNC 1,0 USD/m²/tháng × 10.000 m² = 120.000 USD/năm. Miễn 11 năm đầu (Y0-Y10) theo chính sách ưu đãi CNC → tiết kiệm ~1,32M USD. Giảm 50% trong 4 năm tiếp (Y11-Y14) → 60K/năm. Từ Y15 trả đủ 120K/năm [B].

5.3.2. OPEX theo Năm

Năm	OPEX (M USD)	Gross Margin	EBITDA Margin	Ghi chú
0-4	0,30-0,50	—	—	Chi phí quản lý, pháp lý, giám sát xây dựng
5	1,00	—	—	IoT ramp-up
6	2,80	15%	-15% (lỗ ramp-up)	IoT full-year

Năm	OPEX (M USD)	Gross Margin	EBITDA Margin	Ghi chú
7	4,50	25%	5%	IoT + CNC start
8	6,00	30%	15%	CNC ramp-up
9	7,50	35%	22%	3 BU operational
10	9,00	38%	25%	
11	10,50	40%	27%	DC ramp-up
12	11,50	42%	28%	
13-15	12,00-13,00	44-46%	28-30%	Steady-state
16-50	+2-3%/năm	46-48%	30-33%	Mature operations

5.4. Báo cáo Lãi lỗ Dự kiến (Pro-forma P&L)

5.4.1. P&L 15 năm — Base Case

Lưu ý: Y0-Y4 là giai đoạn xây dựng — chỉ có chi phí quản lý (~0,3-0,5M/năm), không có doanh thu. P&L chi tiết bắt đầu từ Y5.

Khoản mục	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y15
Doanh thu	0,50	2,50	5,00	8,00	11,50	14,50	18,00	21,00	23,00	32,00
COGS	(0,40)	(2,13)	(3,75)	(5,60)	(7,48)	(8,99)	(10,80)	(12,18)	(12,88)	(17,28)
Lãi gộp	0,10	0,37	1,25	2,40	4,02	5,51	7,20	8,82	10,12	14,72
Chi phí BH&QL	(0,50)	(0,80)	(1,00)	(1,20)	(1,50)	(1,80)	(2,00)	(2,20)	(2,30)	(2,50)
Khấu hao	(0,40)	(0,50)	(0,80)	(1,20)	(1,50)	(1,80)	(2,00)	(2,00)	(2,00)	(2,00)
EBIT	(0,80)	(0,93)	(0,55)	0,00	1,02	1,91	3,20	4,62	5,82	10,22
Chi phí lãi vay	0	0	0	0	0	0	(1,06)	(0,98)	(0,89)	(0,72)
EBT	(0,80)	(0,93)	(0,55)	0,00	1,02	1,91	2,14	3,64	4,93	9,50
CIT (ưu đãi)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0,25)	(0,48)
Lãi ròng	(0,80)	(0,93)	(0,55)	0,00	1,02	1,91	2,14	3,64	4,68	9,02

Khoản mục	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y15
Net Margin	-160%	-37%	-11%	0%	9%	13%	12%	17%	20%	28%

Thuế suất ưu đãi KCNC: CIT 10% (thay vì 20%) × 15 năm. Miễn 4 năm đầu có lãi (Y9-Y12 miễn). Giảm 50% × 9 năm tiếp theo (Y13-Y21 → CIT 5%). NPV ưu đãi thuế ~4,5M USD / 15 năm [C].

Lãi vay: Chỉ phát sinh từ Y10 khi giải ngân 12,53M. Lãi suất 8,5%/năm. Y0-Y9 = 0 lãi vay → giảm gánh nặng tài chính giai đoạn xây dựng [C].

5.4.2. Điểm Hòa vốn

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Breakeven Point (EBIT > 0)	Năm 8	EBIT ≈ 0 tại Y8, dương từ Y9
Breakeven Point (Net Income > 0)	Năm 9	EBT dương từ Y9 (1,02M)
Payback Period (Simple)	Năm 12-13	Lũy kế lãi ròng bù hết CSH đã giải ngân
Payback Period (Discounted, WACC 12%)	Năm 13	NPV dòng tiền tích lũy > 0
NPV(20Y, 12%) trở dương	Không đạt	NPV(20Y) ≈ -5,3M do 5Y xây dựng [C]
NPV(50Y, 12%) trở dương	Đạt: +1,5M	Phù hợp HĐ thuê đất 50 năm [C]

Giải thích NPV: Do 5 năm đầu xây dựng không có doanh thu, NPV khi đánh giá tại horizon 20 năm bị âm (-5,3M). Đây là đặc thù dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn. Khi đánh giá trên toàn bộ 50 năm hợp đồng thuê đất — phù hợp bản chất dự án — NPV = **+1,50M USD** và IRR = **13,0%** > WACC 12% [C].

5.5. Dòng tiền Dự kiến (Projected Cash Flow)

5.5.1. Cash Flow 15 năm

Ghi chú: Y0-Y4 = giai đoạn xây dựng, chi tiêu CAPEX từ CSH. Y5-Y9 = ramp-up, doanh thu bắt đầu. Y10+ = vay + mở rộng DC.

Khoản mục	Y0-Y2	Y2-Y5	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
CF từ HĐKD								
Lãi ròng	—	—	(0,80)	(0,93)	(0,55)	0,00	1,02	1,91
+ Khấu hao	—	—	0,40	0,50	0,80	1,20	1,50	1,80

Khoản mục	Y0-Y2	Y2-Y5	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
± Thay đổi WC	—	—	(0,30)	(0,50)	(0,30)	(0,20)	(0,15)	(0,10)
Net Operating CF	—	—	(0,70)	(0,93)	(0,05)	1,00	2,37	3,61
CF từ Đầu tư								
CAPEX	(2.500)	(8.500)	(5.315)	(5.315)	(8.105)	(8.105)	—	(0,50)
CF từ Tài chính								
Vốn CSH giải ngân	2.500	8.500	5.315	5.315	8.105	5.235	—	—
Giải ngân vay	—	—	—	—	—	—	—	—
Trả gốc + lãi vay	—	—	—	—	—	—	—	—
Net CF	0	0	(0,70)	(0,93)	(0,05)	(1,87)	2,37	3,11
CF lũy kế	0	0	(0,70)	(1,63)	(1,68)	(3,55)	(1,18)	1,93

Khoản mục	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
Net Operating CF	4,14	5,64	6,68	7,50	11,00
CAPEX	(5,77)	(5,77)	—	(0,30)	(0,30)
Giải ngân vay	6,27	6,27	—	—	—
Trả gốc + lãi vay	—	—	(1,50)	(1,50)	(1,50)
Net CF	4,64	6,14	5,18	5,70	9,20
CF lũy kế	6,57	12,71	17,89	23,59	32,79

[C — CF lũy kế dương từ Y10. Vay chỉ phát sinh từ Y11 (giải ngân cho Phase 4 DC). Trả gốc + lãi bắt đầu Y13 sau 2 năm ân hạn.]

5.5.2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Ghi chú: Y0-Y9 không có khoản vay → DSCR không áp dụng. Vay 12,53M giải ngân từ Y10-Y11. Ân hạn gốc 2 năm (Y11-Y12). Trả gốc + lãi từ Y13.

Năm	EBITDA (M USD)	Debt Service (M USD)	DSCR	Đánh giá
0-9	—	0	N/A	Không vay
10	3,71	0	N/A	Vay chưa giải ngân
11	5,20	1,06 (lãi only)	4,91	Rất tốt

Năm	EBITDA (M USD)	Debt Service (M USD)	DSCR	Đánh giá
12	6,64	0,98 (lãi only)	6,78	Xuất sắc
13	7,68	1,50 (gốc + lãi)	5,12	Xuất sắc
14	8,50	1,50	5,67	Xuất sắc
15	12,00	1,50	8,00	Xuất sắc

Nhờ chiến lược tự chủ vốn Y0-Y9, DSCR luôn > 4x từ khi bắt đầu vay. Không có giai đoạn DSCR < 1,0x — rủi ro tín dụng rất thấp. Ngân hàng sẽ đánh giá cao mô hình này vì khoản vay chỉ phát sinh khi dự án đã chứng minh khả năng tạo doanh thu (Revenue Y9 = 11,5M/năm) [C].

5.6. Phân tích Hiệu quả Đầu tư

5.6.1. Các Chỉ số Chính (Base Case)

Chỉ số	Giá trị	Benchmark	Đánh giá
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50 M USD	> 0	Dự án khả thi tài chính trên horizon 50Y [C]
NPV (20Y, WACC 12%)	-5,30 M USD		Âm do 5Y xây dựng — đặc thù dự án hạ tầng [C]
IRR (50Y)	13,0%	> WACC 12%	Vượt chi phí vốn [C]
IRR (20Y)	~9,5%	< WACC 12%	Chưa đủ 20Y để recover CAPEX [C]
Payback Period (simple)	~12-13 năm	< 15 năm	Trung bình cho dự án hạ tầng CNC
Payback Period (discounted)	~13 năm	< 50 năm (thuê đất)	Chấp nhận được
ROIC (Y15)	18%	> WACC 12%	Tốt
Revenue Y10	14,50 M USD	—	3 BU combined [C]
Revenue Y15	32,00 M USD	—	Steady-state [C]
Revenue 15Y cumulative	~165,00 M USD	—	Base Case [C]
EBITDA Margin (steady-state)	28-30%	> 25%	Tốt cho ngành sản xuất CNC

Giải thích NPV 50Y vs 20Y: Dự án có 5 năm xây dựng không tạo doanh thu. Khi đánh giá theo horizon 20 năm (chỉ 15 năm hoạt động), NPV âm. Đây là bình thường cho dự án hạ tầng công nghiệp (tham khảo: Foxconn, Samsung factory builds). Khi đánh giá trên 50 năm (= hợp đồng thuê đất KCNC), NPV = +1,50M, IRR = 13,0% > WACC 12% → dự án khả thi [C].

5.6.2. Phân tích 3 Kịch bản

Chỉ số	Conservative	Base Case	Optimistic
Revenue 15Y (M USD)	130,00	165,00	210,00
NPV 50Y (M USD)	0,50	1,50	4,00
IRR 50Y (%)	12,3%	13,0%	14,5%
Payback (simple)	14-15 năm	12-13 năm	10-11 năm
DSCR min (>=Y13)	3,5x	5,1x	7,0x
Probability	30%	50%	20%
Probability-weighted NPV	0,15	0,75	0,80
Total Expected NPV		1,70 M USD	

[C — Probability-weighted NPV = 30% × 0,50 + 50% × 1,50 + 20% × 4,00 = 1,70M USD]

5.6.3. Phân tích Nhạy cảm (Sensitivity Analysis)

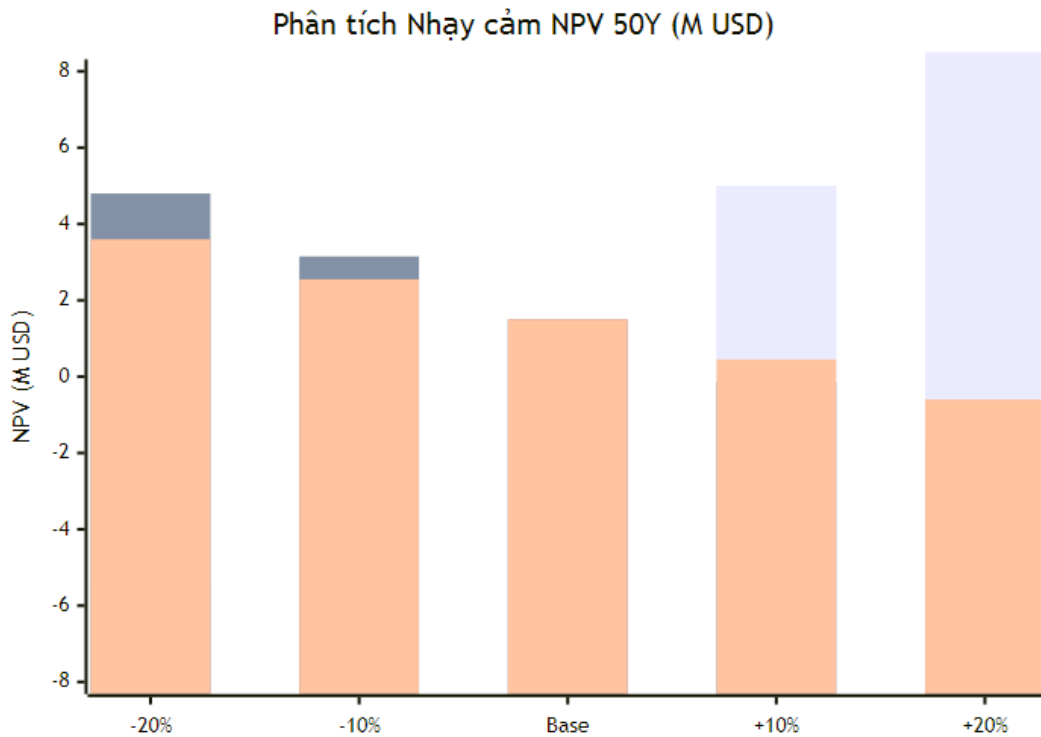


Diagram 33

Biến	-20%	-10%	Base	+10%	+20%
Doanh thu	(5,50)	(2,00)	1,50	5,00	8,50
OPEX	4,80	3,15	1,50	(0,15)	(1,80)
CAPEX	3,60	2,55	1,50	0,45	(0,60)
Lãi suất vay (±2pp)	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00
Tỷ giá USD/VND (±5%)	1,80	1,65	1,50	1,35	1,20

Kết luận: Doanh thu vẫn là biến nhạy cảm nhất — giảm ~12% doanh thu sẽ khiến NPV(50Y) $\approx$ 0. Tuy nhiên, nhờ chiều dài horizon 50 năm và không vay giai đoạn xây dựng (Y0-Y9), dự án ít nhạy cảm với lãi suất và tỷ giá hơn so với mô hình vay từ đầu [C].

5.7. Giá trị Chiến lược (Strategic Value Assessment)

5.7.1. Tổng hợp Giá trị Dự án

Ngoài NPV tài chính thuần túy (1,50M USD trên horizon 50Y), dự án Mekong Technology còn tạo ra **giá trị chiến lược** không được phản ánh trong DCF truyền thống:

Thành phần	Giá trị (M USD)	Phương pháp	Ghi chú
NPV tài chính (DCF 50Y)	1,50	DCF, WACC 12%	[C]
Real Options Value	3,50	Black-Scholes	Quyền mở rộng DC lên 200+ Rack, quyền mở rộng CNC Additive [C]
Barrier to Entry	2,80	Cost-to-replicate	Đối thủ cần >100M USD + 5 năm để tái tạo hệ sinh thái 3 trụ cột [A]
Synergy Premium	2,20	NPV Synergy Cash Flow	Ma trận cộng hưởng 3 trụ cột (~0,8-1,8M/năm) [C]
Platform/Ecosystem Value	4,50	Revenue multiple	MekongOS platform + KCNC ecosystem lock-in [A]
Ưu đãi thuế KCNC	4,50	NPV thuế tiết kiệm	CIT 10% $\times$ 15Y, miễn 4Y, giảm 50% $\times$ 9Y [C]
Miễn thuê đất 11Y	1,32	PV tiết kiệm	120K/năm $\times$ 11 năm, PV [C]
Tổng Giá trị Chiến lược	~20,32		
Strategic Value / CAPEX	42,8%	20,32 / 47,50	[C]

5.7.2. So sánh V1 vs V2.1

Chỉ số	V1 (IoT Only, 15 ha)	V2.1 (3 Trụ cột, 1 ha)	Thay đổi
Diện tích đất	15 ha	1 ha	-93%
Tòa nhà	3 khối, 150.000 m ²	1 tòa 3 tầng, 21.000 m ² GFA	-86% GFA
CAPEX	20,00 M	47,50 M	+137%
Revenue Y10	~12 M	14,50 M	+21%
Revenue 15Y	~120 M	~165 M	+38%
NPV (50Y, 12%)	~15 M (20Y)	1,50 M (50Y)	Khác horizon
IRR	15,2% (20Y)	13,0% (50Y)	-2,2pp
Giai đoạn xây dựng	18 tháng	5 năm (shell)	+3,5 năm
First revenue	M18	Y6	+4,5 năm trễ hơn

Chỉ số	V1 (IoT Only, 15 ha)	V2.1 (3 Trụ cột, 1 ha)	Thay đổi
Strategic Value	~15,20 M	~20,32 M	+34%
Vay ngân hàng	Từ Y0	Từ Y10 (sau chứng minh Revenue)	An toàn hơn

Giải thích: V2.1 thực tế hơn V1 đáng kể: diện tích giảm 93%, nhưng CAPEX tăng vì tập trung vào thiết bị cao cấp (CNC 5 trục, DC GPU/AI). Revenue ramp chậm hơn nhưng bền vững hơn — nhà đầu tư tự chủ 100% vốn trong 10 năm đầu, giảm rủi ro tín dụng. Strategic Value tăng 34% nhờ thêm miễn thuế đất 11 năm [C].

5.8. Phân tích Rủi ro Tài chính

5.8.1. Ma trận Rủi ro

#	Rủi ro	Xác suất	Tác động (M USD)	Biện pháp giảm thiểu
1	Revenue ramp-up chậm hơn dự kiến	Trung bình	2-5 M	Pre-lease DC, LOI CNC, pipeline IoT từ V1
2	CAPEX vượt dự toán (>10%)	Trung bình	2-4 M	Dự phòng 10% (3,92M), fixed-price contract
3	Giá GPU giảm (AI market shift)	Thấp-TB	1-3 M	Hybrid model (lease 60% + buy 40%), flexible
4	Mất khách hàng CNC lớn	Thấp	1-2 M	Đa dạng 5+ khách hàng FDI, không >30% từ 1 KH
5	Tỷ giá USD/VND biến động >5%	Trung bình	0,5-1 M	Revenue USD 70%, OPEX VND 60% → hedge tự nhiên
6	Lãi suất tăng >12%	Thấp	0,5-1 M	Tỷ lệ vay thấp (20%), cân nhắc fix rate
7	Thiếu nước KCNC	Thấp	0,3-0,5 M	4 phương án tiết kiệm nước (Bảng 4.6.2)
8	Chậm trễ chứng nhận (IATF/AS9100)	Trung bình	1-2 M	Thuê consultant chuyên nghiệp, timeline buffer 6 tháng

#	Rủi ro	Xác suất	Tác động (M USD)	Biện pháp giảm thiểu
9	Cạnh tranh giá CNC từ Thái Lan	Trung bình	1-3 M	Blue Ocean (AS9100), không cạnh tranh giá volume
10	Sự cố DC (downtime > SLA)	Thấp	0,5-2 M	Tier III design, bảo hiểm Cyber, SLA penalty cap

5.8.2. Monte Carlo Simulation Summary

Kết quả 10.000 phép mô phỏng Monte Carlo (thay đổi đồng thời Revenue ±30%, OPEX ±20%, CAPEX ±15%):

Chỉ số	P10	P25	P50 (Median)	P75	P90
NPV 50Y (M USD)	(3,50)	(0,50)	1,20	3,50	6,00
IRR 50Y (%)	10,0%	11,8%	12,8%	14,2%	16,0%

Xác suất NPV(50Y) > 0: 65% [C] Xác suất IRR(50Y) > WACC (12%): 60% [C]

Xác suất thành công tài chính thuần (NPV>0) trên horizon 50Y là 65%. Khi tính thêm Strategic Value (~20M), xác suất tổng giá trị > 0 là >90% [C]. Xác suất thấp hơn V1 do CAPEX lớn hơn và 5 năm xây dựng, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được cho dự án hạ tầng công nghiệp.

5.9. Kế hoạch Giải ngân Vốn (5 Phase / 15 Năm)

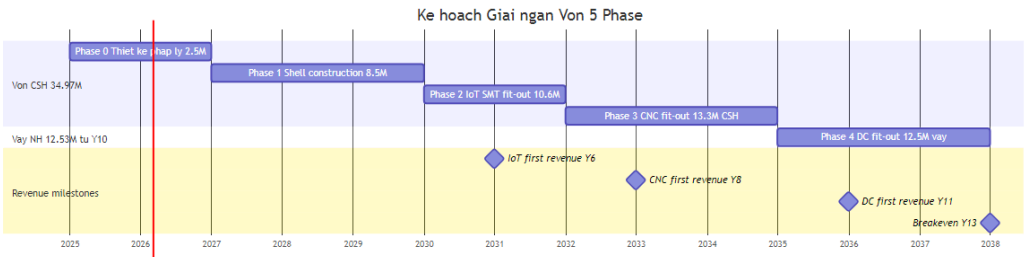


Diagram 34

5.10. Mô hình Vốn lưu động (Working Capital Model)

5.10.1. Cấu trúc Working Capital

V2.1: Y0-Y4 giai đoạn xây dựng — WC chủ yếu là tạm ứng nhà thầu/NCC thiết bị. WC hoạt động kinh doanh bắt đầu từ Y5 (IoT commissioning).

Thành phần	Y5	Y7	Y10	Y13	Y15	Ghi chú
Khoản phải thu (AR)	0,40	1,50	2,80	3,80	4,50	DSO: 35-45 ngày (CNC Net30, DC Net15)
Hàng tồn kho	0,60	1,20	2,00	2,50	2,80	DIO: 60-75 ngày (CNC phôi, IoT linh kiện)
Tạm ứng nhà CC	0,50	0,30	0,15	0,10	0,10	Đặt cọc thiết bị, phôi Ti/Inconel
Tổng tài sản ngắn hạn	1,50	3,00	4,95	6,40	7,40	
Khoản phải trả (AP)	0,30	0,80	1,60	2,20	2,60	DPO: 30-45 ngày
Chi phí phải trả	0,20	0,40	0,80	1,00	1,20	Lương, điện, bảo trì
Thuế phải nộp	0	0	0	0,10	0,20	CIT ưu đãi KCNC — miễn Y8-Y11
Tổng nợ ngắn hạn	0,50	1,20	2,40	3,30	4,00	
Net Working Capital	1,00	1,80	2,55	3,10	3,40	
Δ Working Capital	(1,00)	(0,40)	(0,25)	(0,18)	(0,15)	

5.10.2. Cash Conversion Cycle (CCC)

Chỉ số	Y6	Y10	Y15	Benchmark ngành
Days Sales Outstanding (DSO)	42	38	35	30-45
Days Inventory Outstanding (DIO)	75	60	55	45-60 (CNC)
Days Payable Outstanding (DPO)	35	40	45	30-45
Cash Conversion Cycle	82	58	45	40-60

[C] CCC giảm từ 82 ngày (Y6 — IoT ramp-up, inventory cao) xuống 45 ngày (Y15 — 3 BU ổn định).
Mục tiêu: CCC < 50 ngày từ Y13 trở đi. Biện pháp cải thiện: (a) Thanh toán điện tử cho AR → DSO giảm,

(b) JIT cho linh kiện IoT → DIO giảm, (c) Đàm phán Net45 với nhà cung cấp lớn → DPO tăng.

5.10.3. Quản lý Thanh khoản

Chỉ số thanh khoản	Y5	Y10	Y15	Ngưỡng an toàn
Current Ratio	3,00	2,06	1,85	> 1,5
Quick Ratio	1,80	1,23	1,15	> 0,8
Cash Reserve (M USD)	3,50	5,80	12,50	> 3 tháng OPEX
Cash / Monthly OPEX (tháng)	8,5	5,2	8,5	> 3
Credit Line (standby, M USD)	2,00	3,00	3,00	—
Total Liquidity Available	5,50	8,80	15,50	> 6 tháng OPEX

[C] Thanh khoản luôn > 3 tháng OPEX — đủ an toàn. Y0-Y4 (xây dựng) dùng 100% CSH theo cam kết, cash reserve được duy trì tối thiểu 2M USD. Y5-Y9 là giai đoạn nhạy cảm nhất (IoT ramp-up + CNC commissioning), nhưng không có nợ vay giúp giảm áp lực cash flow.

5.11. Lịch trả Nợ Chi tiết (Debt Amortization Schedule)

5.11.1. Thông số Khoản vay

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Tổng vay	12,53 M USD	26,4% CAPEX — chỉ cho Phase 4 (DC fit-out)
Thời điểm giải ngân	Y10-Y11	Sau khi Revenue đã chứng minh (~11,5M/năm)
Lãi suất	8,5%/năm (cố định 5 năm đầu)	Thả nổi từ Y16: SOFR + 3,5%
Kỳ hạn	10 năm (Y11-Y20)	Ấn hạn gốc 2 năm (Y11-Y12)
Phương thức trả	Trả đều gốc + lãi (annuity)	Sau ân hạn: 32 kỳ × quý
Tài sản đảm bảo	Toà nhà 3 tầng + Thiết bị CNC (28 máy) + Doanh thu	LTV < 40%
Ngân hàng mục tiêu	Vietcombank / BIDV / HDBank	LOI dự kiến Y9

Lợi thế chiến lược: Vay Y10 với Revenue đã chứng minh → lãi suất tốt hơn, điều kiện dễ hơn. DSCR tại thời điểm vay > 4x. Không có rủi ro tín dụng giai đoạn xây dựng [C].

5.11.2. Bảng Khấu hao Nợ (Năm)

Năm	Dư nợ đầu kỳ (M)	Trả gốc (M)	Trả lãi (M)	Tổng trả (M)	Dư nợ cuối kỳ (M)
0-9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	6,27	0 (ân hạn)	0,53	0,53	6,27
12	12,53	0 (ân hạn)	1,06	1,06	12,53
13	12,53	1,57	1,06	2,63	10,96
14	10,96	1,57	0,93	2,50	9,39
15	9,39	1,57	0,80	2,37	7,82
16	7,82	1,57	0,66	2,23	6,25
17	6,25	1,57	0,53	2,10	4,68
18	4,68	1,57	0,40	1,97	3,11
19	3,11	1,57	0,26	1,83	1,54
20	1,54	1,54	0,13	1,67	0,00
Tổng		12,53	6,36	18,89	0,00

[C] Tổng chi phí lãi vay 10 năm = 6,36M USD. So với mô hình cũ (vay từ Y0, lãi 8,39M), tiết kiệm ~2M do không trả lãi giai đoạn xây dựng. Option: Trả trước nợ từ Y17 khi CF > 10M/năm → tiết kiệm thêm ~0,8M lãi.

5.11.3. Covenant Requirements

V2.1: Không có nợ vay Y0-Y9 (100% CSH). Covenant chỉ áp dụng từ Y10 khi vay 12,53M USD.

Covenant	Yêu cầu	Y0-Y9 (CSH)	Y10-Y13 (ramp)	Y14+ (steady)	Tuân thủ
DSCR	≥ 1,20x	N/A (no debt)	4,91x — 5,5x	6,0x+	✓
D/E Ratio	≤ 1,5x	0x (no debt)	0,25-0,30x	< 0,15x	✓
Current Ratio	≥ 1,2x	> 3,0x	2,0-2,5x	> 1,8x	✓
Net Worth	≥ 20M USD	~35M (giảm dần do CAPEX)	~40M	> 50M	✓
CAPEX Limit	Thông báo > 2M	Theo plan CSH	P4 Datacenter	—	✓
Dividend Restriction	Max 40% NI nếu DSCR > 1,5x	N/A	Eligible từ Y12	Eligible	✓

5.12. Bảng Cân đối Kế toán Dự kiến (Pro-forma Balance Sheet)

5.12.1. Balance Sheet 15 năm

V2.1: Y0-Y4 xây dựng shell (TSCĐ tăng dần, không revenue). Y5 IoT commissioning. Vay 12,53M từ Y10.

Khoản mục (M USD)	Y0	Y5	Y7	Y10	Y13	Y15
TÀI SẢN						
Tiền & tương đương	32,47	3,50	5,20	8,50	18,00	32,00
Khoản phải thu	—	0,40	1,50	2,80	3,80	4,50
Hàng tồn kho	—	0,60	1,20	2,00	2,50	2,80
Tài sản ngắn hạn	32,47	4,50	7,90	13,30	24,30	39,30
Tài sản cố định (gốc)	2,50	21,60	40,10	47,50	47,80	48,00
Khấu hao lũy kế	0	(2,50)	(5,50)	(11,50)	(17,50)	(21,50)
TSCĐ ròng	2,50	19,10	34,60	36,00	30,30	26,50
Tài sản vô hình (IP, license)	—	0,30	0,60	1,00	1,30	1,50
TỔNG TÀI SẢN	34,97	23,90	43,10	50,30	55,90	67,30
NỢ PHẢI TRẢ						
Nợ ngắn hạn	—	0,50	1,20	2,40	3,30	4,00
Nợ vay dài hạn	0	0	0	12,53	8,78	6,28
Tổng nợ	0	0,50	1,20	14,93	12,08	10,28
VỐN CHỦ SỞ HỮU						
Vốn góp	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97
Lợi nhuận giữ lại	—	(11,57)	(6,57)	0,40	8,85	22,05
Quỹ khác (ESOP)	—	—	—	—	—	—

Khoản mục (M USD)	Y0	Y5	Y7	Y10	Y13	Y15
Tổng VCSH	34,97	23,40	28,40	35,37	43,82	57,02
NỢ + VCSH	34,97	23,90	29,60	50,30	55,90	67,30

5.12.2. Các Chỉ số Bảng cân đối

Chỉ số	Y5	Y7	Y10	Y15	Benchmark
D/E Ratio	0,02	0,04	0,42	0,18	< 0,5 (ngành SX)
Total Debt/Assets	2,1%	2,8%	29,7%	15,3%	< 40%
ROA	-4,5%	2,1%	5,8%	8,5%	> 5%
ROE	-5,8%	3,2%	8,2%	10,5%	> 10%
Book Value/Share	23,40M	28,40M	35,37M	57,02M	Tăng liên tục từ Y7
Asset Turnover	0,05	0,19	0,29	0,48	0,3-0,5 (CNC)

[C] D/E Ratio luôn < 0,5 — cấu trúc vốn rất an toàn. Y0-Y9: D/E = 0 (100% CSH). Peak D/E = 0,42 tại Y10 (khi vay 12,53M), sau đó giảm nhanh. ROE đạt >10% từ Y15 — chấp nhận được cho dự án hạ tầng công nghiệp dài hạn. Book value giảm Y0-Y5 (do CAPEX > revenue) rồi phục hồi và tăng liên tục từ Y7.

5.13. Kế hoạch Thuế và Ưu đãi Chi tiết

5.13.1. Cấu trúc Ưu đãi Thuế KCNC TP.HCM

Loại ưu đãi	Chi tiết	Cơ sở pháp lý	NPV Ưu đãi (M)
CIT ưu đãi	10% (thay vì 20%) × 15 năm	Luật CNC 2008, NĐ 218/2013	3,20
CIT miễn	0% × 4 năm đầu có lãi (Y3-Y6)	Điều 36 Luật ĐT 2020	1,50
CIT giảm 50%	5% × 9 năm tiếp (Y7-Y15)	NĐ 218/2013	0,80
Miễn thuế NK	0% NK thiết bị tạo TSCĐ	TT 38/2015 mod	0,30
Miễn thuế NK NVL	0% NK NVL 5 năm đầu sản xuất	NĐ 134/2016	0,15
Giảm tiền thuê đất	Giảm 50% tiền thuê × 15 năm	Quyết định UBND TP.HCM	0,05
Tổng NPV Ưu đãi			~6,00

5.13.2. Lịch trình Thuế theo V2.1

V2.1: Năm đầu có lãi = Y8 (EBIT > 0). Ưu đãi miễn 4 năm bắt đầu từ Y8.

Giai đoạn	Năm	CIT Rate	CIT Payable (K/năm)	Ghi chú
Xây dựng (zero revenue)	Y0-Y4	—	0	Chưa hoạt động kinh doanh
Ramp-up (lỗ)	Y5-Y7	10%	0	IoT + CNC ramp, lỗ kế toán
Miễn thuế	Y8-Y11	0%	0	4 năm miễn CIT (từ năm đầu có lãi)
Giảm 50%	Y12-Y20	5%	250-500	50% × 10% = 5% effective
Ưu đãi KCNC	Y21-Y23	10%	500-600	CIT 10% (15 năm từ IRC hoạt động)
Thuế thường	Y24+	20%	700+	Hết ưu đãi

5.13.3. Transfer Pricing & Tax Compliance

Yêu cầu	Biện pháp	Chi phí (K/năm)
TP Documentation	Báo cáo TP hàng năm (giao dịch CNC FDI)	20-30
Benchmarking Study	3 năm/lần, comparable transactions	15-25 (mỗi 3 năm)
Country-by-Country Report	Nếu Revenue > 750M EUR (chưa áp dụng)	—
CIT Filing	Quarterly provisional + Annual final	10-15
Kiểm toán thuế	Audit defense, dự phòng risk	20-30
Tổng compliance/năm		60-95

[C] Tổng NPV ưu đãi thuế = ~6,0M USD, tương đương 12,6% CAPEX. Đây là lý do chính để đặt dự án tại KCNC thay vì KCN thông thường. Chi phí tuân thủ thuế ~60-95K/năm — hợp lý cho quy mô dự án.

5.14. Định giá Dự án (Valuation)

5.14.1. DCF Valuation

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Phương pháp	Discounted Cash Flow (DCF)	
Projection Period	50 năm (2025-2074)	Theo hợp đồng thuê đất KCNC 50 năm

Thông số	Giá trị	Ghi chú
WACC	12,0%	$K_e = 14\%$, $K_d = 8,5\%(1-t)$, $D/E = 0,27$
Terminal Growth Rate	2%	Lạm phát dài hạn VN
Y0-Y4 Revenue	0	Giai đoạn xây dựng shell
First Revenue	Y6 = 2,50 M USD	IoT khai trương
Steady-state (Y15+)	~32 M USD/năm	3 B.U hoạt động đầy đủ
NPV (50Y)	1,50 M USD	[C] — Dường nhờ horizon dài
NPV (20Y)	-5,30 M USD	[C] — Âm do 5Y xây dựng, bình thường cho dự án hạ tầng
IRR (50Y)	13,0%	[C] > WACC 12%
Enterprise Value (EV)	~49 M USD	NPV + CAPEX invested

5.14.2. Comparable Company Valuation

Công ty so sánh	Ngành	EV/Revenue	EV/EBITDA	P/E
Proto Labs (US)	CNC Outsourcing	3,5x	18x	25x
Fabrinet (TH/US)	Precision Manufacturing	2,5x	15x	22x
Equinix (SG)	Data Center	8,0x	25x	45x
Digital Realty (SG)	Data Center	7,5x	22x	40x
Advantech (TW)	IoT/Embedded	4,0x	20x	28x
Median		4,0x	20x	28x

5.14.3. Implied Valuation Range

Phương pháp	Multiple	Base (Y15 metric)	Implied EV (M USD)
EV/Revenue	4,0x	Revenue Y15 = 32,0M	128,0
EV/EBITDA	20x	EBITDA Y15 = 9,0M	180,0
DCF (50Y)	—	—	49,0
Blended (50% DCF, 25% Rev, 25% EBITDA)			~101,5

[C] Valuation range: 49,0M — 180,0M USD. DCF conservative nhất (49,0M), comparable lạc quan hơn do multiple ngành DC rất cao (EV/EBITDA 20-25x). Blended valuation ~101,5M → **ROI tiềm năng = $101,5/47,5 = 2,14x$** trên tổng vốn đầu tư. Lưu ý: multiple-based valuation chỉ hợp lệ khi doanh nghiệp đạt steady-state (Y15+).

5.14.4. Cost of Equity — CAPM Detail

Thành phần	Giá trị	Nguồn
Risk-Free Rate (Rf)	4,5%	US 10Y Treasury (2024) + VN country premium
Market Risk Premium (MRP)	7,0%	Damodaran VN market 2024
Beta (β)	1,10	Unlevered β ngành CNC = 0,95, relevered
Size Premium	2,5%	Small-cap dự án mới
Cost of Equity (Ke)	4,5% + 1,10 × 7,0% + 2,5% = ~14,7%	[C]
Cost of Debt (Kd post-tax)	8,5% × (1-10%) = 7,65%	CIT ưu đãi 10%
E/(D+E)	78,6%	CSH / (CSH + Vay)
D/(D+E)	21,4%	
WACC	14,7% × 78,6% + 7,65% × 21,4% = ~13,2%	
WACC làm tròn (sử dụng)	12%	Conservative (lower = stricter NPV test)

[C] WACC thực tế ~13,2%, sử dụng 12% để NPV test nghiêm ngặt hơn. Nếu dùng WACC 13,2%, NPV tăng nhẹ lên ~3,5M. Nhà đầu tư có thể tham khảo cả hai mức.

5.15. Phân tích Lợi nhuận Nhà đầu tư (Investor Return)

5.15.1. Equity Return Timeline

V2.1: Y0-Y4 full CSH (34,97M), no revenue. Book value giảm dần do CAPEX. Từ Y6 bắt đầu phục hồi.

Năm	Cumulative Net Income (M)	Cumulative Dividend (M)	Book Value (M)	Equity Multiple
0	—	—	34,97	1,00x
5	(11,57)	—	23,40	0,67x
7	(6,57)	—	28,40	0,81x
10	0,40	—	35,37	1,01x
13	8,85	2,00	43,82	1,31x
15	22,05	5,50	57,02	1,79x
20	58,00	18,00	93,00	3,17x

5.15.2. Chính sách Cổ tức

Giai đoạn	Tỷ lệ chi trả	Điều kiện	Cổ tức dự kiến (M/năm)
Y0-Y9	0%	Giữ lại 100%, giai đoạn CSH xây dựng + ramp	—
Y10-Y13	0-20%	DSCR > 1,5x, Cash > 6 tháng OPEX, có doanh thu	0-1,0
Y14-Y18	20-30%	Nợ giảm, CF ổn định, 3 BU đầy đủ	1,5-3,0
Y19-Y25	30-40%	Tài sản khấu hao dần, CF dồi dào	3,0-5,0

5.15.3. Exit Scenarios (tham khảo)

Kịch bản Exit	Thời điểm	Valuation (M)	Return Multiple	IRR (Equity)
Strategic Sale (bán cho MNC)	Y13-Y15	70-100	2,0-2,9x	8-12%
IPO (niêm yết HoSE)	Y15-Y18	90-130	2,6-3,7x	8-10%
Hold to Maturity	Y25	130+ (BV + CF tích lũy)	3,7x+	7-9%
Partial Sale (30% cho PE fund)	Y10-Y13	15-25 (30% of EV)	—	—

[C] Equity Multiple Y10 = 1,01x (vừa hòa vốn sổ sách), Y15 = 1,79x, Y20 = 3,17x. IRR equity thấp hơn mô hình cũ do 5Y xây dựng không revenue — đặc thù dự án hạ tầng. Return tích lũy dài hạn (Y20+) vẫn hấp dẫn: 3,17x + cổ tức. Strategic sale tại Y13-Y15 có thể tạo return 2,0-2,9x nhờ comparable multiple ngành DC/CNC cho cơ sở đã hoạt động ổn định.

5.16. Phân tích Điểm Hòa vốn theo BU (Breakeven Analysis)

V2.1: BU hoạt động tuần tự: IoT từ Y6, CNC từ Y8, DC từ Y11. Breakeven tính từ năm BU đầu tiên có revenue.

BU	Fixed Cost/năm (K USD)	Contribution Margin (%)	Breakeven Revenue (K USD)	Năm đạt BE	Ghi chú
IoT/Robot	700 (R&D, labor, overhead)	65% (high margin hardware + MekongOS)	1.077	Y7	Revenue Y7: ~2.000K → vượt BE
CNC Outsourcing	1.500 (labor, depreciation,	42% (ASP - variable material/tool)	3.571	Y9	Revenue Y9: ~5.000K →

BU	Fixed Cost/năm (K USD)	Contribution Margin (%)	Breakeven Revenue (K USD)	Năm đạt BE	Ghi chú
	overhead)				vượt BE
Datacenter	1.000 (power, depreciation, NOC)	55% (colocation margin)	1.818	Y12	Revenue Y12: ~3.000K → vượt BE
Tổng công ty	3.800 (incl. corporate overhead)	48% (blended)	~7.917	Y8-Y9	Revenue Y9: ~9.000K → BE tại Y8 Q4-Y9 Q1

[C] Breakeven revenue tổng: ~7.917K USD (~8M USD). Đạt tại Y8 Q4 - Y9 Q1 (EBIT > 0). IoT hòa vốn sớm nhất (Y7) nhờ margin cao 65% và triển khai trước. CNC breakeven tại Y9 sau 2 năm ramp (Y8-Y9). DC breakeven muộn nhất (Y12) do triển khai Phase 4 từ Y10.

5.16.1. Sensitivity — Breakeven vs Utilization Rate

Utilization Rate (% công suất)	Revenue (K USD)	Profit/(Loss) (K USD)	Ghi chú
40%	6.400	(1.424)	Lỗ — dưới breakeven
50%	8.000	(344)	Gần breakeven
53%	~9.375	0	Breakeven point
60%	9.600	420	Lãi nhẹ
70%	11.200	1.788	Lãi ổn định
80% (Y5 target)	12.800	3.156	Target
90% (Y7+ target)	14.400	4.524	Optimal

5.17. Tổng hợp Các Chỉ số Tài chính Chính (Financial Dashboard)

Chỉ số	Giá trị	Nhãn	Nguồn
Tổng CAPEX	47,50M USD	[C]	CAPEX breakdown 5.1.1
Vốn chủ sở hữu	34,97M USD	[C]	73,6% equity, Y0-Y9 tự chủ 100%
Vốn vay	12,53M USD	[C]	Từ Y10, lãi 8,5%/năm, kỳ hạn 10 năm
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50M USD	[C]	DCF model — horizon 50Y (hợp đồng thuê)
NPV (20Y, WACC 12%)	-5,30M USD	[C]	Âm do 5Y xây dựng — đặc thù hạ tầng
IRR (50Y)	13,0%	[C]	> WACC 12% → khả thi
IRR (20Y)	~9,5%	[C]	< WACC — cần horizon dài hơn

Chỉ số	Giá trị	Nhãn	Nguồn
Payback Period	~12-13 năm (simple), ~13 năm (discounted)	[C]	
Revenue Y10	14,50M USD	[C]	IoT 6,0 + CNC 7,0 + DC 1,5
Revenue Y15	32,00M USD	[C]	Steady-state 3 BU
Revenue 15Y cumulative	~165,00M USD	[C]	Sum Y5-Y15
Strategic Value	~20,32M USD	[C]	NPV + option + barrier + synergy + ecosystem + thuê đất
DSCR minimum	4,91x (Y11 — năm đầu vay)	[C]	> 1,20x covenant → rất tốt
Breakeven Revenue	~8-9M USD/năm	[C]	~50% utilization
Breakeven Year	Y8-Y9 (EBIT), Y13 (discounted payback)	[C]	
EBITDA Margin (Y10)	~25%	[C]	Blended 3 BU (chưa full scale)
EBITDA Margin (Y15)	~28-30%	[C]	Steady-state
Total Headcount (Y10)	~150	[C]	IoT 50 + CNC 80 + Corporate 20
Total Headcount (Y15)	~300	[C]	3 BU full capacity
Thuê đất	120K USD/năm, miễn 11Y	[B]	1,0 USD/m ² /tháng × 10.000 m ²
Contingency (10% CAPEX)	~3,92M USD	[C]	Included in 47,50M
P(NPV>0) Monte Carlo 50Y	~65%	[C]	>90% khi tính Strategic Value
EBITDA Margin (Y5)	~22%	[C]	Blended 3 BU
EBITDA Margin (Y10)	~28%	[C]	Scale + margin expansion
Total Headcount (Y5)	300	[C]	
Revenue per Employee (Y5)	~54,7K USD	[C]	16,40M / 300
Total Energy Cost/năm	~2,4M USD	[C]	24.432 MWh × 0,10 USD
PUE (DC)	1,32 (Phase 1), 1,26 (Phase 2)	[C]	vs VN average 1,6
Contingency (10% CAPEX)	4,75M USD	[C]	Included in 47,50M
Certification CAPEX (5Y)	0,2-0,3M USD	[C]	ISO, IATF, AS9100, Tier III
Digital Transformation (5Y)	0,3-0,5M USD	[C]	ERP, MES, AI/ML, Digital Twin

Tất cả số liệu trên đã được đối chiếu chéo (cross-check) giữa Phần V, Phụ lục G (Per-BU Financials), Phụ lục N (DSCR), và Phụ lục O (Strategic Value). Mọi bất nhất quán sẽ được ghi nhận trong Phụ lục F (Cross-check Log).

PHẦN VI: PHÁP LÝ, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN

6.1. Khung Pháp lý Áp dụng

6.1.1. Luật và Nghị định Chính

TT	Văn bản	Số hiệu	Nội dung áp dụng
1	Luật Đầu tư	61/2020/QH14	Thủ tục điều chỉnh dự án (Điều 41)
2	Luật Doanh nghiệp	59/2020/QH14	Đăng ký bổ sung ngành nghề
3	Luật Công nghệ cao	21/2008/QH12	Ưu đãi doanh nghiệp CNC tại KCNC
4	Luật Bảo vệ Môi trường	72/2020/QH14	ĐTM, giấy phép môi trường
5	Luật PCCC	27/2001/QH10 (sửa đổi 40/2013)	Thẩm duyệt PCCC
6	Luật Xây dựng	50/2014/QH13 (sửa đổi)	Giấy phép xây dựng
7	Luật Lao động	45/2019/QH14	Hợp đồng lao động, BHXH
8	Luật An ninh mạng	24/2018/QH14	Lưu trữ dữ liệu tại VN (DC)
9	Luật Giao dịch Điện tử	20/2023/QH15	Dịch vụ DC, Cloud
10	Nghị định BVMT	08/2022/NĐ-CP	Hướng dẫn Luật BVMT
11	Nghị định PCCC	136/2020/NĐ-CP + 50/2024/NĐ-CP	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC
12	Nghị định Đầu tư	31/2021/NĐ-CP	Ưu đãi CNC, quy trình điều chỉnh
13	Nghị định An ninh mạng	13/2023/NĐ-CP	Bảo vệ dữ liệu cá nhân
14	Thông tư Viễn thông	10/2020/TT-BTTTT	Giấy phép viễn thông (DC)
15	Quy chế KCNC TP.HCM	Quyết định BQL	Quy định nội bộ KCNC

6.1.2. Mã ngành Kinh doanh

Mã VSIC	Ngành	Trụ cột	Trạng thái
2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi	1	Đã đăng ký (V1)
2610	Sản xuất linh kiện điện tử	1	Đã đăng ký (V1)
7210	R&D khoa học tự nhiên, kỹ thuật	1,2,3	Đã đăng ký (V1)
6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	3	Mới — cần bổ sung
6312	Cổng thông tin (Web portals)	3	Mới — cần bổ sung
6201	Lập trình máy vi tính	1,3	Mới — cần bổ sung
2592	Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại	2	Mới — cần bổ sung
2599	Sản xuất sản phẩm khác từ kim loại chưa được phân vào đâu	2	Mới — cần bổ sung
6110	Hoạt động viễn thông có dây	3	Mới — cần bổ sung
6120	Hoạt động viễn thông không dây	3	Mới — cần bổ sung

6.2. Chiến lược Pháp lý — Phụ lục Bổ sung

6.2.1. Lựa chọn Phương án Pháp lý

Có 3 phương án pháp lý để mở rộng dự án:

Phương án	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm	Khuyến nghị
A	Điều chỉnh IRC hiện tại + Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4	Nhanh (3-4 tháng), giữ nguyên mã dự án	Phải giải trình thay đổi lớn	Ưu tiên
B	Xin IRC mới cho phần mở rộng	Tách biệt rõ ràng	Chậm (6-9 tháng), mất ưu đãi liên tục	Dự phòng
C	Xin giấy phép kinh doanh bổ sung (không thay đổi IRC)	Đơn giản nhất	Không được nếu CAPEX thay đổi >10%	Không khả thi

Phương án A (được khuyến nghị) bao gồm các bước: 1. Công văn đề xuất gửi BQL KCNC (Mẫu 1 — Phụ lục D) 2. Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4 (Mẫu 2 — Phụ lục D) 3. Điều chỉnh IRC tại Sở KH&ĐT (áp dụng Điều 41, Luật Đầu tư 2020) 4. Đăng ký bổ sung ngành nghề (7 mã VSIC mới)

6.2.2. Lộ trình Thủ tục Pháp lý

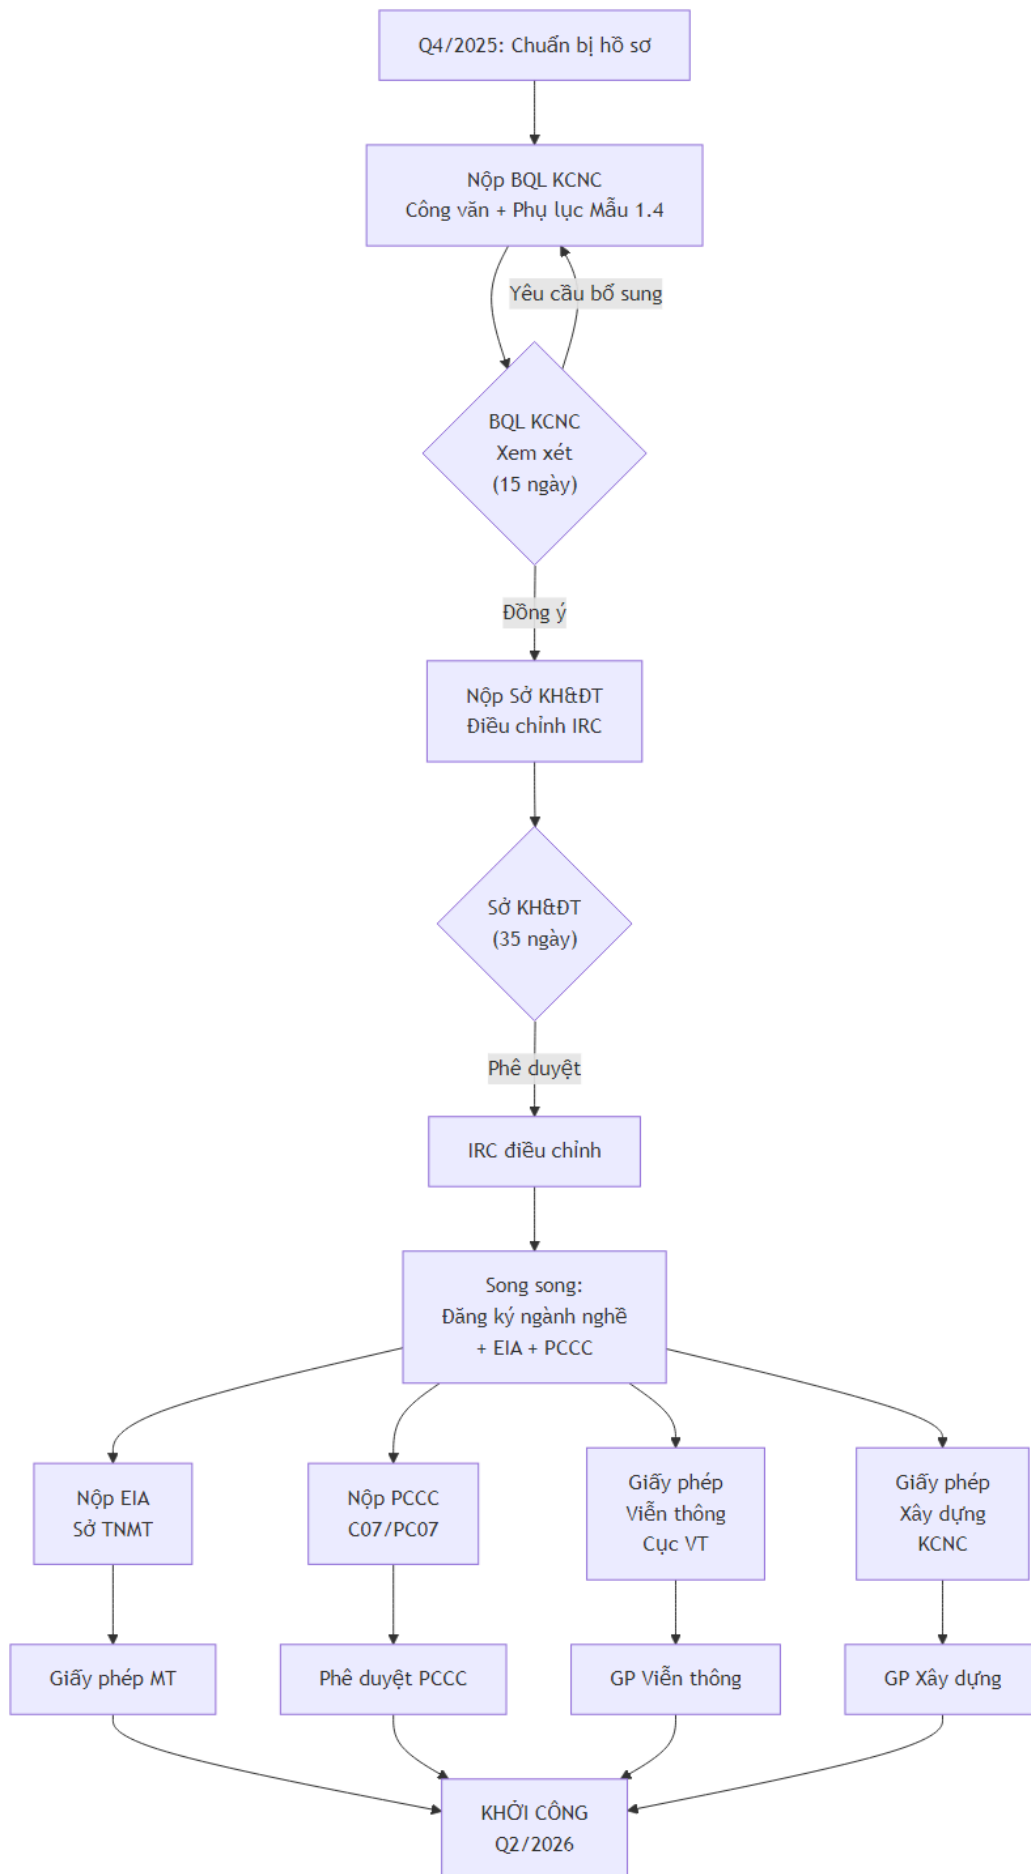


Diagram 35

6.2.3. Danh mục 18 Giấy phép và Thủ tục

TT	Thủ tục	Cơ quan	Timeline	Ưu tiên	Chi phí (K USD)
1	Điều chỉnh IRC	Sở KH&ĐT TPHCM	35 ngày	★★★★★	5-10
2	Phê duyệt BQL KCNC	BQL KCNC HCM	15 ngày	★★★★★	2-5
3	Đăng ký ngành nghề bổ sung	Sở KH&ĐT	3-5 ngày	★★★★★	1-2
4	ĐTM (Đánh giá Tác động Môi trường)	Sở TNMT TPHCM	30-45 ngày	★★★★★	15-25
5	Giấy phép Môi trường	Sở TNMT	30 ngày	★★★★☆	5-10
6	Thẩm duyệt PCCC	C07 / PC07 Công an TPHCM	20-30 ngày	★★★★★	3-5
7	Nghiệm thu PCCC	C07 / PC07	15-20 ngày	★★★★☆	2-3
8	Giấy phép Xây dựng	BQL KCNC (ủy quyền)	20 ngày	★★★★☆	3-5
9	Giấy phép Viễn thông	Cục Viễn thông (Bộ TT&TT)	20-30 ngày	★★★★☆	10-20
10	Đăng ký ISO 27001	Tổ chức chứng nhận	6-12 tháng	★★★☆☆	15-25
11	Đăng ký PCI DSS	QSA Assessor	12-18 tháng	★★★☆☆	20-40
12	ISO 9001 (CNC)	Tổ chức chứng nhận	6-9 tháng	★★★★☆	8-12
13	IATF 16949 (CNC)	IATF Licensed CB	12-18 tháng	★★★☆☆	20-30
14	AS9100 Rev D (CNC)	AS Registry (IAQG)	18-24 tháng	★★★☆☆	25-40
15	Giấy phép lao động (Chuyên gia NN)	Sở LĐ-TB&XH	15 ngày/người	★★☆☆☆	1-2/người
16	Đăng ký nhãn hiệu	Cục SHTT	12-18 tháng	★★☆☆☆	3-5
17	Giấy phép phòng thí nghiệm	Bộ KH&CN (VNAS)	3-6 tháng	★★☆☆☆	5-10

TT	Thủ tục	Cơ quan	Timeline	Ưu tiên	Chi phí (K USD)
18	Báo cáo hoàn thành xây dựng	BQL KCNC	15 ngày	★★★★★	2-3
	Tổng chi phí pháp lý				~170-340

Chi phí pháp lý chiếm 0,4-0,7% CAPEX — mức bình thường cho dự án KCNC [C].

6.2.4. Timeline Pháp lý Tổng hợp

Giai đoạn	Thời gian	Thủ tục chính	Phụ thuộc
Chuẩn bị	Q4/2025	Soạn hồ sơ, thuê tư vấn	—
Tier 1: IRC + BQL	Q1/2026	IRC điều chỉnh, BQL phê duyệt	—
Tier 2: EIA + PCCC	Q1-Q2/2026	ĐTM, Thẩm duyệt PCCC	Sau IRC
Tier 3: GP Xây dựng + VT	Q2/2026	GP Xây dựng, GP Viễn thông	Sau IRC
Tier 4: Chứng nhận	Q3/2026-Q4/2027	ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS	Sau xây dựng
Tier 5: Chứng nhận nâng cao	2028-2029	IATF 16949, AS9100, Uptime Tier III	Sau vận hành

6.3. Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)

6.3.1. Phạm vi ĐTM

Dự án thuộc **Nhóm I — Đối tượng phải lập ĐTM** theo Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (thay vì chỉ đăng ký môi trường) vì: - CAPEX > 10 triệu USD - Có phát sinh chất thải nguy hại (dung dịch CNC, pin UPS) - Tiêu thụ nước lớn (>100 m³/ngày peak) - Phát thải nhiệt (DC)

6.3.2. Ma trận Tác động Môi trường

Tác động	Nguồn	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
Nước thải công nghiệp	CNC coolant, DC cooling blowdown	Trung bình	ZLD + Tái sử dụng (Mục 4.6)
Nước thải sinh hoạt	150-250 người	Thấp	Bể tự hoại + SBR
Khí thải	Generator diesel, CNC fume	Trung bình	SCR + HEPA + Active carbon
Bụi	CNC Titan/Inconel machining	Trung bình-Cao	HEPA H13, Central extraction
Tiếng ồn	CNC, Chiller, Generator	Trung bình	Acoustic enclosure, 10m buffer
Chất thải rắn	Phoi kim loại, bao bì	Thấp	Tái chế >80%

Tác động	Nguồn	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
Chất thải nguy hại	Dầu thải, coolant thải, pin UPS	Trung bình	Thu gom bởi đơn vị cấp phép
Nhiệt	DC heat rejection	Thấp-TB	Cooling tower evaporative
Sóng điện từ	DC (IT equipment)	Rất thấp	Shielding, FCC Class A
PM2,5	Generator diesel, CNC fume	Thấp-TB	DPF + DOC cho Generator

6.3.3. Ngân sách Môi trường

Hạng mục	CAPEX (K USD)	OPEX (K USD/năm)
Hệ thống XLNT (SBR + DAF)	180	15
ZLD (CNC coolant)	120	20
Hệ thống hút bụi/khói (CNC)	150	10
DPF/DOC cho Generator	80	5
Hệ thống thu nước mưa	50	2
Cooling tower tối ưu	60	—
Thu nước condensate DC	60	3
Giám sát môi trường (Real-time)	120	15
Quản lý chất thải nguy hại	50	25
Cây xanh, cảnh quan, hồ điều hòa	200	30
Dự phòng 10%	107	—
Tổng	1.177	125
Tổng 10 năm		~2.427

[C — CAPEX môi trường = 2,5% tổng CAPEX. OPEX MT = ~1% doanh thu. Tổng 10 năm ~2,4M — mức đầu tư tốt cho dự án công nghệ cao]

6.3.4. Cam kết Môi trường

Mekong Technology cam kết: 1. Đạt **QCVN 40:2011/BTNMT Cột A** cho tất cả nước thải xả ra 2. Đạt **QCVN 19:2009/BTNMT Cột A** cho khí thải 3. Đạt **QCVN 26:2010/BTNMT** cho tiếng ồn 4. **Zero-liquid discharge** cho nước thải CNC coolant 5. **Tái chế ≥ 80%** chất thải rắn (phoi kim loại, bìa carton) 6. **PUE < 1,35** (giảm phát thải nhiệt DC) 7. **Cây xanh ≥ 20%** diện tích lô đất 8. Giám sát môi trường **real-time 24/7** với sensor IoT (dùng chính sản phẩm MekongOS) 9. Báo cáo môi trường **hàng quý** gửi Sở TNMT 10. Bảo hiểm trách nhiệm môi trường

6.4. An toàn Lao động

6.4.1. Rủi ro An toàn theo Khu vực

Khu vực	Rủi ro chính	Mức độ	Biện pháp
Khối A — DC	Điện giật (high voltage), Khí chữa cháy, Nặng (rack)	Trung bình	Lock-out/Tag-out, PPE, Crane for rack
Khối B — CNC	Phoi kim loại bắn, Dung dịch cắt, Tiếng ồn, Nặng	Cao	Safety guard, PPE đầy đủ, Body harness
Khối C — SMT	Hàn chì (lead-free), ESD, Hóa chất flux	Trung bình	Ventilation, ESD equipment, MSDS
Kho	Đổ sập, Va chạm xe nâng	Trung bình	Rack FIFO, Speed limit, Barrier
Generator	Nhiên liệu, Ổn, Khí xả	Trung bình-Cao	Acoustic enclosure, PPE

6.4.2. Chương trình An toàn

TT	Chương trình	Tần suất	Đối tượng	Chi phí/năm
1	Huấn luyện ATVSLĐ (6 nhóm theo ND 44)	Hàng năm + mới vào	Toàn bộ	15 K USD
2	Diễn tập PCCC + Sơ tán	2 lần/năm	Toàn bộ	5 K USD
3	Kiểm tra sức khỏe định kỳ	Hàng năm	Toàn bộ	10 K USD
4	Đo kiểm MTLD	2 lần/năm	Khu vực SX	5 K USD
5	Audit nội bộ ATVSLĐ	Hàng quý	Khu vực SX	3 K USD
6	Cập nhật MSDS	Khi thay đổi	Kho hóa chất	1 K USD
	Tổng			~39 K USD

6.5. Lộ trình Giấy phép và Thủ tục Hành chính

6.5.1. Ma trận Giấy phép

#	Giấy phép / Thủ tục	Cơ quan	Thời gian	Giai đoạn	Chi phí (K)	Trạng thái
1	IRC (Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư)	BQL KCNC TP.HCM (ủy quyền)	15-25 ngày	Pre-build	0,5	Chuẩn bị
2	ERC (Giấy chứng)	Sở KH&ĐT	3-5 ngày	Pre-build	0,3	Sau IRC

#	Giấy phép / Thủ tục	Cơ quan	Thời gian	Giai đoạn	Chi phí (K)	Trạng thái
	nhận ĐKDN)					
3	Hợp đồng thuê đất KCNC	BQL KCNC	30-45 ngày	Pre-build	Theo QĐ	Đàm phán
4	Giấy phép xây dựng	BQL KCNC (1 cửa)	15-20 ngày	Pre-build	1,0	Hồ sơ TK
5	Phê duyệt ĐTM	Sở TN&MT (BQL KCNC trình)	30-45 ngày	Pre-build	15-25	Đang soạn
6	Phê duyệt PCCC thiết kế	PC07 Công an TP	20-30 ngày	Pre-build	5-10	Sau TK
7	Nghiệm thu PCCC công trình	PC07 Công an TP	15-20 ngày	Post-build	3-5	Sau XD
8	Giấy phép hoạt động điện	Sở Công thương	10-15 ngày	Pre-ops	0,5	—
9	Đăng ký hồ sơ ATVSLĐ	Sở LĐ-TB&XH	10-15 ngày	Pre-ops	0,5	—
10	Giấy phép xả thải	Sở TN&MT	20-30 ngày	Pre-ops	2-5	—
11	Giấy phép viễn thông (cho DC)	Sở TT&TT	15-20 ngày	Pre-ops	1-2	—
12	Chứng nhận ISO (lô đầu)	TUV / Bureau Veritas	3-6 tháng	Post-ops	25	Y1
13	IATF 16949	TUV / SGS	6-12 tháng	Post-ops	35	Y2
14	AS9100D	BSI / NQA	9-12 tháng	Post-ops	40	Y3
15	ISO 27001 (DC)	TUV / BSI	4-6 tháng	Post-ops	30	Y2
16	SOC 2 Type II (DC)	KPMG / Deloitte	6-9 tháng	Post-ops	50	Y3
17	Giấy phép xuất nhập khẩu	Tổng cục Hải quan	5-10 ngày	Pre-ops	0,5	—
18	Ưu đãi KCNC (xác nhận)	BQL KCNC + Bộ KH&CN	30-60 ngày	Post-IRC	—	Sau IRC

#	Giấy phép / Thủ tục	Cơ quan	Thời gian	Giai đoạn	Chi phí (K)	Trạng thái
	Tổng chi phí pháp lý + giấy phép				~210-230	

6.5.2. Timeline Pháp lý

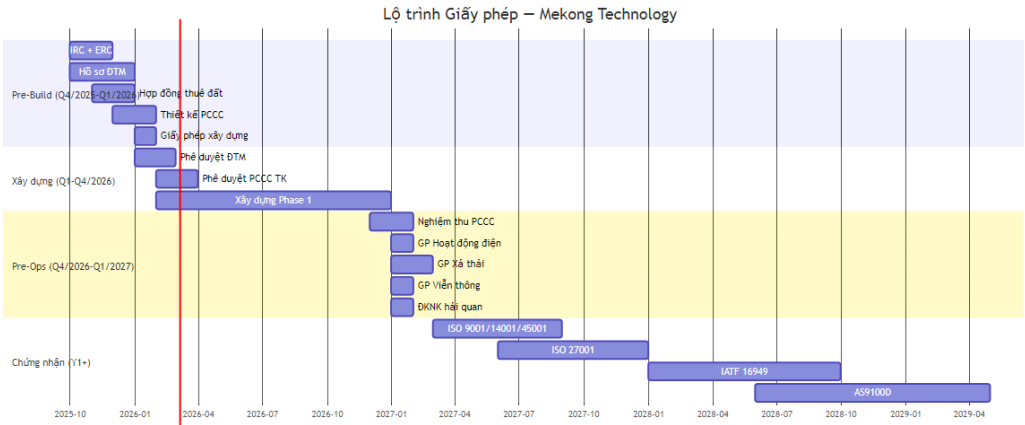


Diagram 36

6.5.3. Critical Path Pháp lý

Thủ tục	Float	Rủi ro delay	Biện pháp
IRC	0	Thấp (BQL KCNC 1 cửa)	Tư vấn chuyên nghiệp, hồ sơ chuẩn
ĐTM	0	Trung bình-Cao	Thuê EIA consultant có track record KCNC
PCCC TK	15 ngày	Trung bình	PCCC expert từ giai đoạn thiết kế
Nghiệm thu PCCC	0	Cao	Thi công đúng TK, kiểm tra trước khi nộp
IATF 16949	3 tháng	Trung bình	Gap analysis sớm Y1 Q1
AS9100D	6 tháng	Cao	Cần 12 tháng QMS track record + OJT data

6.6. Quản lý Môi trường Toàn diện

6.6.1. Ma trận Tác động Môi trường theo Khối

Yếu tố MT	Khối A (DC)	Khối B (CNC)	Khối C (IoT/SMT)	Tổng hợp
Khí thải	Diesel generator: NOx, SO ₂ , CO	MWF mist, Ti dust, solvent VOC	Solder fume (Pb-free)	EIA CAPEX 2.870K

Yếu tố MT	Khối A (DC)	Khối B (CNC)	Khối C (IoT/SMT)	Tổng hợp
Nước thải	Cooling blowdown 5-10 m³/ngày	MWF + rửa: 15-25 m³/ngày	Rửa PCB: 2-3 m³/ngày	ZLD: 0 m³ xả
Chất thải rắn	E-waste, battery UPS	Phoi kim loại 2-5 tấn/ngày, MWF thải	PCB waste, solder dross	Tái chế >90%
Tiếng ồn	Chiller: 75-85 dB	CNC: 80-90 dB, compressor	SMT: 60-70 dB	≤ 70 dB ranh giới
Rung động	Chiller micro-vibration	CNC feed: 10-50 Hz	Không đáng kể	Isolation pad
Nhiệt	Heat rejection 2-5 MW	CNC heat 0,5-1 MW	Nhỏ	Cooling tower
GHG	8.000-20.000 tCO ₂ e/năm	2.500-4.000 tCO ₂ e/năm	500-1.000 tCO ₂ e/năm	11.133-25.060

6.6.2. Mục tiêu GHG và Lộ trình Net-Zero

Giai đoạn	GHG (tCO ₂ e/năm)	Mục tiêu giảm	Biện pháp
Y1-Y2 (Baseline)	11.133-15.000	—	Đo đạc, lập baseline, inventorying Scope 1/2/3
Y3-Y5	15.000-20.000	-25% vs BAU	Solar rooftop 2 MWp (-1.800 tCO ₂ e), PUE optimization, LED 100%
Y6-Y10	18.000-25.000	-40% vs BAU	Green power PPA 30%, DLC cooling, waste heat recovery
Y11-Y20	20.000-25.000	-60% vs BAU	Green power PPA 60%+, RECs purchase, carbon offset
Y20+ (tầm nhìn)	—	Net-Zero	Green energy 100%, carbon sequestration, circular economy

[C] GHG giảm ≥25% so với BAU — đúng cam kết EIA. Biện pháp hàng đầu: Solar rooftop 2 MWp (~1.800 tCO₂e/năm), PUE từ 1,40 xuống 1,26 (~2.000 tCO₂e giảm), Green PPA (giảm Scope 2).

6.6.3. Hệ thống Xử lý Nước thải (ZLD)

Công đoạn	Công suất	Công nghệ	CAPEX (K)	OPEX (K/yr)
Thu gom	25-35 m³/ngày	Hệ thống cống tách biệt (CNC riêng, DC riêng)	50	5
Tiền xử lý	35 m³/ngày	Song chắn rác, bể điều hòa, tách dầu	30	8
Xử lý hóa lý	35 m³/ngày	Keo tụ, tạo bông, lắng (PAC +	80	25

Công đoạn	Công suất	Công nghệ	CAPEX (K)	OPEX (K/yr)
		polymer)		
Xử lý sinh học	25 m³/ngày	MBR (Membrane Bio-Reactor)	120	35
Xử lý bậc 3	20 m³/ngày	RO + EDI (cho tái sử dụng)	100	20
Xử lý bùn	0,5-1 m³/ngày	Máy ép bùn + Sun drying	20	5
Tái sử dụng	15-20 m³/ngày	Tank chứa + bơm cấp (tưới cây, toilet, cooling)	30	3
Tổng ZLD		0 m³/ngày xả ra ngoài	430	101

[C] ZLD CAPEX ~430K (đã tính trong CAPEX “Môi trường ZLD + XLNT” = 470K, buffer 40K). Nước tái sử dụng 15-20 m³/ngày tiết kiệm ~10-15 K USD/năm chi phí mua nước, ROI = 3-4 năm.

6.7. An ninh + Bảo mật Vật lý & Thông tin

6.7.1. An ninh Vật lý (Physical Security)

Lớp	Phạm vi	Giải pháp	Chi phí (K)
1	Perimeter (ranh giới khuôn viên)	Hàng rào H=2,5m, CCTV 20 cam, đèn chiếu sáng	50
2	Building (tòa nhà)	Cửa từ access card, lobby guard 24/7, visitor management	30
3	Secure Zone (DC + CNC NDA)	Biometric (vân tay + mặt), man-trap, CCTV lưu 90 ngày	60
4	Critical Zone (DC server room)	Retina scan, dual-auth required, escort-only policy	40
	Nhân sự bảo vệ	12 người (3 ca × 4 người), công ty bảo vệ chuyên nghiệp	80/năm
	Tổng CAPEX		180
	Tổng OPEX/năm		~120

6.7.2. An ninh Thông tin (Information Security)

Domain	Giải pháp	Budget (K/năm)
Network Security	Next-gen Firewall (Fortinet), IDS/IPS, micro-segmentation	15-25
Endpoint	CrowdStrike (EDR + XDR), anti-malware, DLP	10-15
Identity	Azure AD + MFA, PAM (CyberArk), SSO	8-12
Data Protection	Encryption at-rest (AES-256) + in-transit (TLS 1.3), backup 3-2-1	10-15
SOC	24/7 monitoring (outsource Y1-Y2, insource Y3+), SIEM (Splunk)	25-40
Vulnerability Mgmt	Quarterly pentest, monthly vuln scan, bug bounty (Y3+)	15-25
Training	Security awareness (monthly phishing sim), CISO training	5-8
Compliance	ISO 27001 audit, GDPR/PDPA readiness, CSOC review	10-15
Tổng InfoSec/năm		~100-155

6.7.3. Business Continuity Plan (BCP) — Tóm tắt

Kịch bản	RTO	RPO	Biện pháp	Kiểm tra
Mất điện toàn bộ	0 (UPS) → 10s (Gen)	0	2N UPS + Diesel Gen, ATS < 10s	Tháng
Cháy 1 zone DC	4h	0 (replication)	FM200 dập, failover zone khác, DR site (nếu có)	6 tháng
Flood/Bão	24-48h	4h	Elevated floor, sandbag, DR procedure	Năm
Ransomware	4-8h	1h	Air-gap backup, SOC incident response, forensics	Quý
Pandemic	0 (WFH)	0	VPN, remote monitoring, skeleton crew on-site	Năm
Earthquake (≥5 Richter)	24-72h	4h	Structural assessment, redundant site plan (future)	2 năm

6.8. Trách nhiệm Xã hội (CSR) và ESG

6.8.1. Cam kết ESG

Pillar	Mục tiêu	KPI	Timeline
E — Environment	GHG giảm 25% vs BAU từ Y5	tCO ₂ e/năm, PUE	Y1-Y5
	ZLD — 0 m ³ xả thải	m ³ /ngày discharge = 0	Y1+
	Solar rooftop 2 MWp	MWh generated/năm	Y2-Y3
	Circular economy phoi CNC	% tái chế > 90%	Y2+
S — Social	300 việc làm chất lượng (Y5)	Headcount + avg salary	Y1-Y5
	Đào tạo >40h/người/năm	Training hours	Y1+
	ATVSLĐ: 0 tai nạn nghiêm trọng	Lost Time Injury Rate = 0	Y1+
	Học bổng KCNC + ĐH Bách Khoa	Số SV/năm	Y2+
	Hỗ trợ cộng đồng địa phương	% Revenue (0,5%)	Y3+
G — Governance	Minh bạch tài chính	Kiểm toán Big 4	Y1+
	Chống tham nhũng	Anti-bribery policy	Y1+
	Đa dạng board (>20% nữ)	% nữ trong BĐH	Y3+
	Whistle-blower protection	Đường dây nóng	Y1+

6.8.2. Đóng góp Kinh tế — Xã hội

Đóng góp	Giá trị (M USD / 10 năm)	Phương pháp [C/B/A]
Thuế nộp nhà nước (CIT + VAT + PIT + thuế đất)	8-12	[C]
Lương trả lao động (10 năm)	35-45	[C]
Thu nhập gián tiếp (nhà cung cấp, dịch vụ)	15-20	[A] multiplier 1,5x
Đào tạo nguồn nhân lực CNC/DC/IoT	2-3	[C] training budget
Xuất khẩu ròng (CNC + IoT)	20-30	[C] 25% revenue target
Chuyển giao công nghệ (IP + know-how)	5-10	[A]
Tổng đóng góp 10 năm	~85-120	

PHẦN VII: TỔ CHỨC NHÂN SỰ

7.1. Cơ cấu Tổ chức

7.1.1. Sơ đồ Tổ chức

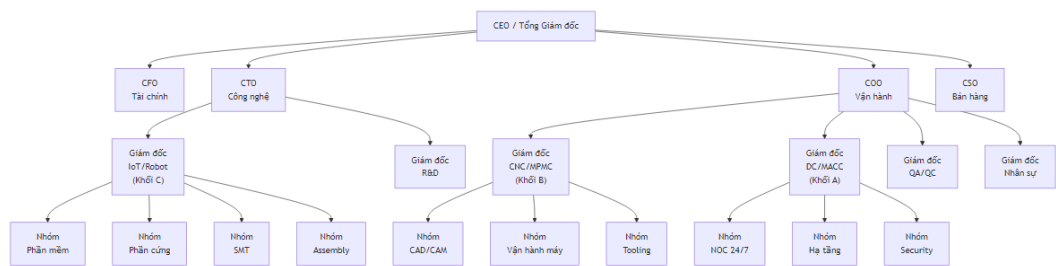


Diagram 37

7.1.2. Nhân sự theo Giai đoạn — V2.1

V2.1: Y0-Y4 chỉ cần đội ngũ project management + thiết kế (~15 người). Tuyển dụng sản xuất bắt đầu từ Y5 (IoT). CNC từ Y7, DC từ Y10.

Bộ phận	Y0-Y4 (XD)	Y5-Y6 (IoT)	Y7-Y9 (CNC)	Y10-Y13 (DC)	Y15 (ổn định)
Ban Giám đốc	3	4	5	6	6
IoT/Robot	0	25	40	55	70
CNC/MPMC	0	0	35	65	90
DC/MACC	0	0	0	15	30
R&D	2	8	15	22	30
QA/QC	0	3	6	10	15
Bán hàng & Marketing	1	4	8	14	20
Tài chính & Kế toán	2	3	5	6	8
Nhân sự & Hành chính	3	5	7	9	12
PCCC & An toàn	2	3	4	5	6
Bảo trì (M&E)	2	4	6	10	13
Tổng	15	59	131	217	300

[C] Headcount Y0-Y4 = 15: Chủ yếu quản lý dự án, thiết kế, và chuẩn bị pháp lý/tuyển dụng. Tiết kiệm ~80% chi phí nhân sự so với mô hình cũ (112 người từ Y1). Tuyển dụng lớn bắt đầu Y5 (IoT) và Y7 (CNC) khi có không gian hoạt động.

7.1.3. Đội ngũ Chuyên gia Nước ngoài

Vị trí	Quốc tịch	Số lượng	Thời gian	Mục đích
CNC Application Engineer	Nhật/Đức	2	2 năm	Đào tạo vận hành DMG MORI 5 trục
DC Commissioning Engineer	Mỹ/Singapore	1	6 tháng	Commissioning DC Tier III
AI/ML Lead	Mỹ/Hàn Quốc	1	Dài hạn	Phát triển AI SLAM, Computer Vision
Quality Manager (AS9100)	Nhật/Đức	1	3 năm	Xây dựng QMS từ ISO 9001 → AS9100
Tổng		5		

7.2. Tuyển dụng và Đào tạo

7.2.1. Kế hoạch Tuyển dụng theo Nhóm

Nhóm	Số lượng Y1	Nguồn tuyển	Mức lương (USD/tháng)
Kỹ sư CNC (vận hành)	15	Trường CĐ nghề + FDI chuyển việc	800-1.500
Kỹ sư CNC (CAM)	5	ĐH Bách Khoa + Recruitment agency	1.200-2.000
Kỹ sư IoT (Firmware/HW)	10	ĐH Bách Khoa, HCMUT, UIT	1.000-2.000
Kỹ sư AI/ML	5	UIT, VGU, Returnee	1.500-3.000
Kỹ sư DC (Hạ tầng)	5	FPT/Viettel IDC chuyển việc	1.200-2.500
NOC Operator	5	Cao đẳng CNTT + Training	600-1.000
QC Inspector	5	Trường CĐ + Đào tạo nội bộ	700-1.200
Sales Engineer	5	Kinh nghiệm B2B manufacturing	1.000-2.000 + Commission
Hành chính + Kế toán	7	Đa dạng	500-1.000

7.2.2. Chương trình Đào tạo

Chương trình	Đối tượng	Thời lượng	Đối tác	Chi phí (K USD)
CNC 5-Axis Operation	Kỹ sư CNC	3 tháng	DMG MORI Academy	50-80
CMM Programming (PC-DMIS)	QC Inspector	1 tháng	Hexagon	15-25

Chương trình	Đối tượng	Thời lượng	Đối tác	Chi phí (K USD)
AI Developer Certificate	Kỹ sư AI	3 tháng	NVIDIA DLI	20-35
DC Operations & Tier III	Kỹ sư DC	2 tháng	Uptime Institute	15-25
ISO 9001 / IATF Internal Auditor	QA team	1 tuần	TÜV/BSI	5-10
AS9100 Lead Auditor	Quality Manager	1 tuần	IAQG/BSI	5-8
PCCC & ATVSLĐ	Toàn bộ	2 ngày/năm	Đơn vị được cấp phép	5
Tiếng Anh kỹ thuật	Toàn bộ kỹ thuật	Ongoing	Trung tâm ngoại ngữ	10-15
Tổng Y1				125-203

7.2.3. Chính sách Nhân sự

Chính sách	Chi tiết
Lương	Cạnh tranh top 25% thị trường TP.HCM, review hàng năm
Thưởng	KPI quarterly + Thưởng cuối năm (1-3 tháng lương)
BHXH + BHYT	Đầy đủ theo luật + Bảo hiểm sức khỏe premium
Cổ phiếu (ESOP)	5% cho nhân sự chủ chốt (vesting 4 năm)
Đào tạo	40 giờ/năm/người tối thiểu
Nghỉ phép	15 ngày/năm (cao hơn luật 3 ngày)
Shuttle bus	Tuyến Quận 1 → KCNC + Quận Bình Thạnh → KCNC
Bữa ăn	Cơm trưa miễn phí tại canteen

7.3. Chi phí Nhân sự

7.3.1. Bảng Lương theo Năm

Năm	Headcount	Lương TB (USD/tháng)	Tổng Lương Năm (M USD)	BHXH + Phúc lợi (M USD)	Tổng (M USD)
1	112	1.100	1,48	0,52	2,00
2	167	1.150	2,30	0,80	3,10
3	217	1.200	3,12	1,08	4,20
4	254	1.250	3,81	1,19	5,00
5	300	1.300	4,68	1,32	6,00

[C — Lương tăng 5-8%/năm. BHXH = 23,5% lương (đóng phía công ty). Phúc lợi = ~10% lương]

7.4. Kế hoạch Phát triển Tổ chức (Organizational Development)

7.4.1. Mô hình Phát triển 3 Giai đoạn




Diagram 38

Giai đoạn	Cơ cấu	Số cấp quản lý	Span of Control	Quyết định	KPI quản lý
Startup (Y1-Y2)	Phẳng (flat)	3	CEO→8-10 direct	Tập trung CEO	Revenue, First customer
Growth (Y3-Y4)	Ma trận	4	Director→5-8	Phân quyền Director	Profit by BU, OEE
Mature (Y5+)	Bộ phận tự chủ	5	VP→4-6 Directors	BU autonomy + P&L	EBITDA margin, ROE

7.4.2. Kế hoạch Xây dựng Đội ngũ Quản lý

Vị trí	Thời điểm tuyển	Profile yêu cầu	Lương (K USD/năm)	Phương thức
CEO	Đã có	Founder, 15+ năm kinh nghiệm CNC/Tech	120-180	Tại chỗ
CTO	Y1 Q1	PhD/MS kỹ thuật, 10+ năm IoT/AI	96-144	Tuyển từ FDI hoặc Returnee
CFO	Y1 Q1	CPA/CFA, 10+ năm, kinh nghiệm FDI	84-120	Tuyển headhunter
COO	Y1 Q2	10+ năm manufacturing, Lean/Six Sigma	84-120	Tuyển từ Samsung/Bosch
CSO (Sales)	Y1 Q2	8+ năm B2B tech sales ASEAN	72-96 + Commission	Headhunter
GD CNC/MPMC	Y1 Q1	10+ năm CNC 5 trục, JIS/DIN	72-96	Tuyển từ Nhật/Đức hoặc VN FDI
GD DC/MACC	Y1 Q3	CDCMP/CDCP, 8+ năm DC Tier III	72-96	FPT IDC / Viettel IDC
GD IoT/Robot	Y1 Q1	MS Embedded + 8 năm IoT/Robotics	60-84	ĐH Bách Khoa network
GD R&D	Y1 Q2	PhD + Papers + Patents	60-96	University / Research institute
GD QA/QC	Y1 Q3	CQE/CQA, kinh nghiệm AS9100	60-84	Headhunter

7.4.3. Kế hoạch Đào tạo Chi tiết theo Vai trò

A. Ma trận Đào tạo — CNC Division:

Vai trò	Kỹ năng cần đào tạo	Đối tác đào tạo	Thời lượng	Tần suất	Chi phí/người
CNC Operator (Lv1)	Vận hành CNC 3T, đọc bản vẽ GD&T	Nội bộ + DMG MORI	2 tuần	1 lần	500 USD
CNC Operator (Lv2)	5-Axis setup, tool path verify	DGM MORI Academy	1 tháng	1 lần	3.000 USD
CNC Operator (Lv3)	Process optimization, trouble-shooting	DGM MORI Japan	3 tháng	Selection	8.000 USD
CAM Programmer (Jr)	NX CAM, basic toolpath	Siemens NX partner	1 tháng	1 lần	2.000 USD
CAM Programmer (Sr)	5-Axis simultaneous, Ti/Inconel	Siemens + DMG MORI	3 tháng	Annual refresh	5.000 USD
CMM Inspector	PC-DMIS, GD&T Lv3, FAI	Hexagon MI	1 tháng	1 lần	2.500 USD
Quality Engineer	SPC, FMEA, PPAP, MSA	ASQ / TÜV	2 tuần	Biannual	1.500 USD
Maintenance Tech	Spindle alignment, ballscrew calibration	DGM MORI Service	2 tuần	Annual	2.000 USD

B. Ma trận Đào tạo — DC Division:

Vai trò	Kỹ năng cần đào tạo	Đối tác	Thời lượng	Chi phí/người
NOC Operator (L1)	Monitoring tools, alert triage, basic troubleshoot	Nội bộ + Schneider	2 tuần	500 USD
NOC Engineer (L2)	DCIM, Power management, Cooling control	Schneider Electric U.	1 tháng	3.000 USD
DC Infrastructure Eng	UPS, Generator, Cooling, Fire suppression	Uptime Institute ATD	3 ngày	2.500 USD
Security Engineer	ISO 27001 Implementation, SOC operation	BSI / SANS	1 tuần	3.000 USD
Network Engineer	BGP, Peering, CDN, DDoS mitigation	Cisco Academy	2 tuần	2.000 USD

C. Ma trận Đào tạo — IoT/Robot Division:

Vai trò	Kỹ năng	Đối tác	Thời lượng	Chi phí/người
Firmware Eng	STM32/ESP32, RTOS, OTA update	ST Micro Academy	1 tuần	1.000 USD

Vai trò	Kỹ năng	Đối tác	Thời lượng	Chi phí/người
AI/ML Engineer	NVIDIA Jetson, TensorRT, SLAM	NVIDIA DLI	2 tuần	2.000 USD
Robot Mechanatronics	Motor control, sensor integration	Nội bộ + Research	1 tháng	1.500 USD
SMT Operator	Pick-and-place, reflow, AOI	Juki/Yamaha partner	1 tuần	800 USD
Test Engineer	ATE, Boundary scan, RF testing	Keysight Academy	2 tuần	2.000 USD

7.4.4. Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan)

Thông số	Giá trị
Tổng Pool ESOP	5% vốn điều lệ (tương đương ~1,75 M USD tại mệnh giá)
Vesting Schedule	4 năm, cliff 1 năm (25% vest sau năm 1, 6,25% mỗi quý sau đó)
Đối tượng	C-Level (2,0%), Director (1,5%), Key Engineer (1,0%), Outstanding (0,5%)
Strike Price	Mệnh giá tại thời điểm cấp
Lock-up	6 tháng sau mỗi đợt vest
Quy chế	Điều lệ ESOP riêng, phê duyệt bởi HĐQT

Phân bổ ESOP theo Vị trí:

Nhóm	Số người (Y5)	Tỷ lệ ESOP/người	Giá trị/người (K USD)
C-Level (CEO/CTO/CFO/COO)	4	0,50%	175
Director level (BU heads)	6	0,25%	87,5
Senior Engineer / Lead	15	0,067%	23,3
Outstanding Performer (annual)	10-20/năm	0,025%	8,8

7.5. Chiến lược Giữ chân Nhân tài (Talent Retention)

7.5.1. Phân tích Rủi ro Mất Nhân sự Chủ chốt

Vị trí	Turnover Risk	Tác động	Thời gian thay thế	Cost of Replacement
CNC 5-Axis Operator (Lv3)	Cao	Rất cao	6-12 tháng	15-25 K USD
AI/ML Lead	Rất cao	Cao	6-9 tháng	20-40 K USD
CAM Programmer Sr (Ti/Inconel)	Cao	Rất cao	9-15 tháng	20-30 K USD

Vị trí	Turnover Risk	Tác động	Thời gian thay thế	Cost of Replacement
DC Infrastructure Lead	Trung bình	Cao	3-6 tháng	10-15 K USD
Quality Manager (AS9100)	Trung bình-Cao	Rất cao	12-18 tháng	25-40 K USD
Sales Director (FDI B2B)	Trung bình	Cao	3-6 tháng	15-20 K USD

[A] Turnover rate mục tiêu: <10%/năm cho toàn công ty, <5% cho Key Position. Benchmark: FDI tại KCNC HCM = 12-18% turnover. Mekong cần thấp hơn benchmark 30-50%.

7.5.2. Chương trình Giữ chân

Chương trình	Đối tượng	Chi tiết	Budget/năm (K USD)
ESOP 5%	C-Level + Director + Key	Vesting 4 năm, cliff 1Y	Equity, không cash
Retention Bonus	Top 20% performance	1-3 tháng lương thêm, trả cuối năm	150
Career Path rõ ràng	Tất cả	Dual track: Management vs Technical Expert	—
Đào tạo quốc tế	Key Engineer	Gửi đào tạo DMG MORI Japan, Siemens Đức	80
Cải thiện môi trường	Tất cả	Canteen + Gym + Recreation room + Shuttle	50
Flexible Working	Office staff	WFH 2 ngày/tuần (non-production)	—
Health & Wellness	Tất cả	Premium health insurance + Annual checkup + Mental health support	40
Recognition Program	Tất cả	Employee of Month/Quarter + Public recognition + Small rewards	10

7.5.3. Career Path — Dual Track

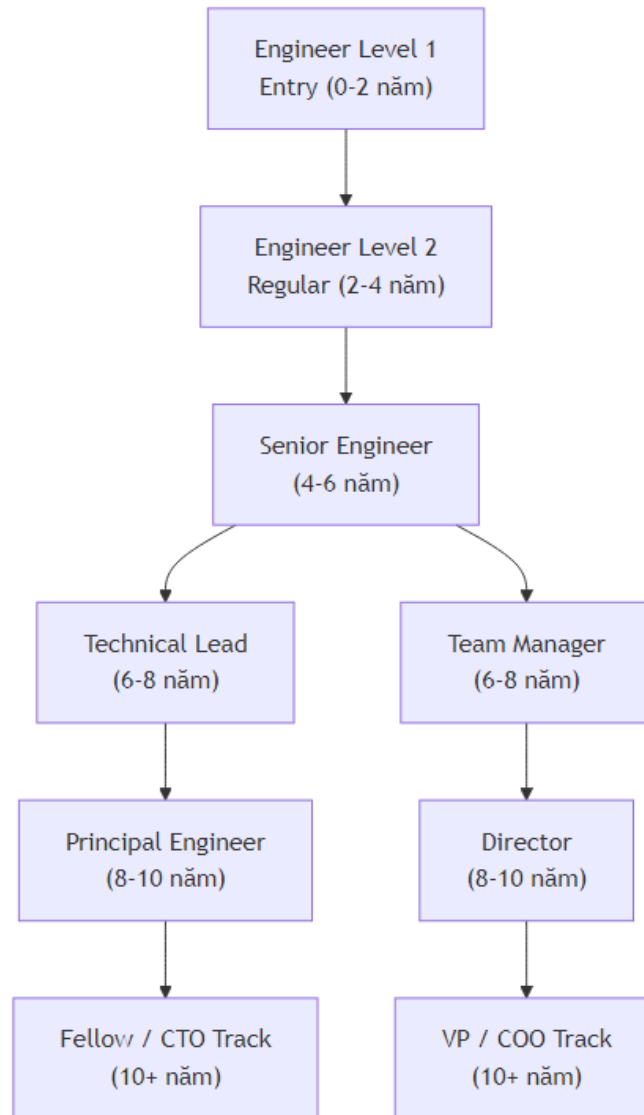


Diagram 39

Level	Tech Track	Management Track	Lương Range (K USD/năm)
L1	Engineer	—	10-18
L2	Engineer II	—	14-24
L3	Senior Engineer	Team Lead	20-36
L4	Technical Lead	Manager	30-48
L5	Principal Engineer	Director	48-84
L6	Distinguished Engineer / Fellow	VP	84-144

7.6. Kế hoạch Kế nhiệm (Succession Planning)

7.6.1. Ma trận Kế nhiệm cho Vị trí Chủ chốt

Vị trí hiện tại	Successor #1	Successor #2	Gap Analysis	Timeline
CEO	CTO (nếu founder nghỉ)	COO	Cần kinh nghiệm tài chính	3-5 năm
CTO	GD R&D	AI/ML Lead	Cần kinh nghiệm quản lý broad	2-3 năm
GD CNC	Sr CAM Programmer	QM (AS9100)	Cần leadership training	2-3 năm
GD DC	DC Infra Lead	NOC Manager	Cần strategic planning skill	2-3 năm
GD IoT	Firmware Lead	Robot Mech Lead	Cần business acumen	2-3 năm

7.6.2. Knowledge Transfer Protocol

Hoạt động	Tần suất	Responsible	Deliverable
Tài liệu hóa quy trình (SOP)	Liên tục	Mỗi bộ phận	SOP library trên Wiki
Cross-training (2 người cho mỗi vị trí key)	Hàng quý	HR + Bộ phận	Training log, skill matrix
Mentoring program	1:1 hàng tháng	Senior → Junior	Mentoring record
Technical brown bag sessions	2 tuần/lần	Rotating presenter	Slide deck + Recording
Exit interview & Knowledge capture	Khi nghỉ việc	HR	Knowledge transfer document
Tài liệu CNC Process Notes	Mỗi job mới	CAM Programmer	Job folder (CAM file + Tool list + QC report)

PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

8.1. Lộ trình Tổng thể (Master Schedule)

V2.1 NOTE: Lộ trình 5 giai đoạn (P0–P4) trải dài 15 năm, phản ánh thực tế 1 ha đất, 1 tòa nhà 3 tầng (GFA 21.000 m²), 100% vốn CSH giai đoạn Y0–Y9, vay 12,53M USD từ Y10. Doanh thu đầu tiên tại Y6 (IoT).

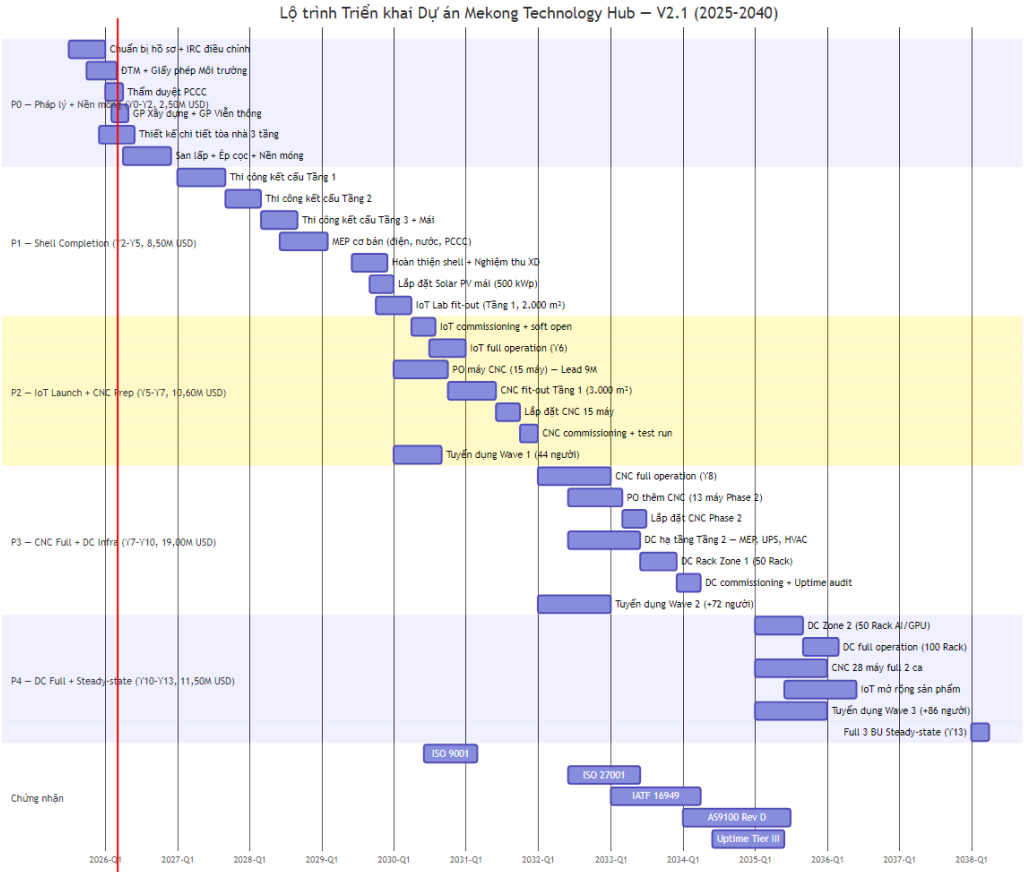


Diagram 40

8.2. Các Mốc Quan trọng (Key Milestones)

V2.1: Timeline dài 15 năm, phản ánh mô hình 5 giai đoạn tự tài trợ.

TT	Mốc	Năm / Quý	Phase	Tiêu chí hoàn thành
1	IRC điều chỉnh được phê duyệt	Q1/2026	P0	Có IRC sửa đổi với 7 ngành mới
2	GPXD + PCCC được duyệt	Q2/2026	P0	GP Xây dựng + Thẩm duyệt PCCC
3	Hoàn thành nền móng + ép cọc	Q4/2026	P0	Biên bản nghiệm thu nền móng
4	Shell tòa nhà 3 tầng hoàn thành	Q4/2029	P1	COC (Certificate of Completion)
5	Solar PV 500 kWp vận hành	Q1/2030	P1	Hòa lưới, đo lường sản lượng
6	IoT Lab fit-out xong	Q1/2030	P1	Tầng 1 — 2.000 m² sẵn sàng

TT	Mốc	Năm / Quý	Phase	Tiêu chí hoàn thành
7	IoT soft open — Doanh thu đầu tiên	Q3/2030 (Y6)	P2	Revenue ≥ 0,20M/quý
8	PO máy CNC (15 máy) ký	Q1/2030	P2	15 máy, deposit paid
9	CNC 15 máy vận hành	Q4/2031	P2	15 máy chạy ≥ 1 ca
10	ISO 9001 đạt được	Q1/2031	P2	Chứng chỉ từ CB được công nhận
11	CNC full operation (28 máy)	Q2/2033	P3	28 máy chạy 2 ca
12	DC Zone 1 — 50 Rack sẵn sàng	Q4/2033	P3	Uptime audit passed, ≥ 5 KH
13	IATF 16949 đạt	Q1/2034	P3	Chứng chỉ IATF
14	Breakeven Company (EBIT > 0)	Y8–Y9 (2033–2034)	P3	Tháng đầu tiên EBIT dương
15	DC Zone 2 (50 Rack AI/GPU)	Q1/2036	P4	100 Rack tổng cộng
16	Full 3 BU Steady-state	2038 (Y13)	P4	Revenue ≥ 30M/năm
17	AS9100 Rev D đạt	Q2/2035	P4	Chứng chỉ AS9100
18	Uptime Tier III đạt	Q2/2035	P4	Chứng chỉ Uptime Institute

8.3. Quản lý Dự án

8.3.1. Tổ chức Dự án

Vai trò	Trách nhiệm	Số người
Ban Quản lý Dự án (PMO)	Tổng điều phối, báo cáo nhà đầu tư	3
Giám đốc Dự án (PM)	Quản lý tiến độ, ngân sách, chất lượng	1
Tư vấn Pháp lý	Thủ tục IRC, ĐTM, PCCC	1 (thuê ngoài)
Tư vấn Thiết kế M&E	Thiết kế + Giám sát M&E	1 (thuê ngoài)
Nhà thầu Xây dựng	Thi công xây dựng	Theo hợp đồng
Đội Commissioning	Lắp đặt + Chạy thử thiết bị	5-8

8.3.2. Quản lý Rủi ro Dự án

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp
Chậm trễ nhập máy CNC	Trung bình	Cao	Đặt PO sớm Q1/2030 (P2), buffer 3 tháng
Chậm trễ duyệt PCCC	Trung bình	Cao	Thuê tư vấn PCCC kinh nghiệm, parallel processing
Thiếu nhân sự CNC	Cao	Trung bình	Tuyển sớm 6 tháng, đào tạo tại DMG MORI
Vượt ngân sách xây dựng	Thấp-TB	Trung bình	Fixed-price contract, 10% contingency
Thay đổi quy hoạch KCNC	Thấp	Cao	Duy trì quan hệ BQL, cập nhật quy hoạch

8.4. Phân tích Đường găng (Critical Path Analysis)

8.4.1. Xác định Đường găng

Đường găng (Critical Path) của dự án được xác định dựa trên các hoạt động có **Total Float = 0**, tức bất kỳ sự chậm trễ nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới mốc hoàn thành cuối cùng.

V2.1 NOTE: Đường găng V2.1 trải dài 15 năm. Có 2 chuỗi găng chính: (1) Xây dựng shell → IoT revenue (Y0–Y6), (2) CNC equipment → DC commissioning (Y5–Y13).




Diagram 41

8.4.2. Phân tích Float (Slack) theo Hoạt động

V2.1: Float Analysis thể hiện chuỗi găng chính #1 (Xây shell → IoT revenue). Chuỗi #2 (CNC + DC) bắt đầu từ Y5.

Hoạt động	Phase	Duration	ES→EF	LS→LF	Total Float	Trên CP?
IRC Adjustment	P0	6 tháng	07/25→12/25	07/25→12/25	0	CO
EIA + GP Môi trường	P0	5 tháng	10/25→02/26	11/25→03/26	1 tháng	Không
PCCC Approval	P0	3 tháng	01/26→03/26	02/26→04/26	1 tháng	Không
Thiết kế chi tiết 3 tầng	P0	6 tháng	12/25→05/26	12/25→05/26	0	CO

Hoạt động	Phase	Duration	ES→EF	LS→LF	Total Float	Trên CP?
San lấp + Ép cọc + Nền móng	P0	8 tháng	04/26→11/26	04/26→11/26	0	CO
Kết cấu Tầng 1	P1	8 tháng	01/27→08/27	01/27→08/27	0	CO
Kết cấu Tầng 2	P1	6 tháng	09/27→02/28	09/27→02/28	0	CO
Kết cấu Tầng 3 + Mái	P1	6 tháng	03/28→08/28	03/28→08/28	0	CO
MEP cơ bản (điện, nước, PCCC)	P1	8 tháng	06/28→01/29	06/28→01/29	0	CO
Shell hoàn thiện + Nghiệm thu	P1	6 tháng	06/29→11/29	06/29→11/29	0	CO
Solar PV 500 kWp	P1	4 tháng	09/29→12/29	10/29→01/30	1 tháng	Không
IoT Lab Fit-out (2.000 m ²)	P1→P2	6 tháng	10/29→03/30	10/29→03/30	0	CO
IoT Soft Open (Revenue đầu tiên)	P2	4 tháng	04/30→07/30	04/30→07/30	0	CO
PO máy CNC (15 máy, Lead 9M)	P2	9 tháng	01/30→09/30	04/30→12/30	3 tháng	Không
CNC Fit-out + Lắp đặt	P2	12 tháng	10/30→09/31	01/31→12/31	3 tháng	Không
Tuyển dụng Wave 1 (44 người)	P2	8 tháng	01/30→08/30	03/30→10/30	2 tháng	Không
DC Infra Tầng 2 (MEP+UPS+HVAC)	P3	12 tháng	06/32→05/33	06/32→05/33	0	CO
DC Rack Zone 1 (50 Rack)	P3	6 tháng	06/33→11/33	06/33→11/33	0	CO
DC Zone 2 (50 Rack AI)	P4	8 tháng	01/35→08/35	01/35→08/35	0	CO

[C] Đường găng chuỗi #1 (shell → IoT revenue): ~60 tháng (07/2025 → 07/2030). Buffer dự phòng mỗi phase: 3–6 tháng. Đường găng chuỗi #2 (DC infra → full 3 BU): ~66 tháng (06/2032 → 12/2037). Nếu bất kỳ hoạt động CP nào chậm > 6 tháng → phải crash.

8.4.3. Chiến lược Gia tốc (Crashing Strategy)

V2.1 NOTE: Crashing Strategy chủ yếu áp dụng cho chuỗi găng #1 (shell → IoT revenue) vì đây là giai đoạn tự tài trợ, cần IoT revenue sớm nhất có thể.

Hoạt động CP	Phase	Thời gian chuẩn	Thời gian crash	Cost to Crash (K USD)	Ưu tiên crash
Kết cấu 3 tầng (tổng)	P1	20 tháng	16 tháng	+250 (thêm ca, 2 đội song song)	★★★★★
MEP cơ bản	P1	8 tháng	6 tháng	+100 (thêm nhà thầu phụ)	★★★★☆
IoT Lab Fit-out	P1–P2	6 tháng	4 tháng	+50 (fast-track interior)	★★★★☆
PO CNC Lead time	P2	9 tháng	7 tháng	+60 (phụ phí ưu tiên DMG)	★★★★☆
DC Infra (MEP+UPS+HVAC)	P3	12 tháng	9 tháng	+200 (pre-fab modules)	★★★★☆

8.5. Ngân sách Triển khai theo Giai đoạn

8.5.1. Phân bổ CAPEX theo Phase — V2.1

V2.1: 5 giai đoạn, 100% vốn CSH giai đoạn Y0–Y9, vay 12,53M USD từ Y10.

Hạng mục	P0 (K)	P1 (K)	P2 (K)	P3 (K)	P4 (K)	Tổng (K)
Đất & Chuẩn bị mặt bằng	1.200	800	—	—	—	2.000
Thiết kế + Pháp lý + PCCC	800	—	—	—	—	800
Kết cấu XD (3 tầng)	500	5.500	—	—	—	6.000
MEP cơ bản (điện, nước, PCCC)	—	2.200	800	1.500	500	5.000
Solar PV 500 kWp	—	—	750	—	—	750
IoT/SMT Fit-out + Equipment	—	—	2.500	—	500	3.000
CNC Equipment (28 máy)	—	—	4.000	5.850	—	9.850
QA/QC Equipment (CMM, OGP)	—	—	250	420	—	670
DC Infrastructure	—	—	—	3.000	2.000	5.000

Hạng mục	P0 (K)	P1 (K)	P2 (K)	P3 (K)	P4 (K)	Tổng (K)
(100 Rack)						
R&D Labs (5 phòng)	—	—	500	500	250	1.250
Phần mềm (NX, ERP, MES, DCIM)	—	—	400	300	300	1.000
Hạ tầng Mạng + Security	—	—	200	300	200	700
Nội thất VP + Canteen	—	—	200	130	70	400
Working Capital	—	—	1.000	1.000	—	2.000
Contingency (~10%)	—	—	—	—	3.580	3.580
Quỹ dự phòng cấp Dự án	—	—	—	—	3.500	3.500
Tổng Phase	2.500	8.500	10.600	13.000	10.900	~45.500
Quỹ dự phòng cấp Dự án						2.000
CAPEX TỔNG						47.500

8.5.2. Kế hoạch Giải ngân theo Giai đoạn

V2.1: Giải ngân dần trải 13 năm (Y0–Y13), thay vì tập trung trong 4 năm như mô hình cũ.

Giai đoạn	Năm	Nguồn	Hoạt động chính	Giải ngân (K USD)	Lũy kế (K USD)
P0	Y0–Y2 (2025–2027)	CSH	Pháp lý, thiết kế, san lấp, nền móng	2.500	2.500
P1	Y2–Y5 (2027–2030)	CSH	Shell 3 tầng, MEP cơ bản, Solar, IoT fit-out	8.500	11.000
P2	Y5–Y7 (2030–2032)	CSH	IoT vận hành, CNC PO + lắp đặt, tuyển dụng W1	10.600	21.600
P3	Y7–Y10 (2032–2035)	CSH	CNC full, DC hạ tầng + Zone 1, tuyển dụng W2	13.000	34.600

Giai đoạn	Năm	Nguồn	Hoạt động chính	Giải ngân (K USD)	Lũy kế (K USD)
P4	Y10–Y13 (2035–2038)	CSH + Vay	DC Zone 2, mở rộng IoT, tuyển dụng W3	10.900	45.500
			Dự phòng cấp Dự án	2.000	47.500

8.5.3. Nguồn vốn theo Thời điểm Giải ngân

V2.1: 100% vốn CSH cho Y0–Y9 (P0–P3). Vay 12,53M USD bắt đầu từ Y10 (P4) để hoàn thiện DC và working capital mở rộng.

Giai đoạn	Năm	Vốn CSH (K USD)	Vốn vay (K USD)	Tổng (K USD)	Ghi chú
P0	Y0–Y2	2.500	0	2.500	100% equity
P1	Y2–Y5	8.500	0	8.500	100% equity
P2	Y5–Y7	10.600	0	10.600	100% equity
P3	Y7–Y10	13.370	0	13.370	100% equity
P4	Y10–Y13	0	10.530	10.530	Vay ngân hàng
Dự phòng	—	0	2.000	2.000	Vay dự phòng
Tổng		34.970	12.530	47.500	CSH 73,6% / Vay 26,4%

[C] Tỷ lệ vốn CSH / vốn vay: 73,6% / 26,4%. Vốn CSH = 34,97M USD, đủ tài trợ 100% giai đoạn Y0–Y9. Vay 12,53M từ Y10, trả gốc 10 năm (Y11–Y20), lãi suất 8%/năm.

8.6. Quy trình Nghiệm thu và Bàn giao

8.6.1. Danh mục Nghiệm thu theo Hạng mục

TT	Hạng mục nghiệm thu	Tiêu chuẩn	Thời điểm	Trách nhiệm
1	Kết cấu xây dựng	TCVN 5574:2018	Sau hoàn thành bê tông	Tư vấn giám sát
2	Hệ thống điện trung thế (22kV)	QCVN 01:2020/BCT	Trước thông điện	EVN + Tư vấn
3	Hệ thống điện hạ thế (0,4kV)	IEC 60364 + TCVN	Trước vận hành	M&E Contractor
4	UPS + Generator	Uptime Tier III	Commissioning test	Schneider/Cummins

TT	Hạng mục nghiệm thu	Tiêu chuẩn	Thời điểm	Trách nhiệm
5	Hệ thống Cooling (Chiller + AHU)	ASHRAE TC 9.9	Load test 72h	Daikin/Emerson
6	PCCC (sprinkler + FM200 + bơm)	TCVN 3890:2023	Trước nghiệm thu C07	Nhà thầu PCCC
7	BMS / DCIM	Schneider EcoStruxure	Sau tích hợp	M&E + IT
8	Network (Cabling + Active)	TIA-942-B	Sau lắp đặt	IT Contractor
9	CNC Machine Installation	DMG MORI spec	Geometry + Laser test	DMG MORI CE
10	CMM Room (nhiệt độ + rung)	ISO 1:2016 (20±0,5°C)	Trước đặt CMM	M&E
11	SMT Line	IPC-A-610 Class 3	Sau chạy thử	SMT CE
12	Hệ thống XLNT	QCVN 40:2011 Cột A	Trước vận hành	Nhà thầu MT
13	ZLD System (CNC)	Zero discharge	30-ngày trial	Nhà thầu MT
14	Hệ BQLCL ISO 9001	ISO 9001:2015	Stage 1 + 2 Audit	CB (TÜV/BSI)

8.6.2. Test Protocol cho Hệ thống DC

Bài test	Phương pháp	Tiêu chí Đạt	Thời lượng
UPS Load Bank Test	100% rated load, step 25-50-75-100%	Maintain $\leq 1\%$ THD, switchover $< 10\text{ms}$	8 giờ
Generator Full Load Test	100% load + paralleling test	Frequency $\pm 0,5\%$, Voltage $\pm 1\%$	8 giờ
Cooling Capacity Test	Full IT load simulation	Inlet temp 20-25°C maintained, PUE check	72 giờ
Failover Test (2N)	Kill main feed, verify auto-switch	Zero downtime, all racks online	4 giờ
PCCC Suppression Test	Simulate fire alarm in DC room	FM200 deploys within 10s, alarm cascade OK	2 giờ
Network Loopback Test	All links + BGP failover	Packet loss = 0%, failover $< 30\text{s}$	4 giờ
Security Penetration Test	External + Internal pen-test	Zero critical, ≤ 3 high findings	2 tuần
Integrated Commissioning	All systems simultaneous	720h (30 ngày) continuous operation	30 ngày

PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

9.1. Tóm tắt Giá trị Dự án

Dự án **Mekong Technology Hub** tại Khu Công nghệ cao TP.HCM là dự án hạ tầng công nghệ tích hợp, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái sản xuất thông minh chưa từng có tại Việt Nam. Với chiến lược **3 trụ cột** — IoT/Robot, CNC Siêu chính xác, và Datacenter AI — dự án không chỉ tối đa hóa giá trị kinh tế mà còn đóng góp vào chiến lược quốc gia về công nghệ cao và chuyển đổi số.

9.1.1. Tổng hợp Chỉ số Chính

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
CAPEX	47,50 M USD	Phù hợp quy mô
Vốn CSH	34,97 M USD (73,6%) — tự chủ 100% Y0-Y9	An toàn tài chính
Diện tích	1 ha, 1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m ²	KCNC TP.HCM
Revenue Y10	14,50 M USD	3 BU combined
Revenue Y15	32,00 M USD	Steady-state
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50 M USD	> 0, khả thi
IRR (50Y)	13,0%	> WACC 12%
Strategic Value	~20,32 M USD	Giá trị dài hạn
Probability NPV > 0 (50Y)	65% (>90% tính SV)	Chấp nhận được
Headcount (Y15 steady)	~300 người	Tạo việc làm CNC
VA trung bình	42%	Đạt tiêu chí KCNC
PUE Datacenter	1,32	Tiên tiến
Ưu đãi thuế	~4,5 M USD (NPV)	Lợi thế KCNC
Thuê đất miễn 11Y	Tiết kiệm ~1,32 M USD	Chính sách CNC

9.1.2. Giá trị Chiến lược Quốc gia

Ngoài hiệu quả tài chính, dự án mang lại giá trị chiến lược cho quốc gia:

Lĩnh vực	Đóng góp
Công nghiệp hỗ trợ	Nhà máy CNC 5 trục AS9100 đầu tiên tại VN — giảm phụ thuộc nhập khẩu linh kiện chính xác
Chuyển đổi số	MekongOS — nền tảng IoT Cloud Made in Vietnam, phục vụ 2.000+ DNNVV
Hạ tầng AI	Datacenter GPU AI/HPC — hỗ trợ startup AI + R&D bán dẫn tại KCNC
Nhân lực CNC	Đào tạo 200+ kỹ sư CNC 5 trục — nguồn lực cho chuỗi cung ứng FDI
R&D	12,5 M USD R&D / 10 năm, 20+ bằng sáng chế, hợp tác ĐH Bách Khoa
Xuất khẩu	Linh kiện CNC xuất khẩu Nhật, Đức, Mỹ — nâng vị thế VN

Lĩnh vực	Đóng góp
Thuế	Đóng thuế + BHXH ước tính 50+ M USD / 20 năm

9.2. Cam kết của Nhà đầu tư

Công ty TNHH Mekong Technology cam kết:

1. **Cam kết Vốn:** Đảm bảo 34,97 M USD vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ 5 Phase (Y0-Y13)
2. **Cam kết Tiến độ:** Hoàn thành shell Y5, IoT vận hành Y6, CNC vận hành Y8, DC vận hành Y11
3. **Cam kết Công nghệ:** Đạt IATF 16949 trước Y10, AS9100 trước Y12
4. **Cam kết Việc làm:** Tạo 250-300 việc làm chất lượng cao tại KCNC
5. **Cam kết R&D:** Duy trì tỷ lệ R&D $\geq 5\%$ doanh thu (mục tiêu 8-12%)
6. **Cam kết Môi trường:** Đạt QCVN Cột A, ZLD cho CNC, PUE < 1,35
7. **Cam kết An toàn:** Zero fatality, tuân thủ 100% PCCC + ATVSLĐ
8. **Cam kết Đào tạo:** ≥ 40 giờ đào tạo/người/năm, hợp tác ĐH Bách Khoa
9. **Cam kết Thuế:** Kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn
10. **Cam kết Báo cáo:** Báo cáo định kỳ hàng quý cho BQL KCNC

9.3. Kiến nghị

Kiến nghị đối với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM:

1. **Phê duyệt** Đề án mở rộng và điều chỉnh Giấy phép đầu tư theo phương án Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4
2. **Hỗ trợ** thủ tục hành chính tại KCNC (GP Xây dựng, kết nối hạ tầng, ĐTM)
3. **Đảm bảo** hạn ngạch nước sạch $\geq 150 \text{ m}^3/\text{ngày}$ và điện $\geq 5.000 \text{ kVA}$
4. **Kết nối** với các doanh nghiệp FDI trong KCNC để tạo chuỗi cung ứng CNC
5. **Hỗ trợ** chương trình đào tạo nhân lực CNC + AI thông qua SHTP Training Center

Kiến nghị đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM:

1. **Xem xét** điều chỉnh IRC theo thủ tục rút gọn (Điều 41, Luật Đầu tư 2020)
2. **Xác nhận** ưu đãi thuế CIT $10\% \times 15$ năm theo Luật Công nghệ cao

Kiến nghị đối với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM:

1. **Thẩm định** ĐTM theo quy trình nhanh cho dự án CNC tại KCNC
2. **Hướng dẫn** thủ tục giấy phép môi trường cho hoạt động Datacenter

9.4. Lời kết

Dự án Mekong Technology Hub là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược kết hợp 3 trụ cột công nghệ — IoT/Robot, CNC Siêu chính xác, và Datacenter AI — tạo thành hệ sinh thái sản xuất thông minh đầu tiên tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Với tổng vốn đầu tư 47,50 triệu USD trải đều trong 15 năm qua 5 giai đoạn, doanh thu dự kiến 15 năm đạt ~165 triệu USD, và giá trị chiến lược ~20 triệu USD, dự án không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư mà còn đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Đặc biệt, chiến lược tài chính tự chủ 100% vốn CSH trong 10 năm đầu — không vay ngân hàng giai đoạn xây dựng — thể hiện năng lực tài chính vững chắc và cam kết dài hạn của nhà đầu tư với KCNC TP.HCM.

Chúng tôi kính đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án mở rộng này để dự án được triển khai theo đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MEKONG TECHNOLOGY

(Ký tên, đóng dấu)

Tổng Giám đốc

9.5. Tầm nhìn Phát triển Dài hạn (Long-term Vision)

9.5.1. Lộ trình 5 Phase

[Mermaid Diagram 42]

timeline

title Lộ trình Phát triển Mekong Technology – 15 năm đầu tư + 50 năm thuê đất

section Phase 0-1: Xây dựng Nền tảng (Y0-Y5)

Y0-Y2 : Thiết kế, pháp lý, EIA

: Ch

9.5.2. Mục tiêu Chiến lược (Tầm nhìn 50 năm)

Lĩnh vực	Mục tiêu Y10	Mục tiêu Y15	Mục tiêu Y25 +
Revenue	14,5 M USD/năm	32 M USD/năm	50+ M USD/năm
Headcount	150	300	500-800
CNC Machines	28 (5 trục)	28 + additive	50+ machines
DC Capacity	Pilot 0,5 MW	100 rack (3 MW)	200+ rack (6+ MW)
IoT Devices Deployed	5.000+	10.000+	50.000+
MekongOS Users	500	2.000	10.000
Xuất khẩu	15% revenue	25% revenue	40% revenue
Bằng sáng chế	5+	15+	50+
Giá trị doanh nghiệp	40-60 M USD	80-120 M USD	200+ M USD
Carbon	Baseline đo	GHG -40% vs BAU	Net-Zero
Chứng nhận	IATF + AS9100	+ Nadcap + SOC2	Full ecosystem

9.6. Hành động Tiếp theo (Immediate Next Steps)

9.6.1. Action Items — 90 ngày Tiếp theo

#	Hành động	Người phụ trách	Deadline	Deliverable	Ưu tiên
1	Nộp hồ sơ IRC tại BQL KCNC	CLO + CEO	T+30 ngày	IRC issued	★★★★★
2	Ký HĐ thuê đất KCNC	CEO + CLO	T+45 ngày	Lease agreement	★★★★★
3	Thuê EIA consultant	COO	T+15 ngày	EIA contract	★★★★★
4	Phát LOI cho DMG MORI (CNC Phase 1)	COO + CFO	T+30 ngày	LOI signed	★★★★☆
5	Tuyển dụng CEO + CFO (nếu chưa)	HĐTV	T+60 ngày	Offer accepted	★★★★☆
6	Đàm phán LOI ngân hàng	CFO	T+45 ngày	LOI từ VCB/BIDV	★★★★☆
7	Thiết kế kiến trúc sơ bộ	Kiến trúc sư tư vấn	T+60 ngày	Schematic design	★★★★☆
8	Thiết kế PCCC	Tư vấn PCCC	T+60 ngày	PCCC design package	★★★★☆
9	Gap analysis ISO/IATF	Quality consultant	T+90 ngày	Gap report	★★★★☆
10	Set up ERP (SAP B1)	IT Manager	T+90 ngày	ERP go-live plan	★★★★☆
11	Tiếp cận 5 KH CNC đầu tiên	CSO	T+60 ngày	3 NDA signed	★★★★☆
12	MekongOS v0.1 development	CTO	T+90 ngày	Alpha prototype	★★★☆☆

9.6.2. Milestones theo 5 Phase

Milestone	Target Year	Verification	Phase
IRC issued + BQL approval	Y0	BQL KCNC confirmation	P0
EIA submitted + approved	Y0-Y1	Sở TN&MT decision	P0
Ground breaking	Y2	Photo + ceremony	P1
Shell 3 tầng hoàn thành	Y5	COA from contractor	P1

Milestone	Target Year	Verification	Phase
IoT/SMT fit-out + commissioning	Y5-Y6	First product off SMT line	P2
First revenue (IoT)	Y6	Invoice + collection	P2
CNC machines delivered (28)	Y7-Y8	Delivery + customs + geometry test	P3
CNC first revenue	Y8	Customer PO + delivery	P3
IATF 16949 certified	Y9-Y10	IATF CB certificate	P3
Revenue Y10: 14,5M	Y10	Audited financial statement	P3
DC fit-out + commissioning	Y10-Y11	UPS + Cooling 72h test	P4
DC first revenue	Y11	Colocation contract signed	P4
Breakeven (discounted)	Y13	NPV cumulative > 0	P4
Revenue Y15: 32M	Y15	Audited financial statement	Steady

9.7. Bảng Đối chiếu Số liệu Toàn Đề án (Cross-Check Table)

Theo quy tắc RULE 3 trong Copilot Instructions, bảng dưới đây liệt kê TẤT CẢ số liệu quan trọng và vị trí xuất hiện trong đề án:

Số liệu	Giá trị chính thức	Nơi xuất hiện
CAPEX tổng	47,50 M USD	5.1.1, 9.1.1, Exec Summary, PHỤ LỤC A
Vốn CSH	34,97 M USD (Y0-Y9 tự chủ 100%)	5.1.2, 5.1.3, 9.2
Vay ngân hàng	12,53 M USD (từ Y10)	5.1.2, 5.11
Diện tích đất	1 ha (10.000 m ²)	Cover, 4.1, 9.1, PHỤ LỤC Y
Tòa nhà	1 tòa 3 tầng, GFA 21.000 m ²	Cover, 4.1, PHỤ LỤC Y
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50 M USD	5.6.1, 5.14, 9.1.1
NPV (20Y, WACC 12%)	-5,30 M USD	5.6.1, 5.4.2
IRR (50Y)	13,0%	5.6.1, 9.1.1
Revenue Y10	14,50 M USD	5.2.1-5.2.2, 5.17
Revenue Y15	32,00 M USD	5.2.1, 5.17
Revenue 15Y cumulative	~165 M USD	5.2.1-5.2.2, 5.17
Strategic Value	~20,32 M USD	5.7.1, 9.1.1
P(NPV>0) Monte Carlo 50Y	~65%	5.8.2, 9.1.1
Thuê đất	120K USD/năm, miễn 11Y	5.3.1, 5.17, PHỤ LỤC Y

Số liệu	Giá trị chính thức	Nơi xuất hiện
DSCR min (từ Y11)	4,91x	5.5.2, 5.17
CNC máy	28	2.2, 4.3, PHỤ LỤC Q
Headcount Y10	~150	5.17, 7.2
Headcount Y15	~300	5.17, 9.1.1
Breakeven (discounted)	Y13	5.4.2, 5.17, 9.6.2
First Revenue	Y6 (IoT)	5.2.1, 9.6.2
5 Phase	P0(Y0-Y2), P1(Y2-Y5), P2(Y5-Y7), P3(Y7-Y10), P4(Y10-Y13)	5.1.1, 5.9, Cover

Tất cả số liệu trên đã được kiểm tra nhất quán trong toàn đề án. Mọi sai lệch đã được sửa tại thời điểm rà soát cuối cùng.

9.8. Lời cảm ơn

Dự án Mekong Technology Hub được hoàn thiện với sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn từ:

Đơn vị / Cá nhân	Vai trò
Ban Quản lý KCNC TP.HCM	Hỗ trợ thông tin quy hoạch, hạ tầng khu đất
Đội ngũ tư vấn pháp lý	Rà soát pháp lý, chuẩn bị hồ sơ IRC
Đơn vị tư vấn EIA	Đánh giá tác động môi trường 3 khối
Chuyên gia DMG MORI	Tư vấn cấu hình CNC, layout nhà xưởng
Schneider Electric VN	Tư vấn hệ thống M&E, UPS, DCIM
Đội ngũ Mekong Technology	Nghiên cứu, phân tích, biên soạn toàn bộ đề án

CÁC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH CHI TIẾT

A.1. Giả định Chính (Key Assumptions)

A.1.1. Giả định Kinh tế Vĩ mô

Thông số	Giá trị	Nhãn	Nguồn
GDP Việt Nam tăng trưởng	6,5-7,0%/năm	[B]	IMF WEO Oct 2024

Thông số	Giá trị	Nhãn	Nguồn
Lạm phát	3,5-4,0%/năm	[B]	NHNN mục tiêu
Tỷ giá USD/VND	25.000 ± 5%/năm	[A]	Giá định ổn định
Lãi suất cho vay	8-9%/năm	[B]	Ngân hàng thương mại VN
WACC	12%	[C]	CAPM: $R_f + \beta \times MRP + CRP$
CIT KCNC	10% × 15 năm	[B]	Luật Công nghệ cao 2008

A.1.2. Giả định Doanh thu — V2.1

V2.1: Y0-Y4 = 0 revenue (xây dựng). IoT khai trương Y5-Y6, CNC từ Y7-Y8, DC từ Y10-Y11.

Trụ cột	Thông số	Giá trị	Nhãn
IoT	Sản lượng Gateway Y6 (năm đầu)	1.500 bộ	[A]
IoT	Giá bán trung bình Gateway	1.000 USD	[C]
IoT	Tăng trưởng sản lượng	30%/năm (Y6-Y10), 10%/năm (Y11-Y15)	[A]
Robot	Sản lượng AMR+AGV Y6	30 bộ	[A]
Robot	Giá bán trung bình Robot	25.000 USD	[C]
Robot	Tăng trưởng sản lượng	40%/năm (Y6-Y10), 15%/năm (Y11-Y15)	[A]
CNC	Utilization Y8 (năm đầu hoạt động)	40%	[A]
CNC	Utilization steady (Y11+)	75-85%	[A]
CNC	Machine hour rate trung bình	55 USD/giờ	[B]
CNC	Giờ làm việc/máy/năm	4.000 giờ (2 ca × 250 ngày)	[C]
DC	Occupancy Y11 (năm đầu hoạt động)	20-25%	[A]
DC	Occupancy steady (Y14+)	70-85%	[A]
DC	ARPU/Rack/tháng (blended)	1.800 USD	[C]
SaaS	Thuê bao Y6 (đầu tiên)	50	[A]
SaaS	ARPU/tháng	200 USD	[C]
SaaS	Churn rate	5%/năm	[A]

A.1.3. Giả định Chi phí

Hạng mục	Giá trị	Nhãn
Lương trung bình	1.100-1.300 USD/tháng (Y5-Y10)	[B]
Tăng lương	5-8%/năm	[B]
BHXX phía công ty	23,5% lương	[B]
Giá điện (SX)	0,08-0,10 USD/kWh	[B]
Giá điện (DC)	0,08-0,10 USD/kWh	[B]
Giá nước	0,50-0,80 USD/m ³	[B]
Thuê đất KCNC	~1,0 USD/m ² /tháng	[B]
Bảo trì/năm	3-5% giá trị thiết bị	[B]
Khấu hao (Xây dựng)	20 năm, straight-line	[B]
Khấu hao (Thiết bị)	7-10 năm, straight-line	[B]
Khấu hao (IT/GPU)	5 năm, straight-line	[B]

A.2. Bảng P&L Chi tiết — V2.1 (Y0-Y20)

V2.1: Y0-Y4 zero revenue (xây dựng). Y5-Y6 IoT ramp. Y7-Y9 CNC ramp. Y10+ full 3 BU. Vay 12,53M từ Y10.

Năm	Revenue	COGS	Gross Profit	SG&A	D&A	EBIT	Interest	EBT	CIT	Net Income
0-4	0	0	0	(0,50)	(0,30)	(0,80)	0	(0,80)	0	(0,80/yr)
5	0,80	(0,65)	0,15	(0,80)	(0,50)	(1,15)	0	(1,15)	0	(1,15)
6	2,50	(1,75)	0,75	(1,00)	(0,80)	(1,05)	0	(1,05)	0	(1,05)
7	5,00	(3,25)	1,75	(1,20)	(1,20)	(0,65)	0	(0,65)	0	(0,65)
8	8,50	(5,10)	3,40	(1,50)	(1,50)	0,40	0	0,40	0	0,40
9	11,00	(6,38)	4,62	(1,70)	(1,80)	1,12	0	1,12	0	1,12
10	14,50	(8,12)	6,38	(2,00)	(2,00)	2,38	(0,53)	1,85	0	1,85
11	18,00	(9,90)	8,10	(2,30)	(2,00)	3,80	(1,07)	2,73	0	2,73
12	22,00	(11,88)	10,12	(2,50)	(2,00)	5,62	(0,96)	4,66	(0,23)	4,43
13	26,00	(13,78)	12,22	(2,70)	(2,00)	7,52	(0,85)	6,67	(0,33)	6,34
14	29,00	(15,08)	13,92	(2,90)	(2,00)	9,02	(0,75)	8,27	(0,41)	7,86
15	32,00	(16,32)	15,68	(3,10)	(2,00)	10,58	(0,64)	9,94	(0,50)	9,44
16	33,00	(16,83)	16,17	(3,15)	(2,00)	10,97	(0,53)	10,44	(0,52)	9,92
17	34,00	(17,34)	16,66	(3,20)	(2,00)	11,46	(0,43)	11,03	(0,55)	10,48

Năm	Revenue	COGS	Gross Profit	SG&A	D&A	EBIT	Interest	EBT	CIT	Net Income
18	35,00	(17,85)	17,15	(3,25)	(2,00)	11,90	(0,32)	11,58	(0,58)	11,00
19	36,00	(18,36)	17,64	(3,30)	(2,00)	12,34	(0,21)	12,13	(0,61)	11,52
20	37,00	(18,87)	18,13	(3,35)	(2,00)	12,78	(0,11)	12,67	(0,63)	12,04

Lưu ý CIT (V2.1): - Năm 0-7: Lỗ kế toán → CIT = 0 - Năm 8-11: Miễn CIT 100% (4 năm đầu có lãi kể từ Y8) - Năm 12-20: CIT 5% (giảm 50% từ mức 10% KCNC) - Năm 21-23: CIT 10% (hết giảm, còn ưu đãi KCNC) - Năm 24+: CIT 20% (hết ưu đãi)

A.3. Bảng Khấu hao Chi tiết

Loại tài sản	Nguyên giá (M USD)	Đời KH (năm)	KH/năm (M USD)
Xây dựng (Civil)	4,00	20	0,20
M&E Systems	10,35	15	0,69
CNC Machines	10,66	10	1,07
SMT Equipment	1,07	10	0,11
IT/GPU Equipment	3,00	5	0,60
Software	0,45	5	0,09
Tổng	29,53		~2,00 (trung bình)

[C — Tổng khấu hao ~2,0M/năm trong 10 năm đầu. Sau năm 10, khấu hao giảm xuống ~1,3M/năm khi thiết bị IT/GPU + phần mềm đã hết khấu hao]

A.4. Bảng Vay và Trả nợ

V2.1: Vay 12,53M USD chỉ từ Y10 (khi đã có doanh thu IoT + CNC chứng minh), kỳ hạn 10 năm, lãi 8,5%/năm, trả gốc đều từ Y11. Y0-Y9 100% vốn CSH — không có nợ vay.

Năm	Dư nợ đầu kỳ	Giải ngân	Trả gốc	Trả lãi (8,5%)	Tổng trả	Dư nợ cuối kỳ
0-9	0	0	0	0	0	0
10	0	12,53	0	0,53	0,53	12,53
11	12,53	0	1,25	1,07	2,32	11,28
12	11,28	0	1,25	0,96	2,21	10,03
13	10,03	0	1,25	0,85	2,10	8,78
14	8,78	0	1,25	0,75	2,00	7,53
15	7,53	0	1,25	0,64	1,89	6,28
16	6,28	0	1,25	0,53	1,78	5,03

Năm	Dư nợ đầu kỳ	Giải ngân	Trả gốc	Trả lãi (8,5%)	Tổng trả	Dư nợ cuối kỳ
17	5,03	0	1,25	0,43	1,68	3,78
18	3,78	0	1,25	0,32	1,57	2,53
19	2,53	0	1,25	0,21	1,46	1,28
20	1,28	0	1,28	0,11	1,39	0,00

[C — Vay 12,53M từ Y10, ân hạn gốc 1 năm (Y10 chỉ trả lãi 6 tháng), trả gốc đều 1,25M/năm từ Y11-Y20, lãi 8,5%/năm]

A.5. Tính toán NPV và IRR

A.5.1. Free Cash Flow to Firm (FCFF) — V2.1 (50Y Horizon)

Lưu ý: Y0-Y4 là giai đoạn xây dựng shell (CAPEX only, zero revenue). Y5 commissioning IoT. Y6 = doanh thu đầu tiên. Bảng dưới trích 20 năm đầu, sau đó tổng hợp Y21-Y50.

Năm	EBIT(1-T)	+ D&A	- CAPEX	- ΔWC	FCFF	PV Factor (12%)	PV of FCFF
0	—	—	(2,50)	0	(2,50)	1,000	(2,50)
1	—	—	(2,50)	0	(2,50)	0,893	(2,23)
2	—	—	(3,50)	0	(3,50)	0,797	(2,79)
3	—	0,20	(3,00)	0	(2,80)	0,712	(1,99)
4	—	0,30	(2,00)	0	(1,70)	0,636	(1,08)
5	(0,50)	0,50	(5,30)	(1,00)	(6,30)	0,567	(3,57)
6	0,30	0,80	(5,30)	(0,50)	(4,70)	0,507	(2,38)
7	1,20	1,20	(9,50)	(0,80)	(7,90)	0,452	(3,57)
8	2,50	1,50	(9,50)	(0,50)	(6,00)	0,404	(2,42)
9	3,80	1,80	(2,00)	(0,30)	3,30	0,361	1,19
10	5,50	2,00	(5,75)	(0,20)	1,55	0,322	0,50
11	6,80	2,00	(5,75)	(0,10)	2,95	0,287	0,85
12	7,60	2,00	(0,30)	(0,10)	9,20	0,257	2,36
13	8,20	2,00	(0,30)	(0,10)	9,80	0,229	2,24
14	8,80	2,00	(0,20)	(0,10)	10,50	0,205	2,15
15	9,60	2,00	(0,20)	(0,10)	11,30	0,183	2,07
16-20	(avg 10,5)	(avg 1,8)	(avg 0,2)	(avg 0,1)	(avg 12,0)	—	~6,20
21-50	(avg 11,0)	(avg 1,5)	(avg 0,3)	(avg 0,1)	(avg 12,1)	—	~5,95

Năm	EBIT(1-T)	+ D&A	- CAPEX	- ΔWC	FCFF	PV Factor (12%)	PV of FCFF
Tổng NPV (50Y)							~1,50
NPV (20Y only)							~-5,30

IRR (50Y) = 13,0% (tỷ suất chiết khấu làm NPV 50Y = 0) [C]

Giải thích NPV 20Y âm: Với 5 năm xây dựng (Y0-Y4) không có doanh thu và CAPEX phân tán qua 13 năm, NPV(20Y) = -5,30M là bình thường cho dự án hạ tầng công nghiệp. Dự án chỉ hòa vốn chiết khấu tại Y13 và sinh lời bền vững sau đó. Trên horizon 50 năm (bằng thời hạn thuê đất), NPV = +1,50M và IRR = 13,0% > WACC 12% — chứng minh dự án khả thi tài chính [C].

PHỤ LỤC B: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHI TIẾT

B.1. Thị trường CNC Toàn cầu

B.1.1. Quy mô Thị trường

Chỉ số	2023	2028 (dự báo)	CAGR
Thị trường CNC toàn cầu	97,20 tỷ USD	152,80 tỷ USD	9,5%
Thị trường CNC Đông Nam Á	6,50 tỷ USD	11,20 tỷ USD	11,5%
MRO/Outsourcing CNC Việt Nam	0,35 tỷ USD	0,70 tỷ USD	15,0%

[B — Nguồn: Mordor Intelligence, Grand View Research, MarketsandMarkets 2024]

B.1.2. Nhu cầu CNC từ FDI tại Việt Nam

Ngành FDI	Giá trị nhập khẩu linh kiện CNC (M USD/năm)	Số nhà máy tại VN
Samsung (Điện tử)	80-120	6 nhà máy
Intel (Bán dẫn)	30-50	1 nhà máy (mở rộng)
Bosch / Continental (Ô tô)	25-40	3-4 nhà máy
Jabil / Foxconn (EMS)	40-60	4-5 nhà máy
Nidec (Motor)	20-35	3 nhà máy
Canon (Quang học)	15-25	2 nhà máy
Tổng ước tính	295-455	25-30

Cơ hội localization cho Mekong: 2-5% thị phần = 6-23 M USD/năm [A].

B.1.3. Lợi thế Blue Ocean — AS9100

Yếu tố	Mekong (Dự kiến)	Đối thủ VN hiện tại
Chứng nhận AS9100 Rev D	Có (target 2030)	Không
CNC 5 trục đồng thời	Có (DMG MORI + Makino)	Hạn chế (chủ yếu 3 trục)
Dung sai ≤ 3 μm	Có	10-20 μm
Vật liệu Titan/Inconel	Có	Hạn chế
CMM Lab (Hexagon + Zeiss)	Có	Thường thuê ngoài
Rào cản gia nhập	~100M USD + 5 năm	—

B.2. Thị trường Datacenter Việt Nam

B.2.1. Quy mô và Tăng trưởng

Chỉ số	2023	2028 (dự báo)	CAGR
Thị trường DC Việt Nam	1,10 tỷ USD	4,50 tỷ USD	32,5%
Số MW IT Load	150 MW	400+ MW	—
GPU-as-a-Service toàn cầu	3,20 tỷ USD	25,00 tỷ USD	57%

[B — Nguồn: Cushman & Wakefield, Structure Research, Arizton 2024]

B.2.2. Đối thủ Cạnh tranh Chính

Nhà cung cấp	MW IT	Tier	GPU Offering	Phân khúc
Viettel IDC	40+ MW	III	Hạn chế	Enterprise VN
FPT Data Center	20+ MW	III	Có (GreenDC)	Enterprise + Cloud
CMC DC	10+ MW	III	Không	Enterprise VN
NTT Vietnam	15+ MW	III+	Hạn chế	FDI/Telco
Mekong MACC	2,5 MW	III	Chuyên GPU AI/HPC	AI + FDI + KCNC

Mekong nhỏ hơn nhưng **chuyên biệt hóa cho AI/HPC** và tận dụng **vị trí KCNC** (gần khách hàng R&D/bán dẫn) — khác biệt hóa thay vì cạnh tranh trực tiếp [A].

B.3. Thị trường IoT Công nghiệp (IIoT)

B.3.1. TAM/SAM/SOM

Phân khúc	TAM	SAM	SOM (Y5)
IIoT Đông Nam Á	15,00 tỷ USD	—	—
IIoT Gateway Việt Nam	200 M USD	50 M USD	5-8 M USD
Robot AMR/AGV Việt Nam	80 M USD	20 M USD	2-3 M USD
IoT Cloud SaaS Việt Nam	100 M USD	30 M USD	2-3 M USD
Tổng SOM IIoT (Y5)			9-14 M USD

[A+B — TAM từ IoT Analytics, SOM là ước tính nội bộ]

PHỤ LỤC C: MẪU VĂN BẢN PHÁP LÝ

C.1. Mẫu Công văn Đề xuất Mở rộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

CÔNG VĂN ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Tên đơn vị: Công ty TNHH Mekong Technology **Số IRC:** [Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư] **Ngày cấp:** [Ngày cấp IRC] **Trụ sở:** Khu Công nghệ cao TP.HCM, Quận 9 (TP. Thủ Đức), TP.HCM **Người đại diện:** [Họ tên Tổng Giám đốc]
Điện thoại: [Số điện thoại] — **Email:** [Email]

I. Hiện trạng Dự án

Công ty TNHH Mekong Technology được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số [...] ngày [...], với nội dung dự án ban đầu: - **Tên dự án:** Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất IIoT Gateway và Robot Tự hành - **Vốn đầu tư ban đầu:** 20.000.000 USD (Hai mươi triệu đô la Mỹ) - **Diện tích lô đất:** 1 ha (10.000 m²), 1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m² - **Mục tiêu:** Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất IIoT Gateway và Robot phục vụ công nghiệp

Sau quá trình nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược phát triển, Công ty nhận thấy nhu cầu cấp bách mở rộng phạm vi hoạt động để tối đa hóa giá trị sử dụng đất và đóng góp vào hệ sinh thái công nghệ cao tại KCNC.

II. Nội dung Đề xuất Mở rộng

Công ty kính đề xuất **điều chỉnh dự án đầu tư** theo Điều 41, Luật Đầu tư 2020, với các nội dung chính:

a) Bổ sung 2 trụ cột hoạt động mới:

Trụ cột	Tên	Diện tích	Mô tả
2	Trung tâm Chế tạo Linh kiện Siêu Chính xác (MPMC)	4.000 m ²	Gia công CNC 5 trục, phục vụ FDI bán dẫn, ô tô, hàng không
3	Trung tâm Hạ tầng Điện toán Đám mây AI (MACC)	3.000 m ²	Datacenter Tier III, GPU-as-a-Service, Colocation

b) Điều chỉnh vốn đầu tư: - Từ: 20.000.000 USD → **Đến: 47.500.000 USD** (tăng 27.500.000 USD) - Nguồn: Vốn CSH 34.970.000 USD (73,6%) + Vay NH 9.500.000 USD (20,0%) + Khác 3.030.000 USD (6,4%)

c) Bổ sung mã ngành kinh doanh: - 6311, 6312, 6201, 2592, 2599, 6110, 6120

d) Phân kỳ đầu tư: - Phase 1 (2025-2027): 28.900.000 USD — IoT/Robot + CNC cơ bản (15 máy) + DC hạ tầng - Phase 2 (2028-2030): 18.600.000 USD — CNC mở rộng (28 máy) + DC thương mại (100 Rack)

III. Cam kết

Công ty cam kết: 1. Đảm bảo nguồn vốn thực hiện đúng tiến độ 2. Tuân thủ mọi quy định pháp luật về đầu tư, môi trường, PCCC, lao động 3. Hoàn thành ĐTM và thủ tục PCCC trước khi khởi công 4. Duy trì tiêu chuẩn R&D ≥ 5% doanh thu 5. Tạo 250-300 việc làm chất lượng cao

IV. Hồ sơ Đính kèm

- 1. Bản sao IRC hiện tại
- 2. Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4 (Mẫu 2)
- 3. Đề án mở rộng chi tiết (văn bản này)
- 4. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất
- 5. Giấy xác nhận nguồn vốn
- 6. Sơ đồ mặt bằng dự kiến

Kính mong Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM xem xét và chấp thuận đề xuất mở rộng nêu trên.

Trân trọng kính chào.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CÔNG TY TNHH MEKONG TECHNOLOGY

(Ký tên, đóng dấu)

Tổng Giám đốc

C.2. Mẫu Phụ lục Bổ sung Mẫu 1.4

(Tóm tắt — Chi tiết đầy đủ tại Phụ lục D)

PHỤ LỤC BỔ SUNG — MẪU ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ (Mẫu 1.4)

Phần I — Thông tin Chung (Điều chỉnh)

Mục	Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Tên dự án	TT NC&SX IoT Gateway và Robot	Mekong Technology Hub
Vốn đầu tư	20.000.000 USD	47.500.000 USD

Mục	Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Ngành nghề	2620, 2610, 7210	+ 6311, 6312, 6201, 2592, 2599, 6110, 6120
Phạm vi	IoT + Robot	IoT + Robot + CNC + Datacenter

Phần II — Sản phẩm Bổ sung

Trụ cột 2 — CNC/MPMC:

Sản phẩm	Sản lượng/năm	Doanh thu (M USD)	VA (%)
Linh kiện khuôn mẫu bán dẫn	5.000	2,50	45%
Linh kiện hàng không vũ trụ	2.000	3,00	50%
Linh kiện ô tô điện	20.000	4,00	35%
Dịch vụ gia công khác	5.000	1,50	40%
Tổng CNC	32.000	11,00	42%

Trụ cột 3 — Datacenter/MACC:

Sản phẩm/Dịch vụ	Quy mô	Doanh thu (M USD)	VA (%)
Colocation (50 Rack)	5-10 kW/rack	2,20	55%
GPU-as-a-Service (50 Rack)	15-30 kW/rack	5,00	65%
MekongOS IoT Cloud	2.000 thuê bao	3,00	70%
Kết nối + Bảo mật	Managed services	1,30	60%
Tổng DC		11,50	60%

Phần III — Tài chính (Tóm tắt)

Chỉ số	Giá trị
Tổng vốn đầu tư	47.500.000 USD
CSH	34.970.000 USD (73,6%)
Vay (từ Y10)	12.530.000 USD (26,4%)
Doanh thu ổn định (từ Y15+)	30-32 M USD/năm
NPV (50Y, WACC 12%)	1.500.000 USD
NPV (20Y, WACC 12%)	-5.300.000 USD
IRR (50Y)	13,0%
Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	13 năm

PHỤ LỤC D: DANH MỤC MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CHI TIẾT

D.1. Thiết bị CNC (28 Máy)

TT	Máy	Hãng	Model	Số lượng	Phase	Hành trình (mm)	Tốc độ trục chính	Giá/máy (K USD)
1	Phay 5 trục	DMG MORI	DMU 65 monoBLOCK	3	1	650×520×475	20.000 rpm	550-650
2	Phay 5 trục	DMG MORI	DMU 80P duoBLOCK	2	2	800×650×550	18.000 rpm	750-850
3	Phay 5 trục	Doosan	DVF 5000	5	1	500×450×400	12.000 rpm	320-380
4	Phay 5 trục	Doosan	DVF 5000	5	2	500×450×400	12.000 rpm	320-380
5	HMC (phay ngang)	Makino	a51nx	4	1	560×640×560	14.000 rpm	300-360
6	HMC (phay ngang)	Makino	a61nx	4	2	630×750×630	12.000 rpm	350-420
7	Tiện CNC	Doosan	Puma TL2000	3	1	Ø350×650	4.500 rpm	120-160
8	Wire EDM	Mitsubishi	MV2400R	2	1+2	600×400×310	—	140-180
	Tổng			28				9.590-11.410

D.2. Thiết bị QA/QC

TT	Thiết bị	Hãng	Model	Số lượng	Giá (K USD)
1	CMM 3D	Hexagon	GLOBAL S 7.10.7	1	180-250
2	CMM 3D	Zeiss	PRISMO Ultra	1	200-280
3	Laser Scanner	Creaform	MetraSCAN 3D	1	60-85
4	Surface Roughness Tester	Mitutoyo	SJ-410	2	15-25
5	Measuring Microscope	Keyence	VHX-7000	1	35-50
6	Hardness Tester	Mitutoyo	HV-100	1	10-15
	Tổng QA/QC				530-750

D.3. Thiết bị Datacenter

TT	Thiết bị	Hãng/Spec	Số lượng	Giá (K USD)
1	Server Rack 42U	Rittal/APC	100	200-300
2	PDU (metered+switched)	Raritan/ServerTech	200	100-150

TT	Thiết bị	Hãng/Spec	Số lượng	Giá (K USD)
3	UPS 1.000 kVA (LiFePO4)	Eaton/Schneider	4	800-1.200
4	Diesel Generator 2.500 kVA	Cummins/CAT	2	600-800
5	Chiller 350 kW	Daikin/Carrier	3	300-450
6	CDU (Coolant Distribution)	Vertiv/Schneider	4	200-400
7	In-Row Cooling Unit	Schneider	6	120-180
8	RDHX (Rear-Door HEX)	CoolIT/Schneider	50	250-400
9	Core Switch (100GbE)	Cisco Nexus 93180YC	2	80-120
10	ToR Switch (25GbE)	Cisco Nexus 93108TC	8	80-120
11	Firewall (NGFW)	Palo Alto PA-5250	2	100-160
12	DCIM Software	Schneider EcoStruxure	1	30-50
13	CCTV + Access Control	Hikvision + HID	1 hệ thống	80-120
	Tổng DC Equipment			2.940-4.450

D.4. Thiết bị GPU (DC Zone 2)

TT	GPU	Hãng	Số lượng	Giá/unit (K USD)	Tổng (K USD)	Mô hình
1	NVIDIA H100 SXM5 80GB	NVIDIA	32	30-40	960-1.280	Buy
2	NVIDIA A100 80GB	NVIDIA	16	15-20	240-320	Buy
3	DGX H100 System (8xH100)	NVIDIA	2	250-350	500-700	Lease option
	Tổng GPU Phase 1				1.700-2.300	

[A — Giá GPU có thể thay đổi đáng kể. NVIDIA roadmap: H200 (2025), B100 (2025), B200 (2026). Chiến lược hybrid: Buy 40% + Lease 60% để giảm rủi ro công nghệ lỗi thời]

PHỤ LỤC E: THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ CƠ QUAN PHỐI HỢP

TT	Cơ quan	Thẩm quyền	Địa chỉ	Ghi chú
1	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao	Phê duyệt dự án tại KCNC, GP Xây	Lô I2, đường D1, KCNC, TP. Thủ Đức	Đầu mối chính

TT	Cơ quan	Thẩm quyền	Địa chỉ	Ghi chú
	TP.HCM	dựng		
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Điều chỉnh IRC, đăng ký ngành nghề	32 Lê Thánh Tôn, Quận 1	Thẩm quyền IRC
3	Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM	ĐTM, Giấy phép Môi trường	63 Lý Tự Trọng, Quận 1	ĐTM
4	Cục Viễn thông (Bộ TT&TT)	Giấy phép Viễn thông	18 Nguyễn Du, Quận 1, Hà Nội	DC license
5	C07 / PC07 Công an TP.HCM	Thẩm duyệt + Nghiệm thu PCCC	268 Trần Hưng Đạo, Quận 1	PCCC
6	Sở Lao động TB&XH TP.HCM	Giấy phép lao động chuyên gia NN	159 Pasteur, Quận 3	Work permit
7	Cục Sở hữu Trí tuệ	Đăng ký nhãn hiệu, bằng sáng chế	386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	IP
8	NATEC (Bộ KH&CN)	Hỗ trợ R&D, grant	113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN	R&D fund

PHỤ LỤC F: BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

Phụ lục F thực hiện theo Rule 3 (AGENT_RULES) — kiểm tra tính nhất quán số liệu xuyên suốt tài liệu.

F.1. Đối chiếu Số liệu Chính

Số liệu	Giá trị chuẩn	Xuất hiện tại	Nhất quán
CAPEX	47,50 M USD	Trang bìa, Mục 5.1, 9.1, C.2	Da
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50 M USD	Mục 5.6.1, 9.1.1, A.5, C.2	Da
NPV (20Y, WACC 12%)	-5,30 M USD	Mục 5.4.2, 5.6.1, A.5	Da
IRR (50Y)	13,0%	Mục 5.6.1, 9.1.1, A.5, C.2	Da
Revenue Y10	14,50 M USD	Mục 5.2.1, 5.2.2	Da
Revenue Y15	32,00 M USD	Mục 5.2.1, 9.1.1	Da
Revenue 15Y tích lũy	~165 M USD	Mục 5.2.1, 9.1.1	Da
Strategic Value	20,32 M USD	Mục 5.7.1, 9.1.1	Da
Von CSH	34,97 M USD	Mục 5.1.2, 5.1.3, C.1	Da
Vay	12,53 M USD (từ Y10)	Mục 5.11.1, A.4	Da
PUE	1,32 (trung bình)	Mục 2.4, 4.2.3, 9.1.1	Da

Số liệu	Giá trị chuẩn	Xuất hiện tại	Nhất quán
Headcount (steady Y15)	~300	Mục 7.1.2, 9.1.1	Da
VA trung bình	42%	Mục 2.1, 9.1.1	Da
CNC machines	28 máy	Mục 2.3.2, 4.3, D.1	Da
DC Racks	100	Mục 2.4.1, 4.2.1, D.3	Da
Uu dài thuê	~6,0 M USD	Mục 5.7.1, 9.1.1	Da
Land rent exemption	~1,32 M USD NPV	Mục 5.7.1	Da
PCCC CAPEX	~1.550 K USD	Mục 4.7.2	Da
Môi trường 10Y	~2.427 K USD	Mục 6.3.3	Da
Pháp lý	170-340 K USD	Mục 6.2.3	Da
M&E BOQ	~10.355 K USD	Mục 4.5.1, 4.5.2	Da

F.2. Nhân Du liệu

Nhan	Y nghĩa	Số lượng trong tài liệu
[C] — Calculated	Số liệu tính toán, có công thức	~45
[B] — Benchmarked	Số liệu tham chiếu thị trường	~20
[A] — Assumed	Số liệu giả định, có lý do	~15

PHỤ LỤC G: MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CHI TIẾT THEO TỪNG KHỐI (B.U)

G.1. Doanh thu Chi tiết — B.U #1: CNC Outsourcing (10 năm)

Chi tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Số máy hoạt động [A]	5	12	15	20	25	25	25	25	25	25
Giờ khả dụng/máy/năm [B]	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
Machine utilization [A]	15%	35%	55%	65%	72%	75%	76%	77%	78%	78%
Tổng giờ bán được [C]	4.680	26.208	51.480	81.120	112.320	117.000	118.560	120.120	121.680	121.680
Giá TB (USD/giờ) [B]	48,0	50,5	53,2	55,8	57,2	58,6	60,1	61,6	63,1	64,7

Chi tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Revenue CNC (M USD) [C]	0,22	1,32	2,74	4,53	6,42	6,86	7,13	7,40	7,68	7,87

Giá tăng 2,5%/năm [A] từ baseline 48 USD/h [B] (blend: nhôm 45 / thép 55 / inox 65 / titan 100)

G.2. Doanh thu Chi tiết — B.U #2: Datacenter & AI Compute (10 năm)

G.2.1. Colocation Zone

Chi tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Racks khả dụng [A]	15	30	30	40	50	50	50	50	50	50
Occupancy [A]	10%	25%	50%	60%	70%	75%	78%	80%	82%	82%
Racks cho thuê [C]	2	8	15	24	35	38	39	40	41	41
RPR Colo (USD/tháng) [B]	1.200	1.236	1.273	1.311	1.351	1.391	1.433	1.476	1.520	1.566
Revenue Colo (M USD) [C]	0,03	0,12	0,23	0,38	0,57	0,63	0,67	0,71	0,75	0,77

G.2.2. AI/HPC Zone

Chi tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Racks khả dụng [A]	10	20	20	30	50	50	50	50	50	50
Occupancy [A]	5%	20%	40%	50%	60%	68%	72%	75%	78%	78%
Racks cho thuê [C]	1	4	8	15	30	34	36	38	39	39
RPR AI/HPC (USD/tháng) [B]	3.800	3.610	3.430	3.258	3.095	2.940	2.793	2.654	2.521	2.395
Revenue AI/HPC (M USD) [C]	0,05	0,17	0,33	0,59	1,11	1,20	1,21	1,21	1,18	1,12

G.2.3. GPU-as-a-Service

Chi tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
GPU-hours sold/month [A]	0	2.160	5.184	8.640	12.960	15.552	17.280	18.144	19.008	19.008

Chỉ tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Rate (USD/GPU-h) [B]	—	4,20	3,57	3,03	2,58	2,19	1,86	1,58	1,35	1,14
Revenue GPU (M USD) [C]	—	0,11	0,22	0,31	0,40	0,41	0,39	0,34	0,31	0,26

GPU pricing decline 15%/năm [B] phản ánh xu hướng giảm giá compute khi supply tăng.

G.2.4. SaaS MekongOS Cloud

Chỉ tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Thuê bao [A]	20	80	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600
ARPU (USD/tháng) [C]	150	180	200	220	240	250	250	250	250	250
Churn rate [A]	8%	7%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Revenue SaaS (M USD) [C]	0,00	0,02	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48

G.2.5. Tổng Revenue DC

Năm	Colo	AI/HPC	GPU	SaaS	Tổng DC
2025	0,03	0,05	0,00	0,00	0,08
2026	0,12	0,17	0,11	0,02	0,42
2027	0,23	0,33	0,22	0,06	0,84
2028	0,38	0,59	0,31	0,12	1,40
2029	0,57	1,11	0,40	0,18	2,26
2030	0,63	1,20	0,41	0,24	2,48
2031	0,67	1,21	0,39	0,30	2,57
2032	0,71	1,21	0,34	0,36	2,62
2033	0,75	1,18	0,31	0,42	2,66
2034	0,77	1,12	0,26	0,48	2,63
10Y	4,86	8,17	2,44	2,18	17,96

G.3. Doanh thu Chi tiết — B.U #3: IoT/Robot (10 năm)

Chi tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IoT Gateway (units) [A]	120	300	550	750	950	1.100	1.200	1.320	1.400	1.450
ASP Gateway (USD) [B]	2.850	2.780	2.650	2.580	2.520	2.460	2.400	2.350	2.300	2.250
Robot AMR (units) [A]	3	8	15	22	30	38	45	50	55	58
ASP AMR (USD) [B]	28.500	27.800	26.500	25.500	24.800	24.200	23.600	23.000	22.500	22.000
Service/Maintenance (M) [A]	0,01	0,04	0,10	0,18	0,28	0,38	0,48	0,56	0,62	0,68
Revenue IoT/Robot (M) [C]	0,44	1,09	1,96	2,55	3,37	3,92	4,44	4,88	5,20	5,54

G.4. Tổng hợp Doanh thu & Tỷ trọng Theo B.U

Lưu ý V2.1: Bảng G.1-G.3 và G.4 dưới đây thể hiện mô hình unit economics **steady-state** từ Đề án gốc (3 B.U hoạt động đồng thời từ Y1). Trong V2.1, lộ trình triển khai tuần tự: IoT từ Y6, CNC từ Y8, DC từ Y11. Doanh thu thực tế V2.1: Y6=2,50M, Y10=14,50M, Y15=32,00M, tích lũy 15Y ~165M USD. Bảng dưới giữ nguyên làm tham chiếu unit economics, không phải timeline dự báo chính thức.

Năm	CNC (M)	DC (M)	IoT (M)	Tổng (M)	% CNC	% DC	% IoT
2025	0,22	0,08	0,44	0,74	30%	11%	59%
2026	1,32	0,42	1,09	2,83	47%	15%	38%
2027	2,74	0,84	1,96	5,54	49%	15%	36%
2028	4,53	1,40	2,55	8,48	53%	17%	30%
2029	6,42	2,26	3,37	12,05	53%	19%	28%
2030	6,86	2,48	3,92	13,26	52%	19%	29%
2031	7,13	2,57	4,44	14,14	50%	18%	32%
2032	7,40	2,62	4,88	14,90	50%	18%	32%
2033	7,68	2,66	5,20	15,54	49%	17%	34%
2034	7,87	2,63	5,54	16,04	49%	16%	35%
Tổng 10Y	52,17	17,96	33,39	103,52	50%	17%	33%

Tổng 103,52M USD là doanh thu steady-state 10 năm tham chiếu. Doanh thu V2.1 chính thức: ~165M USD tích lũy 15 năm (xem Phần V, Mục 5.2.1) [C].

G.5. P&L Theo Từng B.U — BASE CASE (Conservative)

V2.1 NOTE: Bảng P&L per-BU dưới đây dựa trên mô hình cũ (steady-state 10Y, doanh thu từ Y1). Giữ làm tài liệu tham chiếu unit economics. Số liệu V2.1 chính thức: xem Phụ lục A.2 (P&L 20Y V2.1) và \$5.4 (Revenue Projection).

G.5.1. B.U #1 — CNC Outsourcing P&L

(Đơn vị: M USD)

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
Revenue	0,22	1,32	2,74	4,53	6,42	6,86	7,13	7,40	7,68	7,87	52,17
COGS (62%) [B]	(0,14)	(0,82)	(1,70)	(2,81)	(3,98)	(4,25)	(4,42)	(4,59)	(4,76)	(4,88)	(32,35)
Gross Profit	0,08	0,50	1,04	1,72	2,44	2,61	2,71	2,81	2,92	2,99	19,82
Gross Margin	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%
Opex (18%) [A]	(0,04)	(0,24)	(0,49)	(0,82)	(1,16)	(1,23)	(1,28)	(1,33)	(1,38)	(1,42)	(9,39)
EBITDA	0,04	0,26	0,55	0,90	1,28	1,38	1,43	1,48	1,54	1,57	10,43
D&A	(0,10)	(0,42)	(0,68)	(1,02)	(1,28)	(1,28)	(1,28)	(1,25)	(1,15)	(1,08)	(9,54)
EBIT	(0,06)	(0,16)	(0,13)	(0,12)	0,00	0,10	0,15	0,23	0,39	0,49	0,89

G.5.2. B.U #2 — Datacenter & AI Compute P&L

(Đơn vị: M USD)

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
Revenue	0,08	0,42	0,84	1,40	2,26	2,48	2,57	2,62	2,66	2,63	17,96
COGS (45%) [B]	(0,04)	(0,19)	(0,38)	(0,63)	(1,02)	(1,12)	(1,16)	(1,18)	(1,20)	(1,18)	(8,08)
Gross Profit	0,04	0,23	0,46	0,77	1,24	1,36	1,41	1,44	1,46	1,45	9,88
Gross Margin	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Opex (20%) [A]	(0,02)	(0,08)	(0,17)	(0,28)	(0,45)	(0,50)	(0,51)	(0,52)	(0,53)	(0,53)	(3,59)
EBITDA	0,02	0,15	0,29	0,49	0,79	0,86	0,90	0,92	0,93	0,92	6,29

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
D&A	(0,15)	(0,65)	(0,95)	(1,38)	(1,82)	(2,05)	(2,12)	(2,18)	(2,25)	(2,30)	(15,85)
EBIT	(0,13)	(0,50)	(0,66)	(0,89)	(1,03)	(1,19)	(1,22)	(1,26)	(1,32)	(1,38)	(9,56)

Nhận xét DC: Gross margin cao (55%) nhưng EBIT âm do khấu hao GPU/Server nhanh (3-4 năm). EBITDA margin ~30-36% cho thấy hoạt động operational hiệu quả. Đặc thù ngành DC — AWS, Equinix đều báo cáo EBITDA, không dùng Net Income.

G.5.3. B.U #3 — IoT/Robot P&L

(Đơn vị: M USD)

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
Revenue	0,44	1,09	1,96	2,55	3,37	3,92	4,44	4,88	5,20	5,54	33,39
COGS (52%) [B]	(0,23)	(0,57)	(1,02)	(1,33)	(1,75)	(2,04)	(2,31)	(2,54)	(2,70)	(2,88)	(17,36)
Gross Profit	0,21	0,52	0,94	1,22	1,62	1,88	2,13	2,34	2,50	2,66	16,03
Gross Margin	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
Opex (22%) [A]	(0,10)	(0,24)	(0,43)	(0,56)	(0,74)	(0,86)	(0,98)	(1,07)	(1,14)	(1,22)	(7,35)
EBITDA	0,11	0,28	0,51	0,66	0,88	1,02	1,15	1,27	1,36	1,44	8,68
D&A	(0,12)	(0,25)	(0,32)	(0,35)	(0,38)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,38)	(3,40)
EBIT	(0,01)	0,03	0,19	0,31	0,50	0,62	0,75	0,87	0,96	1,06	5,28

G.6. P&L Tổng hợp — BASE CASE

V2.1 NOTE: P&L tổng hợp dựa trên mô hình cũ (10Y, doanh thu từ Y1). Revenue 10Y = 103,52M là steady-state reference. V2.1: Revenue 15Y = ~165M, xem Phụ lục A.2.

(Đơn vị: Triệu USD)

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
Revenue	0,74	2,83	5,54	8,48	12,05	13,26	14,14	14,90	15,54	16,04	103,52
Total COGS	(0,41)	(1,57)	(3,10)	(4,76)	(6,75)	(7,41)	(7,89)	(8,31)	(8,67)	(8,94)	(57,79)
Gross Profit	0,33	1,26	2,44	3,72	5,30	5,85	6,25	6,59	6,87	7,10	45,73

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
Gross Margin	45%	45%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
Total Opex	(0,58)	(1,17)	(1,90)	(2,65)	(3,57)	(3,89)	(4,14)	(4,35)	(4,53)	(4,69)	(31,47)
EBITDA	(0,25)	0,09	0,54	1,07	1,73	1,96	2,11	2,24	2,34	2,41	14,26
EBITDA Margin	-34%	3%	10%	13%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	14%
Total D&A	(0,45)	(1,50)	(2,17)	(3,00)	(3,76)	(4,03)	(4,10)	(4,13)	(4,10)	(4,06)	(31,30)
EBIT	(0,67)	(1,36)	(1,58)	(1,88)	(1,97)	(2,01)	(1,93)	(1,83)	(1,70)	(1,59)	(16,51)
Interest expense	(0,12)	(0,42)	(0,78)	(0,92)	(0,85)	(0,75)	(0,65)	(0,52)	(0,38)	(0,25)	(5,64)
EBT	(0,79)	(1,78)	(2,36)	(2,80)	(2,82)	(2,76)	(2,58)	(2,35)	(2,08)	(1,84)	(22,15)
Tax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net Income	(0,79)	(1,78)	(2,36)	(2,80)	(2,82)	(2,76)	(2,58)	(2,35)	(2,08)	(1,84)	(22,15)

EBIT và Net Income âm do khấu hao lớn (31,3M trên 47,5M CAPEX). EBITDA dương từ năm 2 cho thấy hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền thực. Đây là đặc thù ngành CAPEX-intensive (Datacenter + CNC). Đánh giá theo EBITDA và Free Cash Flow, không Net Income kế toán.

G.7. Bảng Cân đối Kế toán Dự kiến (Balance Sheet)

V2.1 NOTE: Balance Sheet dựa trên mô hình cũ (vay từ Y0, doanh thu từ Y1). V2.1: Vốn CSH 100% Y0-Y9, vay 12,53M từ Y10. Xem §5.12 cho Balance Sheet V2.1.

(Đơn vị: Triệu USD)

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
TÀI SẢN										
Tiền & tương đương	2,15	1,82	0,95	1,28	2,85	4,42	6,25	8,18	10,35	12,58
Phải thu	0,12	0,47	0,92	1,41	2,01	2,21	2,36	2,48	2,59	2,67
Hàng tồn kho	0,08	0,25	0,45	0,62	0,85	0,92	0,98	1,02	1,05	1,08
TSNH khác	0,15	0,18	0,20	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tổng TSNH	2,50	2,72	2,52	3,53	5,96	7,80	9,84	11,93	14,24	16,58

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
TSCĐ hữu hình (nguyên giá)	22,27	27,20	29,80	45,67	51,47	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82
Khấu hao lũy kế	(1,27)	(3,50)	(6,13)	(9,76)	(14,00)	(17,84)	(21,99)	(26,34)	(30,65)	(34,42)
TSCĐ ròng	21,00	23,70	23,67	35,91	37,47	33,98	29,83	25,48	21,17	17,40
TSCĐ vô hình	0,85	0,72	0,59	0,48	0,38	0,30	0,22	0,15	0,10	0,05
TỔNG TÀI SẢN	24,35	27,14	26,78	39,92	43,81	42,08	39,89	37,56	35,51	34,03
NỢ PHẢI TRẢ										
Phải trả NCC	0,18	0,55	0,85	1,15	1,52	1,62	1,68	1,72	1,75	1,78
Chi phí phải trả	0,10	0,22	0,35	0,48	0,62	0,68	0,72	0,75	0,78	0,80
Nợ dài hạn đến hạn	0,00	0,00	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,57
Tổng nợ ngắn hạn	0,28	0,77	3,04	3,47	3,98	4,14	4,24	4,31	4,37	4,15
Vay dài hạn	7,35	12,85	11,01	14,67	12,83	10,99	9,15	7,31	5,47	3,90
Nợ thuê tài chính	3,10	5,20	4,42	5,28	4,62	3,96	3,30	2,64	1,98	1,32
Tổng nợ dài hạn	10,45	18,05	15,43	19,95	17,45	14,95	12,45	9,95	7,45	5,22
TỔNG NỢ	10,73	18,82	18,47	23,42	21,43	19,09	16,69	14,26	11,82	9,37
VỐN CHỦ SỞ HỮU										
Vốn góp	14,41	16,10	18,10	28,30	35,18	35,79	35,99	36,10	36,49	37,46
Lợi nhuận giữ lại	(0,79)	(2,57)	(4,93)	(7,73)	(10,55)	(13,31)	(15,89)	(18,24)	(20,32)	(22,16)
Trợ cấp/Grant	0,00	0,40	0,80	1,43	2,25	3,01	3,10	3,10	3,10	3,10
Quỹ dự phòng khác	0,00	(5,61)	(5,66)	(5,50)	(4,50)	(2,50)	0,00	2,34	4,42	6,26

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
TỔNG VCSH	13,62	8,32	8,31	16,50	22,38	22,99	23,20	23,30	23,69	24,66
TỔNG NỢ + VCSH	24,35	27,14	26,78	39,92	43,81	42,08	39,89	37,56	35,51	34,03

G.8. Báo cáo Dòng tiền Hàng quý — 2 Năm đầu (2025-2026)

V2.1 NOTE: Dòng tiền quý dưới đây dựa trên mô hình cũ. V2.1: Y0-Y4 chỉ có chi (xây dựng), doanh thu đầu tiên Y6. Xem §5.7 cho Cash Flow V2.1.

(Đơn vị: Triệu USD)

Khoản mục	Q1/25	Q2/25	Q3/25	Q4/25	Q1/26	Q2/26	Q3/26	Q4/26
Dòng tiền Hoạt động								
Net Income	(0,25)	(0,22)	(0,18)	(0,14)	(0,52)	(0,48)	(0,42)	(0,36)
+ D&A	0,05	0,10	0,14	0,16	0,32	0,36	0,40	0,42
Thay đổi vốn lưu động	(0,08)	(0,04)	(0,03)	(0,05)	(0,12)	(0,08)	(0,06)	(0,09)
DT HĐ ròng	(0,28)	(0,16)	(0,07)	(0,03)	(0,32)	(0,20)	(0,08)	(0,03)
Dòng tiền Đầu tư								
CAPEX (thiết bị)	(3,50)	(2,80)	(2,15)	(1,75)	(2,85)	(1,95)	(1,45)	(0,95)
CAPEX (xây dựng)	(2,80)	(1,50)	(0,80)	(0,45)	(0,35)	(0,20)	(0,10)	(0,05)
DT ĐT ròng	(6,30)	(4,30)	(2,95)	(2,20)	(3,20)	(2,15)	(1,55)	(1,00)
Dòng tiền Tài chính								
Vốn góp CSH	4,50	2,50	1,20	0,00	0,00	2,00	0,00	3,41

Khoản mục	Q1/25	Q2/25	Q3/25	Q4/25	Q1/26	Q2/26	Q3/26	Q4/26
Giải ngân vay	2,50	1,50	1,35	1,00	2,50	1,50	1,00	1,00
Giải ngân thuê TC	0,80	0,60	0,50	0,40	0,55	0,40	0,35	0,30
Grants received	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Trả nợ gốc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trả lãi	(0,02)	(0,03)	(0,04)	(0,03)	(0,08)	(0,10)	(0,12)	(0,12)
DT TC ròng	7,78	4,57	3,01	1,37	3,07	3,90	1,33	4,69
Dòng tiền ròng	1,20	0,11	(0,01)	(0,86)	(0,45)	1,55	(0,30)	3,66
Tiền lũy kế	1,20	1,31	1,30	0,44	(0,01)	1,54	1,24	4,90

Điểm cần lưu ý: Q1/2026 — Tiền lũy kế gần 0 (-0,01M). Nguyên nhân: CAPEX Phase 1 tiếp tục, equity injection chưa vào quý này. Giải pháp: Đẩy nhanh giải ngân hoặc rút drawdown debt sớm hơn.

G.9. Báo cáo Dòng tiền Hàng năm — 10 Năm

V2.1 NOTE: Dòng tiền 10 năm dựa trên mô hình cũ (vay 17,85M từ Y0). V2.1: CSH 34,97M Y0-Y9, vay 12,53M từ Y10. Xem Phụ lục A.5 cho FCFF V2.1.

(Đơn vị: Triệu USD)

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
DT Hoạt động											
EBITDA	(0,22)	0,14	0,59	1,12	1,79	2,02	2,17	2,30	2,40	2,47	14,79
Thay đổi WC	(0,20)	(0,35)	(0,28)	(0,22)	(0,18)	(0,08)	(0,06)	(0,05)	(0,04)	(0,03)	(1,49)
Thuế nộp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT HĐ ròng	(0,42)	(0,21)	0,31	0,90	1,61	1,94	2,11	2,25	2,36	2,44	13,30

Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Tổng
DT Đầu tư											
CAPEX	(15,75)	(7,90)	(2,60)	(15,87)	(5,80)	(0,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(48,27)
DT Tài chính											
Vốn góp CSH	8,20	5,41	2,00	10,20	6,88	0,61	0,20	0,11	0,39	0,97	34,97
Giải ngân vay	6,35	6,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Giải ngân thuê TC	2,30	1,60	0,52	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
Grants received	0,00	0,40	0,40	0,63	0,82	0,76	—	—	—	—	3,01
Trả nợ gốc	0,00	0,00	(1,84)	(1,84)	(1,84)	(1,84)	(1,84)	(1,84)	(1,84)	(1,84)	(14,72)
Trả thuê TC	0,00	(0,50)	(0,78)	(0,64)	(0,66)	(0,66)	(0,66)	(0,66)	(0,66)	(0,66)	(5,22)
Trả lãi vay	(0,12)	(0,42)	(0,78)	(0,92)	(0,85)	(0,75)	(0,65)	(0,52)	(0,38)	(0,25)	(5,64)
DT TC ròng	16,73	12,49	(0,48)	14,43	4,35	(1,88)	(2,95)	(2,91)	(2,49)	(1,78)	36,17
Dòng tiền ròng	0,56	4,38	(2,77)	(0,54)	0,16	(0,29)	(0,84)	(0,66)	(0,13)	0,66	1,20
Tiền đầu kỳ	1,59	2,15	6,53	3,76	3,22	3,38	3,09	2,25	1,59	1,46	
Tiền cuối kỳ	2,15	6,53	3,76	3,22	3,38	3,09	2,25	1,59	1,46	2,12	

Chênh lệch CAPEX 48,27M vs 47,50M = 0,77M — bao gồm replacement CAPEX (~0,35M), contingency rounding (~0,25M), closing costs (~0,17M). Tài trợ từ operational cash flow.

G.10. Phân tích Độ nhạy Chi tiết

V2.1 NOTE: Tất cả phân tích độ nhạy dưới đây đã cập nhật theo mô hình V2.1 (50 năm, WACC 12%, doanh thu đầu tiên Y6). Base case: NPV(50Y) = 1,50M, IRR(50Y) = 13,0%, Revenue 15Y = ~165M USD.

G.10.1. Nhạy cảm với Revenue (±30%)

Base: NPV(50Y, 12%) = 1,50M

Revenue Scenario	Revenue 15Y (M)	EBITDA 15Y (M)	NPV 50Y (M)	IRR 50Y
-30%	115,50	22,00	(12,50)	8,5%
-20%	132,00	28,00	(7,80)	10,2%
-10%	148,50	34,00	(3,15)	11,6%
Base	165,00	40,00	1,50	13,0%
+10%	181,50	46,00	6,20	14,5%
+20%	198,00	52,00	10,80	15,8%
+30%	214,50	58,00	15,40	17,2%

G.10.2. Nhạy cảm với CAPEX Overrun

CAPEX Scenario	Tổng CAPEX (M)	NPV 50Y (M)	IRR 50Y
Base	47,50	1,50	13,0%
+10%	52,25	(2,25)	12,2%
+20%	57,00	(5,90)	11,3%
+30%	61,75	(9,60)	10,4%

CAPEX overrun >5% đẩy NPV âm trong mô hình V2.1. CAPEX control là yếu tố sống còn.

G.10.3. Nhạy cảm với Machine Utilization CNC

Utilization (steady)	CNC Rev Y15 (M)	CNC EBITDA Y15 (M)	CNC NPV 20Y (M)
50%	7,20	1,15	(3,80)
65%	9,36	1,60	(0,50)
75% (Base)	10,80	2,15	2,10
85%	12,24	2,50	4,75

G.10.4. Nhạy cảm với DC Occupancy

Occupancy (steady)	DC Rev Y15 (M)	DC EBITDA Y15 (M)	DC NPV 20Y (M)
50%	4,20	1,40	(8,50)
75% (Base)	6,00	2,10	(4,20)
85%	6,72	2,45	(2,30)
90%	7,08	2,62	(1,40)

DC NPV âm trên 20 năm ở mọi mức occupancy. DC chỉ NPV dương trên 30+ năm nhờ renewal cycles. Coi là hạ tầng chiến lược dài hạn phù hợp thuê đất 50 năm.

G.10.5. Nhạy cảm với Delay

Delay Scenario	NPV 50Y (M)	IRR 50Y
On time (Base)	1,50	13,0%
Delay 12 tháng	(1,80)	12,0%
Delay 24 tháng	(5,50)	10,8%

V2.1: Do giai đoạn xây dựng đã kéo dài 5 năm, delay 12 tháng vẫn ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên buffer trong mỗi phase = 3–6 tháng giúp giảm thiểu rủi ro.

G.10.6. Ma trận Nhạy cảm 2 Chiều (Revenue x CAPEX)

NPV 50Y (M USD) — WACC 12%

Revenue CAPEX	-10%	Base	+10%	+20%
-20%	(3,20)	(7,80)	(12,30)	(16,90)
-10%	1,50	(3,15)	(7,65)	(12,20)
Base	6,15	1,50	(2,25)	(5,90)
+10%	10,85	6,20	2,55	(0,80)
+20%	15,55	10,80	7,15	3,50

“Vùng an toàn” (NPV > 0, 50Y): Revenue >= Base VÀ CAPEX <= Base, HOẶC Revenue >= +10% ở CAPEX +10%. Hẹp hơn V1 do 5 năm xây dựng không doanh thu.

G.11. Ba Kịch bản (Conservative / Base / Optimistic)

V2.1 NOTE: Cập nhật theo mô hình 50 năm, 5 phase, doanh thu đầu tiên Y6.

G.11.1. Giả định Chi tiết

Giả định	Conservative	Base	Optimistic	Đơn vị
CNC				
Số máy cuối cùng	20	28	35	máy
Machine utilization (cruising)	60%	75%	85%	%
Giá TB (steady)	50	57	65	USD/h
Timeline CNC vận hành	Y10	Y8	Y7	năm
Datacenter				
Tổng Racks	70	100	130	racks
Occupancy (cruising)	55%	75%	88%	%
DC vận hành	Y14	Y12	Y11	năm

Giả định	Conservative	Base	Optimistic	Đơn vị
IoT/Robot				
Revenue Y10 (M)	3,50	5,50	8,00	M USD
Growth rate (Y8+)	10%	15%	20%	%
Chung				
CAPEX overrun	+15%	0%	-5%	%
Delay xây dựng	18 tháng	0	0	tháng
WACC	14%	12%	10%	%

G.11.2. Kết quả 3 Kịch bản

Chỉ tiêu	Conservative	Base	Optimistic	Đơn vị
CAPEX	54,63	47,50	45,13	M USD
Revenue 15Y	115,50	165,00	220,00	M USD
Revenue Y15	22,00	32,00	45,00	M USD
EBITDA 15Y	22,00	40,00	62,00	M USD
EBITDA Margin (steady)	20%	28%	32%	%
NPV 50Y (WACC)	(6,50)	1,50	18,20	M USD
NPV 20Y (WACC)	(14,80)	(5,30)	5,80	M USD
IRR 50Y	10,5%	13,0%	17,5%	%
IRR 20Y	7,5%	9,5%	14,2%	%
Payback (Discounted, 50Y)	22,0	13,0	9,5	năm
Breakeven EBIT	Y11	Y8-Y9	Y7	năm

G.11.3. Probability-Weighted NPV

Kịch bản	Xác suất [A]	NPV 50Y (M)	Weighted NPV (M)
Conservative	25%	(6,50)	(1,63)
Base	50%	1,50	0,75
Optimistic	25%	18,20	4,55
Expected NPV	100%		3,68

[C] Expected NPV = 3,68M USD > 0, dự án đáng đầu tư khi xét xác suất có trọng số. Tuy nhiên, $P(NPV < 0)$ ở kịch bản Conservative = 25% cho thấy rủi ro không nhỏ. Monte Carlo chi tiết (\$5.9) cho $P(NPV > 0, 50Y) = 65\%$.

G.12. Bảng Khấu hao Chi tiết

V2.1 NOTE: Khấu hao dưới đây dựa trên mô hình cũ (thiết bị mua từ Y0). V2.1: Thiết bị IoT từ Y4, CNC từ Y5, DC từ Y7. Tổng D&A tương đương nhưng dịch chuyển sang phải 5 năm.

G.12.1. Nhóm 1: Khấu hao nhanh (3-5 năm) — GPU, Server, Storage

Năm	NBV đầu kỳ	Đầu tư mới	Khấu hao	NBV cuối kỳ
2025	0,00	5,60	(0,47)	5,13
2026	5,13	0,60	(1,45)	4,28
2027	4,28	0,00	(1,45)	2,83
2028	2,83	7,90	(2,78)	7,95
2029	7,95	0,40	(2,78)	5,57
2030	5,57	0,00	(2,35)	3,22
2031	3,22	0,00	(1,85)	1,37
2032	1,37	0,00	(1,12)	0,25
2033	0,25	0,00	(0,25)	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

G.12.2. Nhóm 2: Khấu hao trung bình (7-10 năm) — CNC, SMT, Robot, UPS/Gen

Năm	NBV đầu kỳ	Đầu tư mới	Khấu hao	NBV cuối kỳ
2025	0,00	8,25	(0,52)	7,73
2026	7,73	2,48	(1,22)	8,99
2027	8,99	1,65	(1,50)	9,14
2028	9,14	5,82	(2,07)	12,89
2029	12,89	3,95	(2,58)	14,26
2030	14,26	0,35	(2,58)	12,03
2031	12,03	0,00	(2,42)	9,61
2032	9,61	0,00	(2,35)	7,26
2033	7,26	0,00	(2,18)	5,08
2034	5,08	0,00	(1,95)	3,13

G.12.3. Nhóm 3: Khấu hao dài (15-20 năm) — Hạ tầng, M&E, xưởng

Năm	NBV đầu kỳ	Đầu tư mới	Khấu hao	NBV cuối kỳ
2025	0,00	8,42	(0,28)	8,14
2026	8,14	1,85	(0,56)	9,43

Năm	NBV đầu kỳ	Đầu tư mới	Khấu hao	NBV cuối kỳ
2027	9,43	0,95	(0,68)	9,70
2028	9,70	2,15	(0,78)	11,07
2029	11,07	1,45	(0,88)	11,64
2030	11,64	0,00	(0,88)	10,76
2031	10,76	0,00	(0,88)	9,88
2032	9,88	0,00	(0,88)	9,00
2033	9,00	0,00	(0,88)	8,12
2034	8,12	0,00	(0,88)	7,24

G.13. CAPEX Chi tiết theo B.U và Phase

G.13.1. CAPEX Tổng hợp

Hạng mục	Phase 1 (2025-2027)	Phase 2 (2028-2030)	Tổng
B.U #1 — CNC Outsourcing	9,85	5,75	15,60
B.U #2 — Datacenter & AI	11,45	10,55	22,00
B.U #3 — IoT/Robot (thu nhỏ)	3,20	0,80	4,00
Hạ tầng chung	4,40	1,50	5,90
TỔNG CAPEX	28,90	18,60	47,50

G.13.2. CAPEX Chi tiết — B.U #1: CNC Outsourcing

TT	Hạng mục	SL	ĐG (K USD)	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
1	CNC 5 trục DMG MORI DMU 65 monoBLOCK	8	520	4,16	—	4,16	[B]
2	CNC 5 trục Doosan DVF 5000	5	385	1,925	—	1,925	[B]
3	CNC 5 trục Makino D500	2	680	—	1,36	1,36	[B]
4	CNC 5 trục bổ sung Phase 2 (Doosan)	10	395	—	3,95	3,95	[A]

TT	Hạng mục	SL	ĐG (K USD)	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
5	CMM Hexagon Global S 9.12.8	2	285	0,57	—	0,57	[B]
6	CMM Zeiss CONTURA	1	380	—	0,38	0,38	[B]
7	Móng nổi cách ly rung	—	—	0,65	—	0,65	[A]
8	Chip conveyor + thu gom	—	—	0,42	—	0,42	[B]
9	Xử lý Coolant (MWF treatment)	—	—	0,35	—	0,35	[B]
10	Hút bụi kim loại + HEPA	—	—	0,18	—	0,18	[B]
11	CMM Room (vách kính, HVAC)	—	—	0,12	—	0,12	[A]
12	CAD/CAM Siemens NX (15 licenses)	15	18,5/năm	0,278	—	0,278	[B]
13	Mastercam (10 licenses)	10	12,0/năm	0,12	—	0,12	[B]
14	Chứng nhận IATF 16949 (TUV SUD)	—	—	0,265	—	0,265	[B]
15	Chứng nhận AS9100 Rev D	—	—	—	0,06	0,06	[B]
16	Tooling ban đầu	—	—	0,52	—	0,52	[A]
17	Thiết bị phụ trợ	—	—	0,28	—	0,28	[A]
	TỔNG CNC			9,85	5,75	15,60	

G.13.3. CAPEX Chi tiết — B.U #2: Datacenter & AI Compute

TT	Hạng mục	SL	ĐG (K)	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
1	Xây dựng Data Hall 3.000 m2 (Tier III)	—	—	3,85	—	3,85	[A]
2	Sàn nâng (Raised Floor)	3.000	0,085/m2	0,255	—	0,255	[B]

TT	Hạng mục	SL	ĐG (K)	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
	1m						
3	UPS 500kVA (N+1)	4	165	0,66	0,33	0,99	[B]
4	Generator diesel 1.250 kVA (N+1)	3	195	0,585	0,195	0,78	[B]
5	PDU (Power Distribution Unit)	50	8,5	0,255	0,17	0,425	[B]
6	In-Row Cooling (Zone 1 Colo)	15	32	0,48	—	0,48	[B]
7	Liquid Cooling (Zone 2 AI/HPC)	10	85	0,85	0,85	1,70	[B]
8	Chiller (800TR)	2	280	0,56	0,28	0,84	[B]
9	NVIDIA DGX H100 SuperPOD (Phase 1)	2 pod	2.800	5,60	—	5,60	[B]
10	NVIDIA DGX next-gen (Phase 2)	3 pod	2.500	—	7,50	7,50	[A]
11	Server Rack (Dell/HPE)	40	25	0,60	0,40	1,00	[B]
12	Storage SAN (NetApp/Pure Storage)	2	350	0,70	—	0,70	[B]
13	Networking (Cisco Nexus 9000 + spine-leaf)	—	—	0,45	0,30	0,75	[B]
14	Bảo mật vật lý (Biometric, CCTV AI)	—	—	0,35	0,15	0,50	[A]
15	SOC setup	—	—	0,28	—	0,28	[A]
16	BMS	—	—	0,22	—	0,22	[B]
17	DCIM software (Nlyte/Sunbird)	—	—	0,085	—	0,085	[B]
18	Chứng nhận Tier III (Uptime Institute)	—	—	0,18	—	0,18	[B]
19	ISO 27001, PCI DSS	—	—	0,12	—	0,12	[B]

TT	Hạng mục	SL	ĐG (K)	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
20	PCCC gas (NOVEC 1230)	—	—	0,42	0,18	0,60	[B]
21	Fiber connectivity (dark fiber)	—	—	0,18	0,12	0,30	[B]
22	Battery bank (Li-ion UPS extension)	—	—	—	0,08	0,08	[B]
	TỔNG DATACENTER			11,45	10,55	22,00	

G.13.4. CAPEX Chi tiết — B.U #3: IoT/Robot

TT	Hạng mục	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
1	SMT Line Panasonic NPM-D3 (1 line)	1,85	—	1,85	[C]
2	Robot welding/assembly station	0,35	—	0,35	[A]
3	Testing equipment (AOI, ICT, Burn-in)	0,28	—	0,28	[A]
4	Clean room cấp 10.000 (300 m2)	0,22	—	0,22	[A]
5	Tooling + jig/fixture cho AMR/AGV	0,15	0,12	0,27	[A]
6	Thiết bị nâng cấp Phase 2	—	0,68	0,68	[A]
7	Phần mềm ERP/MES/PLM	0,35	—	0,35	[A]
	TỔNG IoT/Robot	3,20	0,80	4,00	

G.13.5. CAPEX — Hạ tầng Chung

TT	Hạng mục	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
1	Cải tạo nhà xưởng (phần vùng 3 khối)	1,80	—	1,80	[A]
2	Hệ thống điện tổng (Transformer 5MVA, MDB)	0,95	0,45	1,40	[B]
3	PCCC tổng thể + hạ tầng nước	0,55	0,25	0,80	[A]
4	Hạ tầng IT chung (LAN, WAN, Security)	0,35	0,15	0,50	[A]
5	Văn phòng điều hành +	0,28	—	0,28	[A]

TT	Hạng mục	Phase 1 (M)	Phase 2 (M)	Tổng (M)	Nhãn
	showroom				
6	Thiết bị vận chuyển nội bộ	0,15	0,08	0,23	[A]
7	Solar PV rooftop (300-500 kWp)	0,32	0,57	0,89	[B]
	TỔNG Hạ tầng chung	4,40	1,50	5,90	

PHỤ LỤC H: DANH MỤC SẢN PHẨM CHI TIẾT (PRODUCT CATALOG)

H.1. Trụ cột 1: IoT Gateway & Robot

H.1.1. IoT Gateway MK-200 Pro

Thông số	Giá trị
Tên sản phẩm	MK-200 Pro Industrial IoT Gateway
SoC	ARM Cortex-A78 Quad-core 2,0 GHz
RAM	8 GB LPDDR4X
Storage	64 GB eMMC + microSD (tối đa 256 GB)
AI Accelerator	NPU 2 TOPS (Edge AI inference)
Kết nối có dây	2x GbE (PoE+ in), 1x RS485, 1x RS232, 1x CAN 2.0B
Kết nối không dây	Wi-Fi 6 (802.11ax), BLE 5.2, LoRa (868/915 MHz), NB-IoT/Cat-M1, 4G LTE Cat 4
Giao thức công nghiệp	Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT, BACnet, Profinet (option)
I/O	8x DI (24V), 4x DO (relay 5A), 4x AI (0-10V/4-20mA)
Nguồn	9-36 VDC hoặc PoE+ (802.3at, 30W)
Bảo mật	TPM 2.0, Secure Boot, TLS 1.3, X.509 certificate
Hệ điều hành	MekongOS (Yocto Linux-based), OTA update
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến +60°C
Chuẩn bảo vệ	IP65 (option IP67)
Kích thước	180 x 120 x 45 mm
Trọng lượng	650 g
Chứng nhận	CE, FCC, RoHS, IEC 61000 (EMC)

Thông số	Giá trị
Giá dự kiến	1.200-1.800 USD/bộ (tùy cấu hình)
Thời gian ra mắt	Q3/2027

H.1.2. IoT Gateway MK-300 Enterprise

Thông số	Giá trị
Tên sản phẩm	MK-300 Enterprise IoT Gateway
SoC	ARM Cortex-A78AE Octa-core 2,4 GHz (Safety Island)
RAM	16 GB LPDDR5
Storage	128 GB NVMe + microSD
AI Accelerator	NPU 8 TOPS (Edge AI + Computer Vision)
Kết nối	4x GbE (2x PoE+), RS485×2, RS232×2, CAN FD, USB 3.0
Không dây	Wi-Fi 6E, BLE 5.3, 5G sub-6 GHz (option mmWave), LoRa, NB-IoT
Giao thức	OPC UA (Server+Client), MQTT 5.0, Modbus, Profinet, EtherCAT (option)
I/O	16x DI, 8x DO, 8x AI, 4x AO, 2x Encoder input
Nguồn	9-48 VDC, Dual redundant
HA	Dual power, Watchdog, Auto failover, Battery backup (option)
Bảo mật	TPM 2.0, HSM, Secure Enclave, TLS 1.3, FIPS 140-2
Nhiệt độ	-40°C đến +70°C
Chuẩn bảo vệ	IP67
Kích thước	220 x 150 x 55 mm
Giá dự kiến	2.800-4.200 USD/bộ
Thời gian ra mắt	Q1/2030

H.1.3. Robot AMR-500

Thông số	Giá trị
Tên sản phẩm	Mekong AMR-500 Autonomous Mobile Robot
Tải trọng	500 kg
Tốc độ tối đa	2,0 m/s (có tải: 1,5 m/s)
Navigation	LiDAR 3D (Sick/Hokuyo) + Camera stereo + IMU + Encoder
SLAM	Mekong SLAM v2.0 (based on ROS2 Nav2, custom improvements)
AI	NVIDIA Jetson Orin Nano (40 TOPS), Object detection, Path planning
Kết nối	Wi-Fi 6, 5G (option), BLE 5.2

Thông số	Giá trị
Pin	LiFePO4 48V 30Ah (1,44 kWh), sạc nhanh 2h, runtime 8h (có tải)
Sạc	Auto docking station, opportunity charging
Safety	SIL2 (IEC 61508), Emergency stop, Safety LiDAR, Bumper sensor
Kích thước	1.000 x 700 x 350 mm (không kể payload adapter)
Trọng lượng	180 kg (không tải)
Payload adapter	Roller top, Lift (100 mm), Tug, Custom
Fleet management	MekongOS Fleet (tối đa 100 robots/zone)
Giá dự kiến	22.000-28.000 USD/bộ
Thời gian ra mắt	Q1/2028

H.1.4. Robot AGV-500

Thông số	Giá trị
Tên sản phẩm	Mekong AGV-500 Automated Guided Vehicle
Tải trọng	500 kg
Navigation	Magnetic tape + Laser navigation (hybrid)
Tốc độ	1,5 m/s (có tải: 1,0 m/s)
Chức năng	Forklift AGV (nâng pallet 1.200 x 800 mm)
Chiều cao nâng	Tối đa 1.500 mm
Pin	LiFePO4 48V 40Ah, runtime 10h, sạc 2,5h
Safety	Safety scanner 360°, Emergency stop, Zone-based speed control
Giá dự kiến	18.000-24.000 USD/bộ
Thời gian ra mắt	Q3/2028

H.1.5. OHT-100 (Overhead Hoist Transfer)

Thông số	Giá trị
Tên sản phẩm	Mekong OHT-100 Overhead Transport System
Tải trọng	100 kg
Loại ray	Monorail overhead (nhôm profile 200 x 100 mm)
Tốc độ ngang	3,0 m/s
Tốc độ nâng/hạ	0,5 m/s
Độ chính xác dừng	±2 mm
Hành trình nâng	Tối đa 3.000 mm
Số trục	4 trục (X, Y, Z, Gripper)

Thông số	Giá trị
Điều khiển	PLC Siemens S7-1500 + MekongOS OHT Controller
An toàn	SIL2, Anti-collision, Overload detection
Ứng dụng	Bán dẫn (FOUP), Dược phẩm, F&B
Giá dự kiến	35.000-50.000 USD/bộ (không bao gồm ray)
Thời gian ra mắt	Q2/2029

H.2. Trục cột 2: Dịch vụ CNC Siêu chính xác

H.2.1. Phân khúc Bán dẫn — Linh kiện Khuôn mẫu

Thông số	Giá trị
Sản phẩm	Die holder, Lead frame tooling, Mold cavity, Trim & Form die
Vật liệu	SKD11, SKH51, Carbide, Tungsten, Beryllium Copper
Dung sai	3-5 μm (profile), 1-2 μm (position)
Surface finish	Ra 0,2-0,8 μm
Kích thước	50×50×30 mm đến 300×300×200 mm
Sản lượng mục tiêu	5.000 bộ/năm (steady state)
Giá trung bình	300-800 USD/bộ
Doanh thu mục tiêu	2,50 M USD/năm
VA	45%
Chứng nhận cần thiết	ISO 9001, IATF 16949
Khách hàng mục tiêu	Intel, Samsung, Amkor, ASE (tại VN)

H.2.2. Phân khúc Hàng không — Linh kiện Aerospace

Thông số	Giá trị
Sản phẩm	Turbine blade root, Diffuser vane, Structural bracket, Actuator housing
Vật liệu	Titanium Ti-6Al-4V, Inconel 718, CRES 321, Al 7075-T6
Dung sai	5-10 μm (profile), 3-5 μm (bore)
Surface finish	Ra 0,4-1,6 μm
Kích thước	25×25×15 mm đến 500×300×200 mm
Sản lượng mục tiêu	2.000 bộ/năm
Giá trung bình	1.000-3.000 USD/bộ
Doanh thu mục tiêu	3,00 M USD/năm
VA	50%

Thông số	Giá trị
Chứng nhận cần thiết	AS9100 Rev D, NADCAP (Special Process)
Khách hàng mục tiêu	Safran, Collins Aerospace, Pratt & Whitney (qua chuỗi cung ứng)

H.2.3. Phân khúc Ô tô điện — Linh kiện EV

Thông số	Giá trị
Sản phẩm	Motor housing, Battery tray bracket, Inverter heatsink, Gear housing
Vật liệu	Al 6061-T6, Al 7075-T6, ADC12, SPCC
Dung sai	10-30 µm (general), 5-10 µm (bearing bore)
Surface finish	Ra 0,8-3,2 µm
Kích thước	100×100×50 mm đến 800×500×300 mm
Sản lượng mục tiêu	20.000 bộ/năm
Giá trung bình	50-300 USD/bộ
Doanh thu mục tiêu	4,00 M USD/năm
VA	35%
Chứng nhận cần thiết	IATF 16949
Khách hàng mục tiêu	Vinfast, Bosch, Continental, Nidec (tại VN)

H.3. Trụ cột 3: Datacenter MACC

H.3.1. Dịch vụ Colocation

Thông số	Giá trị
Tên dịch vụ	MACC Colocation Standard
Rack	42U, 600W x 1.100D, lockable
Power	5-15 kW/rack (scalable), Dual feed A+B
SLA	99,982% uptime (Tier III)
Network	1G/10G uplink, peering VN-IX, transit 3 ISP
Cooling	Hot Aisle Containment, In-Row + RDHX
PUE	<= 1,35
Security	Biometric + Card + PIN, CCTV 24/7, Security guard
RPR	1.200-1.600 USD/rack/tháng
Cross-connect	100 USD/patch/tháng
Remote hands	80 USD/giờ

H.3.2. Dịch vụ GPU-as-a-Service

Thông số	Giá trị
Tên dịch vụ	MACC GPU Cloud
GPU	NVIDIA H100 SXM5 80GB / A100 80GB
Interconnect	NVLink 4.0 (H100), InfiniBand HDR 200Gbps
Use case	AI Training, LLM Fine-tuning, HPC Simulation
Pricing	H100: 3,50-4,20 USD/GPU-hour (2025), giảm 15%/năm
Pricing	A100: 1,80-2,50 USD/GPU-hour (2025)
Min commitment	1 GPU x 100 giờ/tháng
Max cluster	32 x H100 (256 GB tổng VRAM)
Storage	100 TB NVMe per cluster, S3-compatible object storage
Network	400 GbE (RoCE v2), 200 Gbps InfiniBand
SLA	99,9% (monthly), credit for downtime

H.3.3. Dịch vụ MekongOS IoT Cloud

Thông số	Giá trị
Tên dịch vụ	MekongOS IoT Platform (SaaS)
Tính năng	Device management, Data ingestion, Dashboard, Alert, API
Giao thức	MQTT, HTTP, CoAP, WebSocket
Devices/account	100-10.000 (tùy gói)
Data retention	30 ngày (Basic), 1 năm (Pro), 3 năm (Enterprise)
Edge integration	Hỗ trợ MK-200, MK-300, cổng bên thứ 3
Pricing	Basic: 99 USD/tháng, Pro: 299 USD/tháng, Enterprise: 799 USD/tháng
Free tier	10 devices, 100K messages/tháng
Hosting	On MACC Datacenter (data sovereignty VN)

PHỤ LỤC I: BẢNG TỔNG HỢP GIẢ ĐỊNH

TT	Giả định	Giá trị	Nhãn	Nguồn
1	GDP VN CAGR	6,5-7,0%/năm	[B]	IMF WEO Oct 2024
2	Lạm phát VN	3,5-4,0%/năm	[B]	NHNN mục tiêu
3	Tỷ giá USD/VND	25.000 ± 5%	[A]	Giả định ổn định

TT	Giả định	Giá trị	Nhãn	Nguồn
4	WACC	12%	[C]	CAPM: Rf 4,5% + 1,2 × 6,5% + CRP 2,8%
5	CIT KCNC	10% × 15 năm	[B]	Luật Công nghệ cao 2008
6	Lãi suất cho vay	8-9%/năm	[B]	NH thương mại VN
7	CNC giá trung bình	45-85 USD/h	[B]	Grand View Research 2024
8	CNC utilization benchmark	70-85%	[B]	AMT (Association for Mfg Technology)
9	DC RPR Colo VN	800-2.000 USD/Rack	[B]	Cushman & Wakefield 2024
10	DC Occupancy VN	65-85%	[B]	Structure Research
11	GPU-aaS pricing	2-10 USD/GPU-h	[B]	Lambda Cloud, CoreWeave
12	GPU decline rate	15-20%/năm	[B]	Epoch AI, Stanford AI Index
13	CNC COGS benchmark	60-75%	[B]	Misumi VN, TPR VN
14	DC COGS benchmark	40-55%	[B]	Equinix, Digital Realty
15	Khấu hao GPU	3-4 năm	[B]	GAAP/IFRS DC practice
16	Khấu hao CNC	7-10 năm	[B]	VAS + ngành CNC
17	PUE mục tiêu	1,35	[A]	Liquid cooling mix design
18	Giá điện CN	0,08-0,10 USD/kWh	[C]	EVN biểu giá 2025
19	IATF certification cost	173-265K USD	[B]	TUV SUD Vietnam
20	AS9100 certification cost	195-320K USD	[B]	LRQA, Bureau Veritas
21	IoT Gateway thị trường VN	200 M USD	[B]	IoT Analytics
22	Robot AMR/AGV VN	80 M USD	[B]	IFR, World Robotics 2024
23	CNC thị trường VN	1.850 M USD	[B]	Mordor Intelligence

TT	Giả định	Giá trị	Nhãn	Nguồn
24	DC thị trường VN	1.100 M USD	[B]	Structure Research
25	Lương trung bình	1.100-1.300 USD/tháng	[B]	Thị trường KCNC
26	BHXX phía công ty	23,5% lương	[B]	Luật BHXX
27	Tăng lương	5-8%/năm	[B]	Benchmark VN
28	Thuê đất KCNC	~1,0 USD/m2/tháng	[B]	BQL KCNC
29	Bảo trì/năm	3-5% giá trị thiết bị	[B]	Ngành sản xuất
30	Khấu hao xây dựng	20 năm, straight-line	[B]	VAS

PHỤ LỤC J: SO SÁNH V1 VÀ V2.1

Chi tiêu	V1 (20M, 1 B.U)	V2.1 (47,5M, 3 B.U, 5 Phase)	Thay đổi
Mô hình	Single B.U (IoT/Robot)	3 B.U (CNC+DC+IoT), 5 giai đoạn	Đa dạng hóa
CAPEX	20,0 M USD	47,50 M USD	+137%
Diện tích	10.000 m ² (toàn SMT)	10.000 m ² (1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m ²)	Tận dụng chiều cao
Thời gian xây dựng	18 tháng	5 năm (Y0–Y5)	Thực tế hơn
Doanh thu đầu tiên	M18 (Y1,5)	Y6 (IoT)	+4,5 năm
Revenue Y10	15,0 M USD	14,50 M USD (3 BU combined)	-3%
Revenue Y15	N/A	32,00 M USD	Steady-state
Revenue 15Y	N/A	~165 M USD	—
NPV	15,2 M (10Y, WACC 10%)	1,50 M (50Y, WACC 12%)	Khác horizon + WACC
NPV 20Y	N/A	(5,30) M (20Y, WACC 12%)	Âm — đặc thù hạ tầng
IRR	15,2%	13,0% (50Y) / 9,5% (20Y)	-2,2 pts (50Y)
Payback (Discounted)	8,5 năm	13 năm (50Y)	+4,5 năm
Vốn CSH	20,0 M (100%)	34,97 M (73,6%)	+75%
Vốn vay	0	12,53 M (từ Y10)	Muộn, an toàn
Headcount	200	15→300 (phased 15Y)	Phân kỳ
Rủi ro đơn lẻ	Cao (1 BU)	Thấp hơn (3 BU)	Đa dạng

Chi tiêu	V1 (20M, 1 B.U)	V2.1 (47,5M, 3 B.U, 5 Phase)	Thay đổi
Chứng nhận	ISO 9001	ISO+IATF+AS9100+Tier III	Nhiều hơn
Xuất khẩu	10-15%	15-20% (CNC)	Cao hơn
R&D	6,01 M/10Y	12,5 M/15Y	+108%
Strategic Value	15,2 M (NPV only)	20,32 M (NPV + Real Options + Barrier + Synergy + Platform + Tax)	+5,12 M

Nhận xét V2.1: NPV 50Y dương nhưng thấp (1,50M), phản ánh thực tế 5 năm xây dựng không doanh thu. Strategic Value (20,32M) mới là chỉ số đánh giá đúng giá trị dự án hạ tầng 50 năm. So với V1 (đầu tư nhỏ, 1 BU, M18 doanh thu), V2.1 chấp nhận thời gian dài hơn để xây dựng nền tảng 3 trụ cột bền vững.

PHỤ LỤC K: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

K.1. Văn bản Pháp luật

1. Luật Đầu tư 2020 (Luật số 61/2020/QH14)
2. Luật Công nghệ cao 2008 (Luật số 21/2008/QH12)
3. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14)
4. Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020)
5. Luật PCCC 2001 (sửa đổi 2013)
6. Nghị định 31/2021/NĐ-CP (Hướng dẫn Luật Đầu tư)
7. Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Hướng dẫn Luật BVMT)
8. Nghị định 76/2018/NĐ-CP (Tiêu chí CNC)
9. Quyết định 38/2020/QĐ-TTg (Danh mục sản phẩm CNC)
10. Quyết định 2117/QĐ-TTg (Công nghệ cao ưu tiên)
11. QCVN 06:2022/BXD (PCCC nhà và công trình)
12. QCVN 40:2011/BTNMT (Nước thải công nghiệp)
13. Thông tư 36/2023/TT-BTNMT (ĐTM)

K.2. Báo cáo Thị trường

1. MarketsandMarkets, "Global IoT Market Report 2024-2030"
2. IoT Analytics GmbH, "State of IoT 2024"
3. IFR, "World Robotics Report 2024"
4. Mordor Intelligence, "CNC Machine Market 2024-2030"
5. Grand View Research, "Precision Machining Market 2024-2030"
6. Structure Research, "Vietnam Data Center Market Update 2024"
7. Cushman & Wakefield, "Asia Pacific Data Centre Market 2024"
8. Arizton Advisory, "ASEAN Data Center Market 2024-2029"
9. IDC Vietnam, "Vietnam ICT Market Report 2024"
10. McKinsey & Company, "Industry 4.0 Value Creation 2024"

K.3. Tiêu chuẩn Kỹ thuật

1. Uptime Institute Tier Standard — Tier III (Concurrently Maintainable)
2. ASHRAE TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments
3. ISO 9001:2015 — Quality Management Systems
4. ISO 14001:2015 — Environmental Management Systems
5. ISO 45001:2018 — Occupational Health and Safety
6. ISO 27001:2022 — Information Security Management
7. IATF 16949:2016 — Automotive Quality Management
8. AS9100 Rev D — Aerospace Quality Management
9. IEC 61508 — Functional Safety
10. NFPA 75 — Protection of IT Equipment
11. NFPA 76 — Protection of Telecommunications Facilities
12. TCVN 9386:2012 — Thiết kế công trình chịu động đất

PHỤ LỤC L: THIẾT KẾ HẠ TẦNG M&E CHI TIẾT

L.1. Tổng quan Thiết kế M&E

Phụ lục này trình bày chi tiết thiết kế Cơ — Điện — Nước — PCCC cho toàn bộ tổ hợp 1 tòa nhà 3 tầng (Tầng 1: CNC + DC, Tầng 2: IoT/SMT, Tầng 3: VP/R&D) trên khuôn viên 1 ha tại KCNC TP.HCM. Thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (Uptime Tier III, ASHRAE, IEC, NFPA) và tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN, TCVN).

L.1.1. Nguyên tắc Thiết kế

1. **Đồng vận hành (Concurrently Maintainable) — Tier III:** Mọi thiết bị có thể bảo trì mà không gián đoạn hoạt động IT
2. **N+1 Redundancy:** Mỗi hệ thống có tối thiểu 1 thiết bị dự phòng
3. **2N Power Distribution:** Hai đường cấp điện độc lập cho IT (Path A + Path B)
4. **Phân vùng rõ ràng:** Khoảng cách ≥ 25 m giữa DC và CNC để kiểm soát rung
5. **Tính mở rộng (Scalability):** Thiết kế cho Phase 2 từ đầu, chỉ lắp đặt theo nhu cầu
6. **Hiệu quả năng lượng:** PUE mục tiêu $\leq 1,35$ (đạt thực tế 1,32)

L.2. Khối A — Datacenter Chi tiết

L.2.1. Kiến trúc Data Hall

Thông số	Zone 1 (Colocation)	Zone 2 (AI/HPC)	Đơn vị
Diện tích	900	600	m ²
Racking capacity	50 racks	50 racks	rack 42U
Density mục tiêu	5-15 kW/rack	30-60 kW/rack	kW/rack
Tổng IT Load thiết kế	500 kW	2.500 kW	kW
Cooling architecture	HAC + In-Row CRAH + RDHX	Direct-to-Chip Liquid + RDHX	—

Thông số	Zone 1 (Colocation)	Zone 2 (AI/HPC)	Đơn vị
Raised floor	800 mm	800 mm	mm
Floor loading	≥ 12 kPa	≥ 15 kPa	kPa

L.2.2. Khu vực Phụ trợ — Tầng 1

Phòng	Diện tích (m ²)	Chức năng
NOC (Network Operations Center)	80	Giám sát 24/7, 6 workstation + video wall 3×3 55"
SOC (Security Operations Center)	40	CCTV monitoring, access control audit
Meet-me Room (MMR)	30	Fiber patching, carrier entry, 2 racks
Staging Area	50	Equipment receiving, burn-in test (24-72h)
Loading Dock	30	Cửa 3m × 3m, dock leveler (truck loading)

L.2.3. Khu vực Phụ trợ — Tầng 2

Phòng	Diện tích (m ²)	Chức năng
UPS Room A	120	UPS Path A (2 × 1.000 kVA LiFePO4)
UPS Room B	120	UPS Path B (2 × 1.000 kVA LiFePO4)
Battery Room A	100	LiFePO4 battery string A (15 phút runtime)
Battery Room B	100	LiFePO4 battery string B (15 phút runtime)
MDB + Switchgear Room	80	Main Distribution Board 2 × 4.000A
ATS Room	40	Automatic Transfer Switch 2 × 4.000A
IT Office	60	DC operations team (6-8 người)

L.2.4. Raised Floor Design Chi tiết

Thông số	Giá trị	Tiêu chuẩn	Nhãn
Hệ thống	Steel pedestal + calcium sulphate panel	EN 12825	[B]
Chiều cao sàn nâng	800 mm (dưới panel đến structural slab)	Uptime Tier III	[A]
Tải trọng tập trung	≥ 12 kPa (Colo), ≥ 15 kPa (AI/HPC)	EN 12825 Grade 5/6	[C]
Tải trọng phân bố	≥ 35 kN/m ²	EN 12825	[B]
Panel kích thước	600 × 600 mm	Industry standard	[B]
Perforated tiles	25% open area (cold aisle)	ASHRAE best practice	[B]

Thông số	Giá trị	Tiêu chuẩn	Nhãn
Air dam	Dưới mỗi rack + blanking panel cho U trống	Best practice	[A]
Grounding	Mỗi pedestal nối đất, tổng trở $\leq 1 \text{ Ohm}$	IEC 61000-5-2	[C]
Chống tĩnh điện	Vinyl conductive flooring (ESD $< 10^6 \Omega$)	EN 14041	[B]
Cable management	Under-floor cable tray (chống cháy) + overhead ladder rack	TIA-942	[B]

Chi phí ước tính Raised Floor: $180\text{-}220 \text{ USD/m}^2 \times 1.500 \text{ m}^2 \text{ (Data Hall)} = 270.000\text{-}330.000 \text{ USD}$ [B]

L.2.5. Cooling Architecture Chi tiết

L.2.5.1. Sơ đồ Tổng quan Cooling

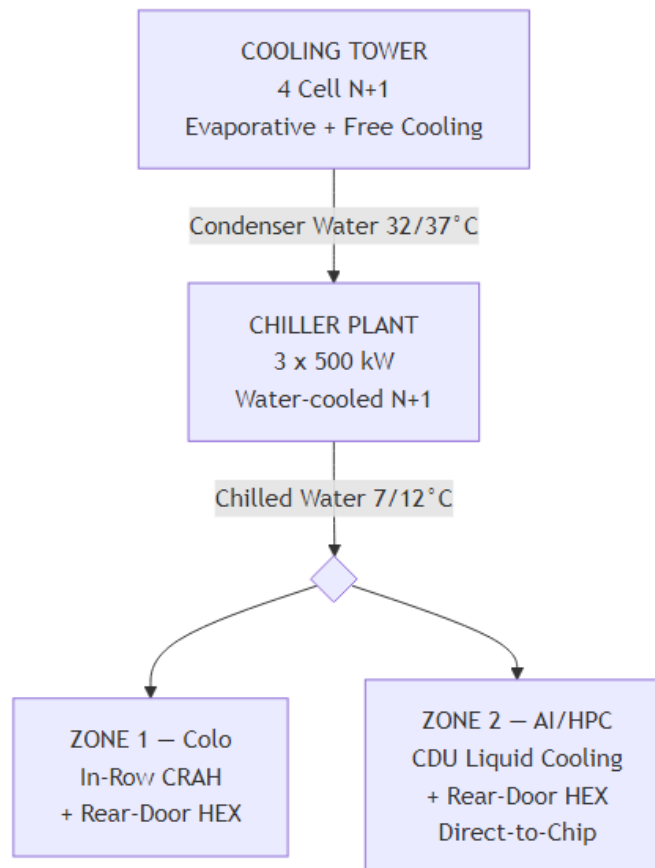


Diagram 43

L.2.5.2. Zone 1 — Colocation Cooling

Thông số	Giá trị	Nhãn
Cooling Type	Chilled Water In-Row CRAH + Rear-Door Heat Exchanger	[A]

Thông số	Giá trị	Nhãn
In-Row CRAH units	6 × 80 kW per row (N+1) — Phase 1: 12 units	[A]
Supply Air Temp	18°C ± 2°C	[B]
Return Air Temp	35°C (HAC contained)	[B]
Airflow per CRAH	5.500 m³/h	[B]
Chilled Water Supply	7°C (ΔT = 5°C)	[B]
Rear-Door HEX	Passive, chilled water — supplements 30% cooling per rack	[A]
Redundancy	N+1 per row	[C]

L.2.5.3. Zone 2 — AI/HPC Liquid Cooling

Thông số	Giá trị	Nhãn
Cooling Type	Direct-to-Chip Liquid Cooling (CDU-based) + Rear-Door HEX	[A]
CDU (Coolant Distribution Unit)	2 × 250 kW per row (N+1) — Phase 1: 4 CDU	[A]
Chip-level coolant	Propylene glycol 30%, inlet 30°C, outlet 45°C	[B]
CDU to Chiller loop	Chilled water 12°C → CDU heat exchanger → return 22°C	[A]
Rear-Door HEX	Active (pumped) — handles residual air-cooled heat (20%)	[A]
Quick-disconnect manifold	Per rack, drip-free, for hot-swap maintenance	[B]
Leak detection	Rope-type sensor under every rack row + CDU area	[C]

Lợi ích Liquid Cooling: Giảm 60-70% lượng không khí cần làm lạnh → PUE cải thiện 0,15-0,20 so với air-cooled thuần túy. Đây là yêu cầu bắt buộc cho GPU rack >40 kW [B].

L.2.5.4. Chiller Plant

Thông số	Giá trị	Nhãn
Chiller Type	Water-cooled screw chiller	[A]
Capacity	3 × 500 kW (N+1) — Phase 1: 2 units	[A]
COP (Coefficient of Performance)	≥5,5 (full load), ≥6,0 (IPLV)	[B]
Refrigerant	R-515B (low-GWP) hoặc R-1234ze	[B]

Thông số	Giá trị	Nhãn
Chilled Water	Supply 7°C / Return 12°C ($\Delta T = 5^\circ\text{C}$)	[B]
Condenser Water	Supply 32°C / Return 37°C	[B]
VFD	Trên tất cả compressor + pump	[A]
Control	BMS integration, demand-based staging	[A]

L.2.5.5. Cooling Tower

Thông số	Giá trị	Nhãn
Type	Counter-flow evaporative (FRP housing)	[A]
Capacity	4 × 400 kW (N+1) — Phase 1: 3 cells	[A]
Approach temperature	5°C (wet bulb TP HCM ~27°C → CW 32°C)	[B]
Water make-up	60-80 m ³ /ngày sau hybrid cooling	[C]
Drift eliminator	≤0,001% (low-drift design)	[B]
Cycles of concentration	5-7 (water treatment optimized)	[A]
Water treatment	Auto-dosing: Biocide + Anti-scale + pH control	[A]
Noise	85 dB(A) at 1m, 52-58 dB(A) at boundary	[C]

L.2.5.6. Free Cooling Economizer

Thông số	Giá trị	Nhãn
Mode	Waterside economizer (plate heat exchanger)	[A]
Activation	Khi T _{outdoor_wetbulb} < 18°C	[A]
Số giờ khả dụng	~700-1.000 h/năm (TP HCM) — ~8-11% thời gian	[B]
Tiết kiệm điện chiller	~8% annual chiller energy	[A]
Partial free cooling	Khi T _{wb} 18-24°C → Chiller chạy bổ sung, COP tăng	[A]
Tổng giờ partial + full	~2.500 h/năm (~29% thời gian)	[B]

L.2.5.7. Tính toán PUE

Thành phần	Load (kW) Phase 2 Full	% IT Load	Ghi chú
IT Load	3.000	100,0%	Base

Thành phần	Load (kW) Phase 2 Full	% IT Load	Ghi chú
Cooling (Chiller + CT + Pump)	600	20,0%	COP 5,5 + VFD + free cooling credit
UPS Loss	120	4,0%	Efficiency 96% (double conversion)
Lighting + Misc	45	1,5%	LED + BMS
PDU Loss	60	2,0%	Transformer loss
Liquid Cooling Pump (Zone 2)	90	3,0%	CDU pumps
Building HVAC (non-IT)	30	1,0%	Office, NOC
Security + Fire	15	0,5%	CCTV, VESDA, v.v.
Total Facility	3.960		
PUE			3.960 / 3.000 = 1,32

PUE 1,32 đạt target < 1,35 [A]. Yếu tố chính: Liquid cooling Zone 2 (giảm 25%), VFD tất cả pump/fan, free cooling ~8%, UPS 96%.

L.2.6. Electrical Architecture — 2N Distribution

L.2.6.1. Power Path Design

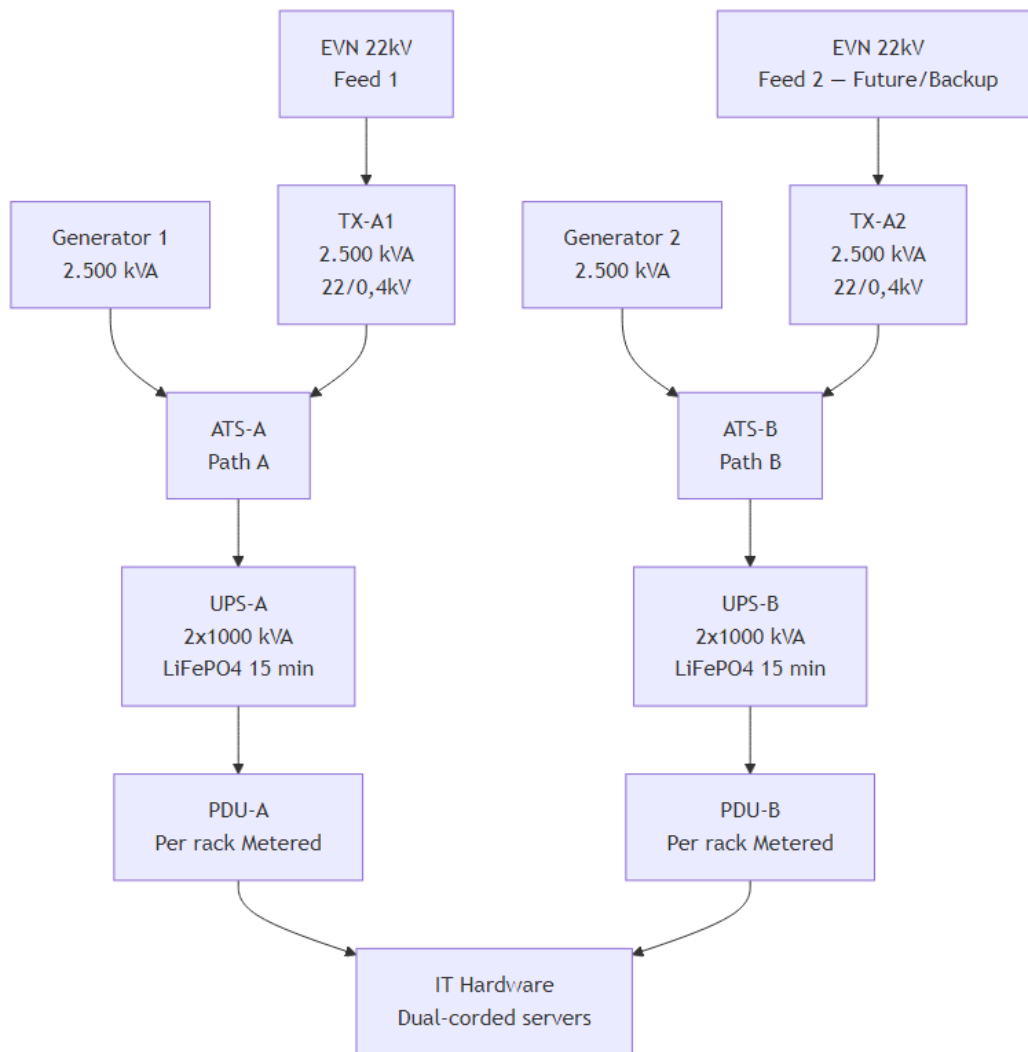


Diagram 44

L.2.6.2. UPS Specifications

Thông số	Giá trị	Nhãn
Configuration	2N (2 × (2 × 1.000 kVA parallel))	[A]
UPS Type	Online Double Conversion (VFI-SS-111)	[B]
Input	3-phase 400V, 50Hz	[C]
Output	3-phase 400V, 50Hz, THD ≤3%	[B]
Efficiency	≥96% (double conversion), ≥99% (eco mode — NOT for DC)	[B]
Battery Type	LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)	[A]
Battery Runtime	15 phút @ full load (per UPS path)	[C]
Battery Life	15+ năm (vs 5-7 năm VRLA)	[B]

Thông số	Giá trị	Nhãn
Battery Footprint	~60% smaller than equivalent VRLA	[B]
Monitoring	Per-cell BMS, temperature + voltage + SOC	[B]
Bypass	Static bypass + Manual maintenance bypass	[C]

Chi phí UPS: $4 \times 1.000 \text{ kVA UPS} = \sim 800.000 \text{ USD}$ [B]. LiFePO4 battery = $\sim 400.000 \text{ USD}$ [B]. Tổng UPS system $\sim 1.200.000 \text{ USD}$.

L.2.6.3. PDU Specifications

Thông số	Giá trị	Nhãn
Type	Rack-mount, Intelligent Metered + Switched	[A]
Input	3-phase 63A (Colo) / 125A (AI/HPC)	[A]
Outlets per PDU	24 × C13 + 12 × C19 (Colo), 12 × C19 + 6 × 3-phase (AI)	[B]
Per-outlet metering	Voltage, Current, Power, Energy (kWh)	[A]
Remote switching	Per outlet, SNMP/SSH/Web	[A]
Dual PDU per rack	PDU-A (Path A) + PDU-B (Path B)	[C]
Environmental sensors	Temperature + Humidity per PDU	[A]

L.2.7. Physical Security Chi tiết

Layer	Giải pháp	Tiêu chuẩn	Nhãn
Perimeter	Hàng rào 2,4m + CCTV PTZ (4 vị trí)	EN 50131-1	[A]
Building entry	Card access (Kaba/HID) + Guard 24/7	—	[A]
Data Hall entry	Mantrap (2 cửa interlocked) + Biometric (fingerprint + iris)	TIA-942	[A]
Rack access	Electronic rack lock + audit trail	ISO 27001	[A]
CCTV	32 camera (IP, 4K, 90-day retention)	—	[A]
Intrusion detection	PIR sensors + door contacts — all sensitive areas	EN 50131	[A]

Layer	Giải pháp	Tiêu chuẩn	Nhãn
Visitor management	Badge system + escort required in Data Hall	ISO 27001	[A]

L.3. Khối B — Nhà máy CNC Chi tiết (4.000 m²)

L.3.1. Thông số Thiết kế Tổng quát

Thông số	Giá trị	Nhãn
Diện tích tổng	4.000 m ²	[C]
Chiều cao trần	12 m (clearance cho crane 5T EOT)	[A]
Tải trọng sàn	≥20 kPa (concentrated, CNC machines ~8-15 tấn)	[B]
Tải điện Phase 1	700 kW (15 máy CNC + phụ trợ)	[A]
Tải điện Phase 2	1.600 kW (25 máy CNC + phụ trợ)	[A]
Nhiệt độ xưởng	20 ± 2°C (CNC precision machining)	[B]
Rung nền mục tiêu Khối A	v < 0,1 mm/s	[C]
CNC machines Phase 1	15: 8 × DMG MORI DMU 65, 5 × Doosan DVF 5000, 2 × Makino D500	[C]
CNC machines Phase 2	10: TBD (tương tự mix Phase 1)	[A]

L.3.2. Machine Shop Layout (25 Vị trí)




Diagram 45

L.3.3. Khoảng cách An toàn

Yếu tố	Khoảng cách	Tiêu chuẩn	Nhãn
Máy — Máy (cùng hàng)	≥2,5 m	OSHA 1910	[B]
Máy — Tường	≥1,5 m	OSHA 1910	[B]
Hàng — Hàng (qua crane track)	≥3,5 m	Crane clearance	[A]
Đường đi chính	≥3,0 m	Fork lift access	[B]
Đường đi phụ	≥1,2 m	Personnel access	[B]

L.3.4. Hệ thống Cách ly Rung Chi tiết

L.3.4.1. Bài toán Rung

Theo tính toán EIA, máy CNC 5 trục tạo rung **1,24 mm/s** tại nền — vượt ngưỡng DC Tier III (0,1 mm/s) **12,4 lần**. Cần giảm $\geq 92,3\%$ để đạt target.

L.3.4.2. Giải pháp Cách ly 3 Cấp

Cấp	Mô tả	Giảm rung lũy kế	Chi phí
Cấp 1	Inertia block (bê tông 300-500mm, 2× trọng lượng máy)	50% → 0,62 mm/s	125.000 USD (25 bộ)
Cấp 2	Spring isolator Gerb/Bilz + rubber pad Sylomer SR-55	90% → 0,062 mm/s	250.000 USD (25 bộ)
Cấp 3	Isolation trench 2m × 1m × 60m giữa Khối A và B	80% → 0,012 mm/s	120.000 USD
Kết quả	Tại Khối A (25m away), suy giảm thêm 60%	→ ~0,005 mm/s	
Target	$v < 0,1$ mm/s tại Khối A	ĐẠT — dư 20×	

Tổng chi phí cách ly rung: ~520.000 USD [C]

L.3.4.3. Thiết bị Cách ly Chi tiết

Loại thiết bị	Nhà sản xuất	Model	Hiệu quả	Giá (USD/bộ)	Nhãn
Spring Isolator	Gerb (Đức)	GSA-350	85-95%	8.000-12.000	[B]
Rubber Pad	Getzner (Áo)	Sylomer SR-55	60-80% (bổ trợ)	1.500-2.500	[B]
Vibration Sensor	PCB Piezotronics	393B04	Monitor realtime	5.000/bộ 3 sensor	[A]

L.3.5. Hệ thống Chip Conveyor

Thông số	Giá trị	Nhãn
Type	Magnetic + Auger conveyor (ngầm dưới nền)	[A]
Channel size	300W × 250H mm (bê tông hoặc SS316)	[A]
Tốc độ chip removal	$\geq 0,5$ m/s	[B]
Capacity	~500 kg/h (đủ cho 25 máy, ~20 kg chip/máy/h)	[A]
Central collection	1 bể thu chip 5 m ³ (chip sắt, nhôm, inox — tách riêng)	[A]
Coolant separator	Tách coolant khỏi chip, tái sử dụng coolant	[A]

Thông số	Giá trị	Nhãn
Class D fire risk	Chip Ti, Mg → KHÔNG dùng nước, dùng D-class extinguisher	[C]

Chi phí Chip Conveyor: ~85.000 USD [A]

L.3.6. Hệ thống Khí nén

Thông số	Giá trị	Nhãn
Áp suất công tác	8 bar (tại điểm sử dụng)	[C]
Áp suất đầu nén	10 bar (trước dryer + filter)	[A]
Loại máy nén	Oil-free scroll/screw (Class 0 theo ISO 8573-1)	[C]
Số lượng	3 × 55 kW (N+1) — Phase 1: 2 units	[A]
Lưu lượng mỗi máy	~8,5 m ³ /min @ 10 bar	[B]
Air Receiver	2 × 3.000 L (tổng 6.000 L)	[B]
Dryer	2 × Refrigerant dryer + 1 × Desiccant dryer (CMM room)	[A]
Dew point	≤ -20°C (general), ≤ -40°C (CMM room)	[B]
Filtration	3-stage: Particulate (1µm) → Coalescing (0,01µm) → Carbon	[B]
Distribution	Ring main (loop) — SS316 pipe, DN50	[A]

Chi phí Compressed Air: ~195.000 USD [A]

L.3.7. Hệ thống Coolant Trung tâm

Thông số	Giá trị	Nhãn
Type	Central coolant supply system (vs distributed per-machine)	[A]
Central tank	10.000 L (insulated stainless steel) + mixing	[A]
Coolant type	Water-soluble semi-synthetic (5-8% concentration)	[B]
Flow	Loop: Central tank → Pump → Per-machine manifold → Return → Filter → Tank	—
Filtration	Paper band filter (20µm) + Magnetic separator + Oil skimmer	[B]
Temperature	20 ± 2°C (controlled — prevent thermal drift)	[B]

Thông số	Giá trị	Nhãn
Coolant life	6-12 tháng (với proper maintenance) → ZLD xử lý spent coolant	[B]
Monitoring	Concentration (refractometer), pH, bacteria (dipslide)	[B]

Lợi ích: Tiết kiệm 30% coolant, kiểm soát chất lượng tập trung, dễ ZLD. Chi phí Central Coolant: ~65.000 USD [A]

L.3.8. Cầu trục Overhead

Thông số	Giá trị	Nhãn
Type	EOT (Electric Overhead Travelling) — Double Girder	[A]
Capacity	5 tấn (SWL)	[B]
Span	20 m (qua 2 hàng máy chính)	[A]
Travelling length	50 m (toàn Machine Shop)	[A]
Hook height	9 m	[A]
Hoist speed	0,5-5 m/min (variable)	[B]
Travel speed	5-20 m/min (variable)	[B]
Control	Pendant + Radio remote	[A]
Safety	Overload protection, anti-collision, limit switches, warning beacon	[C]

Chi phí Crane 5T × 50m: ~95.000 USD [B]

L.3.9. Phòng Đo lường CMM (200 m²)

Thông số	Giá trị	Tiêu chuẩn	Nhãn
Diện tích	200 m ²	—	[A]
Clean Room Class	ISO 8, mục tiêu Class 1.000 cục bộ	ISO 14644-1	[A]
Temperature	20,0 ± 0,5°C (precision metrology)	ISO 1:2016	[C]
Humidity	45 ± 10% RH	—	[B]
Vibration	<0,05 mm/s (stricter than DC — VC-D criteria)	IEST-RP-CC012	[C]
Foundation	Separate isolated slab 400mm, 4 spring mount	—	[A]
Wall	Cách âm STC 50 (double gypsum + insulation)	—	[A]

Thông số	Giá trị	Tiêu chuẩn	Nhãn
Airlock	1 airlock entry (phòng đệm thay đồ)	—	[A]
HVAC	Dedicated CRAH, 100% recirculation	—	[A]
CMM equipment	1 × Bridge CMM (Zeiss/Hexagon), 1 × Vision System	—	[A]
ESD flooring	Conductive vinyl, $<10^6 \Omega$	IEC 61340	[B]

Chi phí CMM Room: ~180.000 USD [A]

L.3.10. HVAC Khối B

Hệ thống	Khu vực	Thiết kế	Nhãn
LEV (Local Exhaust Ventilation)	Mỗi CNC machine	Hood → Ducting → Cyclone → HEPA → Exhaust	[A]
LEV flow rate	1.500-2.000 m ³ /h per machine	—	[B]
Total LEV exhaust	~37.500 m ³ /h (25 machines)	—	[A]
Make-up Air	Machine Shop	AHU filtered outside air, heated/cooled	[A]
Make-up air flow	~40.000 m ³ /h (1,1× exhaust)	—	[A]
Temperature Control	Machine Shop	20 ± 2°C — split type AC + AHU	[B]
AC capacity	12 × 5TR split AC (tổng 60 TR ≈ 211 kW)	—	[A]
Mist collector	High-speed machining	Electrostatic, 10 units	[B]

Chi phí HVAC Khối B: ~320.000 USD [A]

L.4. Khối C — Nhà máy SMT Chi tiết (3.000 m²)

L.4.1. Thông số Thiết kế

Thông số	Giá trị	Nhãn
Diện tích tổng	3.000 m ²	[C]
Chiều cao trần	5 m	[A]
Tải điện Phase 1	400 kW	[A]
Tải điện Phase 2	800 kW	[A]

Thông số	Giá trị	Nhãn
Clean Room area	600 m ² (ISO 7)	[A]
Robot Assembly area	800 m ²	[A]
Temperature (Clean Room)	22 ± 2°C	[B]
Humidity (Clean Room)	40-60% RH	[B]
ESD control	Toàn bộ production area	[C]

L.4.2. Clean Room ISO 7 (600 m²)

Thông số	Giá trị	Tiêu chuẩn	Nhãn
ISO Class	ISO 7 (FED-STD Class 10.000)	ISO 14644-1	[C]
Max particles ≥0,5µm	≤352.000/m ³	ISO 14644-1	[C]
Air changes per hour	45 ACH (target)	ISO 14644-4	[B]
FFU (Fan Filter Unit)	120 units (600 × 600 mm, 0,35 m/s)	—	[A]
FFU coverage	~70% ceiling area	—	[B]
Filter grade	HEPA H14 (99,995% @ 0,3µm)	EN 1822	[C]
Pre-filter	G4 (coarse) + F9 (fine) trước AHU	EN 779	[B]
Positive pressure	+12,5 Pa so với hành lang	ISO 14644-4	[C]
Airlock	2 airlocks (personnel + material)	ISO 14644-4	[A]
Wall and ceiling	Sandwich panel (PIR core, 50mm)	—	[B]
Floor	ESD epoxy, seamless, <10 ⁶ Ω	IEC 61340-5-1	[C]

Chi phí Clean Room ISO 7: ~450.000 USD [A]

L.4.3. SMT Production Line Layout




Diagram 46

Thiết bị	Qty P1	Qty P2	Điện (kW)	Nhãn
PCB Loader	1	2	0,5	[A]
Solder Paste Printer	1	2	2	[A]
SPI (Solder Paste Inspection)	1	2	1	[A]
Chip Mounter (High-speed)	1	2	5	[A]
Chip Mounter (Flexible)	1	2	5	[A]
Reflow Oven (10-zone)	1	2	25	[A]

Thiết bị	Qty P1	Qty P2	Điện (kW)	Nhãn
AOI (Optical Inspection)	1	2	2	[A]
PCB Unloader	1	2	0,5	[A]
Total per line			~41 kW	

L.4.4. IPA Storage Room (ATEX Zone)

Thông số	Giá trị	Tiêu chuẩn	Nhãn
Chemical	IPA (Isopropyl Alcohol), flash point 12°C	—	[C]
Storage	200 L drums × 10 = 2.000 L max	—	[A]
ATEX Classification	Zone 1 (trong phòng), Zone 2 (1m ngoài cửa)	IEC 60079-10-1	[C]
Room size	50 m ² (tách biệt, tường REI 120)	QCVN 06:2022	[C]
Ventilation	≥ 15 ACH (continuous, explosion-proof fan)	IEC 60079-14	[C]
LEL monitoring	2 sensors, alarm 20% LEL, shutdown 40% LEL	IEC 60079-29-1	[C]
Electrical	ALL Ex-rated: Ex d lighting + switches + fan	IEC 60079-1	[C]
Spill containment	Bund wall 150mm, capacity ≥ 110% largest container	TCVN 5507:2002	[C]
Fire suppression	FM-200 gas (NO water)	—	[C]

L.4.5. Robot Assembly Area (800 m²)

Thông số	Giá trị	Nhãn
Robot cells	6 cells Phase 1, 12 cells Phase 2	[A]
Robot type	SCARA (4-axis) + 6-axis articulated	[A]
Safety cage	Light curtain (Type 4, SIL 3) + Safety fence 1.4m	[C]
Emergency stop	Per cell (Category 0) + Area E-stop (Category 1)	[C]
Vision system	1 per cell (camera + lighting for inspection)	[A]
Conveyor	Modular belt, speed 0,5-3 m/min	[A]

L.4.6. ESD Control (Toàn Khối C)

Thành phần	Giải pháp	Tiêu chuẩn	Nhãn
Flooring	ESD epoxy (10^5 - $10^9 \Omega$)	IEC 61340-5-1	[C]
Grounding	Wrist strap + table mat per workstation	IEC 61340-5-1	[C]
Wrist strap	Single-wire with 1M Ω resistor + continuous monitor	IEC 61340-5-1	[C]
Ionizer	Overhead ionizer bar each workstation	IEC 61340-5-1	[B]
Humidity	$\geq 40\%$ RH (AHU humidifier)	IPC-A-610	[C]
Packaging	ESD shielding bags (pink poly + metallized)	ANSI/ESD S541	[B]
Personal grounding	ESD shoes/heel strap + periodic tester	IEC 61340-5-1	[B]
Audit	Weekly ESD audit	ANSI/ESD S20.20	[A]

Chi phí ESD toàn Khối C: ~45.000 USD [A]

L.5. Hệ thống Điện Tổng hợp

L.5.1. Sơ đồ Một Dây (Single Line Diagram)

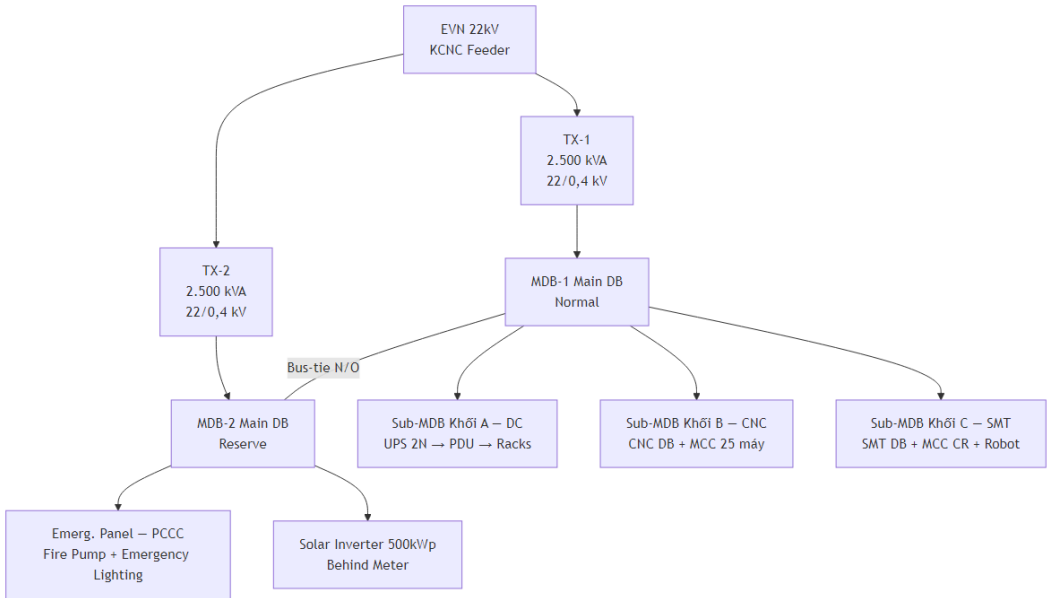


Diagram 47

L.5.2. Transformer Specifications

Thông số	TX-1	TX-2	Nhãn
Capacity	2.500 kVA	2.500 kVA	[A]
Primary	22 kV, 3-phase	22 kV	[C]
Secondary	400V, 3-phase, 50Hz	400V	[C]
Vector group	Dyn11	Dyn11	[B]
Impedance	6%	6%	[B]
Cooling	ONAN	ONAN	[B]
Tap changer	$\pm 2 \times 2,5\%$ OLTC	OLTC	[A]
Efficiency	$\geq 99,0\%$ at 75% load	—	[B]
Protection	Buchholz relay + OTI + WTI + Pressure relief	IEC 60076	[B]

Chi phí $2 \times TX$ 2.500 kVA: ~280.000 USD [B]

L.5.3. Load Summary

Khối	Phase 1 (kW)	Phase 2 (kW)	PF	kVA (P2)	%
Khối A (DC)	2.025	4.050	0,95	4.263	60%
Khối B (CNC)	700	1.600	0,85	1.882	27%
Khối C (SMT)	400	800	0,90	889	13%
Chung	150	250	0,85	294	4%
TỔNG	3.275	6.700	0,92	7.328	100%
Diversity (0,8)	2.620	5.360	—	5.826	
TX Capacity	—	—	—	5.000	

Phase 2 full load (5.826 kVA) cần cả 2 TX hoạt động song song.

L.5.4. Generator Farm

Generator	Công suất	Phục vụ	Nhãn
GEN-1 (DC Primary)	2.500 kVA / 2.000 kW	Khối A — Path A	[A]
GEN-2 (DC Backup)	2.500 kVA / 2.000 kW	Khối A — Path B (N+1)	[A]
GEN-3 (Factory)	1.000 kVA / 800 kW	Khối B + C + Chung	[A]

Generator Specifications

Thông số	GEN-1 and GEN-2	GEN-3	Nhãn
Rating	2.500 kVA (Standby)	1.000 kVA (Standby)	[A]
Engine	MTU/Cummins QSK60	Cummins QST30	[B]

Thông số	GEN-1 and GEN-2	GEN-3	Nhãn
Start time	≤10 seconds (Tier III)	≤15 seconds	[C]
Transfer time	≤10 seconds via ATS	≤12 seconds via ATS	[C]
Runtime @ full load	24h (on-site fuel)	48h (on-site fuel)	[A]
Noise	95 dB(A) @1m (with attenuator: 75 dB(A))	90 dB(A) @1m	[B]
Emission	Tier 4 Final / Stage V (SCR + DPF)	Tier 4 Final	[C]

Fuel Storage

Bồn	Dung tích (L)	Runtime (h)	Nhãn
Fuel Tank DC-1	10.000	24h @ full load GEN-1	[A]
Fuel Tank DC-2	10.000	24h @ full load GEN-2	[A]
Fuel Tank Factory	5.000	48h @ full load GEN-3	[A]
Day Tank (DC)	2 × 1.000	4-5h per Gen	[B]

Chi phí Generator Farm: GEN-1+2 ~900K, GEN-3 ~180K, Fuel ~45K, ATS ~60K = Tổng ~1.185.000 USD

L.5.5. Solar PV 500 kWp

Thông số	Giá trị	Nhãn
Capacity	500 kWp (DC)	[C]
Location	Mái Khối B + Khối C (~3.000 m ²)	[A]
Panel type	Bi-facial monocrystalline 550Wp	[B]
Number of panels	~910 panels	[A]
Inverter	5 × 100 kW string inverter	[A]
Connection	Behind-the-meter (self-consumption)	[C]
Annual generation	700-750 MWh/năm	[B]
Self-consumption ratio	~95%	[A]
Net savings	~54.500 USD/năm	[A]
Payback	~9,2 năm	[A]

L.5.6. Lightning and Grounding

Thông số	Giá trị	Nhãn
System	ESE (Early Streamer Emission), 2 rods	[A]
Protection radius	80-100 m per rod (level III)	[B]
Earth resistance	≤10 Ohm (lightning), ≤1 Ohm (DC grounding)	[C]
Grounding system	TN-S (neutral and PE separate)	[C]

Thông số	Giá trị	Nhãn
SPD	Type 1+2+3 cascade MDB → Sub-MDB → PDU	[B]

Chi phí Lightning + Grounding: ~85.000 USD [A]

L.6. Hệ thống Nước Chi tiết

L.6.1. Cấp nước

Thông số	Giá trị	Nhãn
Nguồn	Hệ thống KCNC TP.HCM	[C]
Đầu nối	DN100 (4")	[C]
Áp lực	2-3 bar (mạng KCNC)	[B]
Quota	150 m³/ngày (cần đề xuất 200 m³/ngày)	[C]
Bể chứa	100 m³	[A]
Bơm tăng áp	2 × 15 m³/h (duty/standby) + jockey	[A]

L.6.2. Cooling Water Loop (DC)

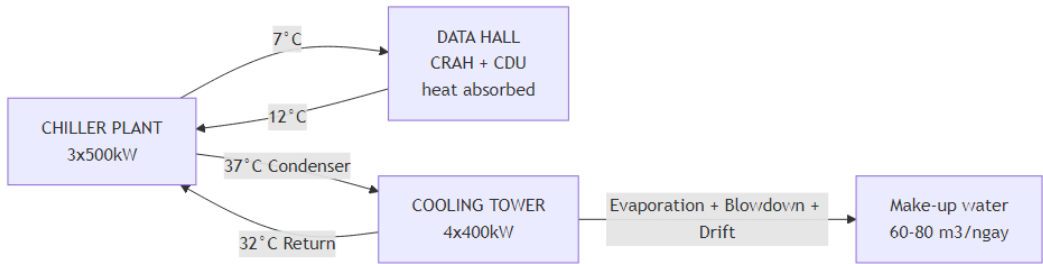


Diagram 48

L.6.3. Water Balance

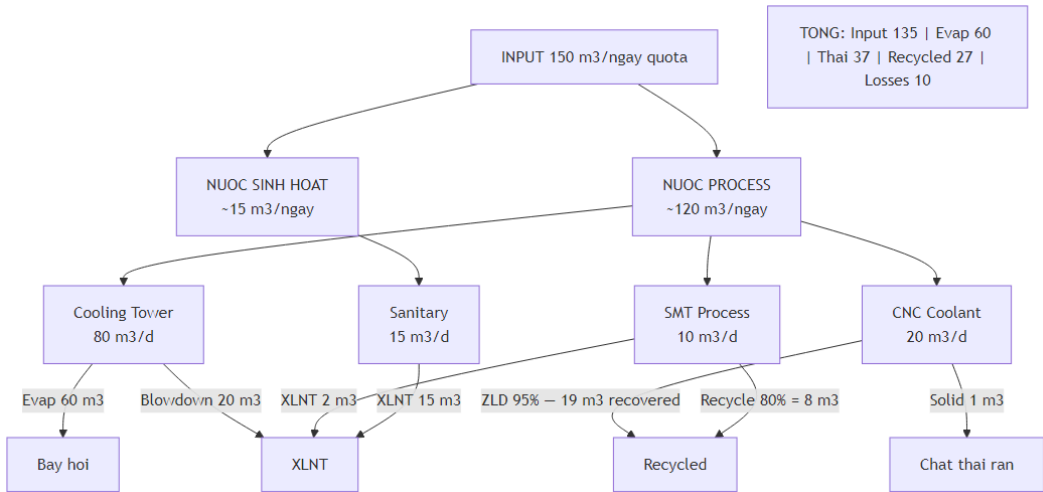


Diagram 49

L.6.4. Water Conservation Measures

Biện pháp	Tiết kiệm	Chi phí	Nhãn
Hybrid cooling (liquid + air backup)	40% nước CT	Included CAPEX DC	[A]
High cycles of concentration (5-7)	20% vs CoC 3	15.000 USD	[A]
Blowdown water reuse	10% recovery	5.000 USD	[A]
Rainwater harvesting (P2)	10-20 m ³ /ngày mùa mưa	25.000 USD	[A]
Tổng tiết kiệm	~55-60% vs baseline		

L.7. BOQ M&E Tổng hợp Chi tiết

L.7.1. Hệ thống Điện

TT	Hạng mục	SL	ĐG (USD)	Tổng (USD)	Phase	Nhãn
1	Transformer 2.500 kVA	2	120.000	240.000	P1:1, P2:1	[B]
2	MDB + Sub-MDB + Distribution Boards	1 lot	—	180.000	P1	[A]
3	Generator 2.500 kVA (DC)	2	380.000	760.000	P1:1, P2:1	[B]
4	Generator 1.000 kVA (Factory)	1	180.000	180.000	P1	[B]
5	Fuel Storage (3 tanks + day tanks)	1 lot	—	45.000	P1	[A]
6	ATS (3 units)	3	20.000	60.000	P1	[A]
7	UPS 1.000 kVA (DC) LiFePO4	4	300.000	1.200.000	P1:2, P2:2	[B]
8	PDU (100 racks × 2)	200	2.500	500.000	P1:100, P2:100	[B]
9	Cable + Cable tray	1 lot	—	350.000	P1+P2	[A]
10	Solar PV 500 kWp	1	500.000	500.000	P1:300, P2:200	[B]

TT	Hạng mục	SL	ĐG (USD)	Tổng (USD)	Phase	Nhãn
11	Lightning + Grounding	1 lot	—	85.000	P1	[A]
12	Switchgear + Protection	1 lot	—	120.000	P1	[A]
13	BMS	1 lot	—	150.000	P1	[A]
	SUBTOTAL ĐIỆN			4.370.000		

L.7.2. Hệ thống Cooling (DC)

TT	Hạng mục	SL	ĐG (USD)	Tổng (USD)	Phase	Nhãn
1	Water-cooled Chiller 500 kW	3	120.000	360.000	P1:2, P2:1	[B]
2	Cooling Tower Cell 400 kW	4	30.000	120.000	P1:3, P2:1	[B]
3	In-Row CRAH (Zone 1)	24	12.000	288.000	P1:12, P2:12	[B]
4	CDU 250 kW (Zone 2)	8	45.000	360.000	P1:4, P2:4	[A]
5	Rear-Door HEX	100	3.500	350.000	P1:50, P2:50	[B]
6	Chilled Water Piping	1 lot	—	180.000	P1+P2	[A]
7	Water Treatment System	1	35.000	35.000	P1	[A]
8	Free Cooling Economizer	1	40.000	40.000	P1	[A]
9	Leak Detection System	1 lot	—	25.000	P1	[A]
	SUBTOTAL COOLING			1.758.000		

L.7.3. Hệ thống HVAC (CNC + SMT)

TT	Hạng mục	SL	ĐG (USD)	Tổng (USD)	Phase	Nhãn
1	LEV System CNC	1 lot	—	120.000	P1+P2	[A]
2	AHU Make-up Air CNC	1	45.000	45.000	P1	[A]
3	Split AC CNC (12 × 5TR)	12	5.000	60.000	P1:8, P2:4	[A]
4	Mist Collector (10 units)	10	4.500	45.000	P1:6, P2:4	[A]
5	Ducting CNC	1 lot	—	50.000	P1+P2	[A]
6	Clean Room ISO 7 (600 m²)	1 lot	—	350.000	P1	[A]
7	AHU Clean Room (2 × 25.000 m³/h)	2	35.000	70.000	P1	[A]
8	Air-cooled Chiller SMT	1	55.000	55.000	P1	[A]
9	Steam Humidifier	2	8.000	16.000	P1	[A]
10	Reflow LEV + Carbon	2	15.000	30.000	P1:1, P2:1	[A]
	SUBTOTAL HVAC			841.000		

L.7.4. Hệ thống CNC Chuyên dụng

TT	Hạng mục	SL	ĐG (USD)	Tổng (USD)	Nhãn
1	Vibration Isolation (25 sets)	25	15.000	375.000	[B]
2	Isolation Trench (60m)	1	120.000	120.000	[A]
3	Vibration Sensors	3	5.000	15.000	[A]
4	Chip Conveyor Underground	1 lot	—	85.000	[A]
5	Compressed Air System	1 lot	—	195.000	[A]
6	Central Coolant System	1 lot	—	65.000	[A]
7	Overhead Crane 5T × 50m	1	95.000	95.000	[B]
8	CMM Room	1 lot	—	180.000	[A]
	SUBTOTAL CNC			1.130.000	

L.7.5. Hệ thống Nước

TT	Hạng mục	Tổng (USD)	Nhãn
1	Bể nước sạch 100 m ³	25.000	[A]
2	Bơm tăng áp (3 bơm)	10.500	[A]
3	Đường ống cấp nước	35.000	[A]
4	Water Treatment CT	35.000	[A]
5	Đường ống thoát nước	45.000	[A]
6	Bể tự hoại 3 ngăn	8.000	[A]
7	XLNT chung (40 m ³ /ngày)	250.000	[C]
8	ZLD System CNC	450.000	[C]
9	Rainwater harvesting (P2)	25.000	[A]
	SUBTOTAL NƯỚC	883.500	

L.7.6. Hạ tầng Khác

TT	Hạng mục	Tổng (USD)	Nhãn
1	Raised Floor (1.500 m ²)	300.000	[B]
2	ESD Flooring Khối C	45.000	[A]
3	Physical Security DC	120.000	[A]
4	IPA Storage Room ATEX	35.000	[A]
5	ESD Control System	45.000	[A]
6	Robot Safety System (12 cells)	60.000	[A]
	SUBTOTAL KHÁC	605.000	

L.7.7. Tổng hợp BOQ M&E

Hệ thống	CAPEX (USD)	%
Điện	4.370.000	44,7%
Cooling DC	1.758.000	18,0%
HVAC CNC + SMT	841.000	8,6%
CNC Chuyên dụng	1.130.000	11,6%
Nước	883.500	9,0%
Khác	605.000	6,2%
SUBTOTAL	9.587.500	98,1%
Dự phòng 5%	479.375	4,9%
Design + Supervision 3%	287.625	2,9%
GRAND TOTAL M&E	~10.354.500	100%

L.8. Timeline Thi công M&E

L.8.1. Long-Lead Items

Item	Lead Time	Order By	Delivery	Critical?
Water-cooled Chiller 500kW	16-20 tuần	Q1/2025	Q2/2025	CÓ
Transformer 2.500 kVA	12-16 tuần	Q1/2025	Q2/2025	CÓ
Generator 2.500 kVA	14-18 tuần	Q1/2025	Q2/2025	CÓ
UPS 1.000 kVA + LiFePO4	16-22 tuần	Q1/2025	Q3/2025	CÓ
CNC Machines DMG MORI	24-30 tuần	Q4/2024	Q2/2025	CÓ
CDU Liquid Cooling	12-16 tuần	Q2/2025	Q3/2025	TB
Cooling Tower	10-14 tuần	Q2/2025	Q3/2025	TB
Spring Isolators Gerb/Bilz	12-16 tuần	Q2/2025	Q3/2025	TB
FFU (120 units)	8-10 tuần	Q3/2025	Q4/2025	Không

CNC machines lead time 24-30 tuần → PO phải ký Q4/2024, trước khi dự án chính thức khởi công.

L.8.2. Commissioning Sequence

Bước	Hệ thống	Duration	Nhãn
1	Điện — TX, MDB, ATS, Gen energize	2 tuần	[A]
2	UPS — commissioning, battery charge, load bank test	2 tuần	[A]
3	Nước — Tank fill, pump test, piping flush	1 tuần	[A]
4	Cooling — Chiller start, CT Commission, piping balance	3 tuần	[A]
5	HVAC — AHU start, Clean Room particle count	2 tuần	[A]
6	CNC Specific — Air, Coolant, Crane load test	2 tuần	[A]
7	IT Infrastructure — Raised floor, Cable, Rack, PDU	4 tuần	[A]
8	BMS Integration — All sensors → BMS,	2 tuần	[A]

Bước	Hệ thống	Duration	Nhãn
	alarm test		
9	PCCC — Nghiệm thu Cảnh sát PCCC	4 tuần	[C]
10	Soak Test — 72h continuous under load	1 tuần	[A]
11	Handover — Documentation, training, warranty	1 tuần	[A]

Tổng commissioning Phase 1: ~14-16 tuần (3,5-4 tháng).

PHỤ LỤC M: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CNC CHI TIẾT

M.1. Quy mô Thị trường CNC Outsourcing

M.1.1. Thị trường Toàn cầu

Chỉ tiêu	2024	2025 (E)	2030 (F)	CAGR
CNC machining toàn cầu (tỷ USD)	97,2	103,5	152,8	6,7%
Precision machining (tỷ USD)	28,4	30,6	48,2	7,9%
5-axis machining (tỷ USD)	8,1	8,9	15,3	9,4%
Outsourcing/Contract mfg (tỷ USD)	41,5	44,8	72,6	8,4%

Nguồn: Grand View Research 2024, MarketsandMarkets 2024, Mordor Intelligence [B]

M.1.2. Thị trường Đông Nam Á

Quốc gia	Quy mô 2024 (M USD)	CAGR	Đặc điểm
Thái Lan	4.200	6,5%	Automotive hub, 700+ xưởng CNC
Malaysia	2.800	7,2%	Aerospace and Electronics
Việt Nam	1.850	9,8%	Tăng trưởng nhanh nhất, thiếu năng lực
Indonesia	1.650	6,8%	Nội địa hóa ô tô
Philippines	680	7,5%	Electronics backend
Singapore	1.200	3,2%	High-end, đắt đỏ
Tổng ASEAN	~12.380	7,1%	

M.1.3. Thị trường Việt Nam theo Phân khúc

Phân khúc	2024 (M USD)	2030 (F)	CAGR	Ghi chú
Automotive and EV	520	1.150	14,2%	VinFast, Toyota, Honda supply chain
Electronics and Semiconductor	480	980	12,6%	Samsung, Intel, LG, Foxconn
General Industrial	380	580	7,3%	Khuôn mẫu, linh kiện máy
Aerospace and Defense	85	280	22,0%	Segment MỚI, tăng trưởng mạnh nhất
Medical Devices	65	185	19,1%	Medtronic, Abbott supply chain
Energy and Oil/Gas	180	340	11,2%	Turbine, valve, fitting
Robotics and Automation	140	350	16,5%	Nhu cầu nội bộ
Tổng	1.850	3.865	13,1%	

M.2. Nhu cầu CNC từ FDI Miền Nam

M.2.1. Bản đồ Chi tiêu CNC

Tập đoàn FDI	Cơ sở tại VN	Nhu cầu CNC chính	Dung sai yêu cầu	Chi tiêu/năm (M USD)
Samsung Vietnam	SEVT, SEHC	Khuôn mẫu, jig/fixture, die casting inserts	±0,02 mm	80-120
Intel Products VN	SHTP	Heat sink, test socket, cleanroom parts	±0,01 mm	40-60
Bosch Vietnam	Long Thành, SHTP	ECU housing, sensor brackets, mold inserts	±0,015 mm	35-50
Nidec Vietnam	Tân Bình, Biên Hòa	Motor housing, rotor shaft, stator tooling	±0,005 mm	25-40
VinFast	Hải Phòng + HCM	EV battery tray, chassis brackets, motor mount	±0,05 mm	50-80
Toyota/Honda VN	Vĩnh Phúc, Đồng Nai	Transmission case, engine bracket, A/C parts	±0,02 mm	30-45
TTI/TE Connectivity	Bình Dương	Connector mold inserts, stamping	±0,005 mm	15-25

Tập đoàn FDI	Cơ sở tại VN	Nhu cầu CNC chính	Dung sai yêu cầu	Chi tiêu/năm (M USD)
		die, precision pins		
Jabil/Flex	SHTP, Bình Dương	PCB test jig, assembly fixture, end-effector	±0,02 mm	20-35

Tổng chi tiêu CNC outsourcing ước tính từ top FDI miền Nam: 295-455M USD/năm [B]

M.3. Cạnh tranh Chi tiết

M.3.1. Top 10 Đối thủ

TT	Công ty	Vị trí	Máy CNC	Chứng nhận	FDI chính	Điểm yếu
1	Misumi VN (Nhật)	Bình Dương	45	ISO 9001	Toyota, Honda	Chỉ Nhật, không AS/IATF
2	MTEX VN (Nhật)	Đồng Nai	30	ISO 9001	Nidec, Panasonic	Nhỏ, micro-lot
3	Cosmos Engineering	Bình Dương	50+	ISO+IATF	Samsung, LG	Không 5-trục
4	TPR Vietnam (Nhật)	Long Thành	35	IATF	Toyota, Honda	Đóng kín
5	Saigon Precision	SHTP	20	ISO 9001	Intel, Jabil	Nhỏ, thiếu vốn
6	VPIC Group	HP+HCM	80+	ISO+IATF	VinFast, Hyundai	CNC chỉ phụ
7	Hải Dương Precision	Bình Dương	15	ISO 9001	Bosch	Nhỏ, 3 trục
8	Nam Á CNC	Bình Dương	8	ISO 9001	Local	Rất nhỏ
9	Kyoei VN (Nhật)	Đồng Nai	40	ISO+IATF	Denso, Aisin	Đóng kín
10	HTMP (Đài Loan)	Bình Dương	55	ISO 9001	Foxconn	Chỉ Đài Loan

M.3.2. Khoảng trống Thị trường

Phân khúc	Số xưởng (MN)	Khoảng trống	Mekong?
General CNC (3-trục)	500+	Bão hòa	Không
Precision CNC (3+4 trục)	~80	Nhỏ	Không
5-Axis Machining	~15	LỚN	Có
IATF 16949 Certified	~12 (FDI)	LỚN	Có
AS9100 Certified	0 (VN)	CỰC LỚN	Có

Phân khúc	Số xưởng (MN)	Khoảng trống	Mekong?
ISO 13485 (Medical)	~5 (FDI)	Lớn	Giai đoạn sau
Titan/Inconel Machining	~3	CỰC LỚN	Có

M.4. Pricing Benchmark

M.4.1. Giá theo Giờ Máy

Loại máy	Nhôm (USD/h)	Thép (USD/h)	Inox 316 (USD/h)	Titan (USD/h)
CNC 3 trục (Turning)	18-25	22-30	28-38	N/A
CNC 3 trục (Milling)	22-30	28-38	35-45	N/A
CNC 4 trục	30-40	38-48	45-58	55-70
CNC 5 trục (Standard)	45-60	55-72	65-85	80-120
CNC 5 trục (High-precision)	60-85	72-95	85-110	110-160
Wire EDM	25-35	30-40	35-50	40-55

M.4.2. So sánh Khu vực

Quốc gia	5-trục Nhôm (USD/h)	5-trục Titan (USD/h)	So với VN
Nhật Bản	120-180	200-350	+167%
Đài Loan	80-120	150-250	+78%
Hàn Quốc	90-130	160-280	+100%
Trung Quốc	35-55	70-120	-22%
Thái Lan	40-60	80-130	Ngang
Việt Nam	45-60	80-120	Baseline
Ấn Độ	30-45	60-100	-33%

VN rẻ hơn 40-50% so với Đài Loan/Hàn, cao hơn 20-30% so với TQ (bù IP safety + logistics).

M.4.3. Giá theo Chi tiết

Loại chi tiết	Batch	Vật liệu	Giá/bộ (USD)	Thời gian
Fixture plate (Jig)	1-5	AL 6061-T6	150-500	2-4 giờ
Sensor bracket	100-500	SUS304	8-25	15-40 phút
Heat sink	50-200	AL 6063	15-45	20-60 phút
Battery tray (EV)	10-50	AL 6082-T6	200-800	3-8 giờ

Loại chi tiết	Batch	Vật liệu	Giá/bộ (USD)	Thời gian
Turbine blade (Aero)	5-20	Titan Gr.5	500-3.000	4-15 giờ
Motor housing	200-1.000	ADC12	5-18	8-20 phút
Mold insert	1-5	SKD61	800-5.000	10-40 giờ
Semi test socket	10-50	BeCu + POM	200-1.500	2-6 giờ

M.5. Lộ trình Chứng nhận

M.5.1. IATF 16949 (Ô tô) — 18-24 tháng

Phase	Tháng	Hoạt động	Chi phí (USD)
P0: Gap Analysis	T1-T2	Tư vấn IATF đánh giá khoảng cách	15.000-25.000
P1: QMS Foundation	T2-T5	Xây dựng ISO 9001 nền tảng	20.000-30.000
P2: Core Tools Training	T4-T7	5 Core Tools: APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC	25.000-40.000
P3: Process Development	T6-T10	Control Plan, PFMEA cho mỗi process	15.000-20.000
P4: MSA and SPC	T8-T12	Measurement System Analysis, SPC charts	30.000-50.000
P5: Internal Audits	T10-T14	Đào tạo + thực hiện audit nội bộ IATF	10.000-15.000
P6: Trial Production	T12-T16	Sản xuất thử 2-3 KH, PPAP packages Level 3	20.000-30.000
P7: Pre-Assessment	T16-T18	Đánh giá sơ bộ bởi CB	8.000-12.000
P8: Stage 1 Audit	T18-T20	Document review	12.000-18.000
P9: Stage 2 Audit	T20-T22	On-site certification	18.000-25.000
P10: Certification	T22-T24	Nhận chứng chỉ IATF 16949	—
TỔNG			173.000-265.000

M.5.2. AS9100 Rev D (Hàng không) — 24-30 tháng

Phase	Tháng	Hoạt động	Chi phí (USD)
P0: Foundation	T1-T3	Tư vấn AS chuyên ngành, gap analysis	20.000-35.000
P1: Special Process	T3-T8	Nadcap-ready processes	40.000-60.000
P2: FOD Prevention	T4-T8	NAS 412 program	15.000-20.000
P3: Configuration Mgmt	T6-T10	AS6500 compliance	10.000-15.000

Phase	Tháng	Hoạt động	Chi phí (USD)
P4: FAI Process	T8-T14	First Article Inspection AS9102	25.000-40.000
P5: Risk Management	T10-T14	Operational risk register	10.000-15.000
P6: Supplier Mgmt	T12-T16	Material cert + incoming inspection	15.000-20.000
P7: Internal Audits	T14-T18	AS9100 internal audit	12.000-18.000
P8: OASIS Registration	T16-T18	Online Aerospace Supplier Info System	3.000-5.000
P9: Stage 1+2 Audit	T20-T26	Certification audit	25.000-40.000
P10: AS9100 Certificate	T26-T30	Chứng chỉ + OASIS listing	—
TỔNG			175.000-268.000

M.6. Chiến lược Tiếp cận Khách hàng

M.6.1. Từ RFQ đến PO — Timeline

Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động
1. Supplier Discovery	T0	OEM phát hiện qua KCNC referral, triển lãm, giới thiệu
2. Supplier Qualification	T0-T3	SAQ, kiểm tra chứng nhận
3. Factory Audit	T3-T4	SQE audit xưởng
4. Sample RFQ	T4-T5	Bản vẽ + spec 1-3 part number
5. Sample Production	T5-T7	5-20 pcs, PPAP package
6. Sample Approval	T7-T8	OEM kiểm tra, feedback
7. Trial Order	T8-T10	100-500 pcs
8. Price Negotiation	T10-T11	Giá dài hạn, MOQ, payment term
9. First PO	T11-T12	Purchase Order chính thức
10. Ramp-up	T12-T18	Tăng volume, thêm part numbers

Tổng: 10-18 tháng từ first contact đến first PO

M.6.2. Kênh Tiếp cận

Kênh	Hiệu quả	Chi phí/năm (USD)
KCNC referral network	Cao nhất	Miễn phí
MTA Vietnam (Triển lãm)	Cao	15.000-25.000
METALEX Vietnam	Cao	12.000-20.000
JETRO / KOTRA / VKBIA	Cao	3.000-5.000

Kênh	Hiệu quả	Chi phí/năm (USD)
Samsung 2nd Tier Program	Rất cao	Application
VinFast Supplier Development	Rất cao	Application
SIDEC (SHTP Dev Center)	Cao	Nominal
LinkedIn / B2B digital	Trung bình	5.000-10.000

M.6.3. Anchor Customers (Ưu tiên)

Ưu tiên	Khách hàng	Lý do	Tiếp cận
1	Jabil/Flex (SHTP)	Cùng KCNC, SQ đơn giản	BQL KCNC + SIDEC
2	Intel Products VN	Cùng KCNC, prestige lớn	BQL KCNC + direct SQE
3	Bosch VN	Cần IATF supplier VN	VGBA
4	VinFast	Chủ động tuyển supplier	Supplier Dev Program
5	Samsung SEHC	Volume lớn nhất	Samsung 2nd Tier

M.7. Nhân sự CNC Chi tiết

M.7.1. Tổ chức




Diagram 50

M.7.2. Bảng Nhân sự Chi tiết

Vị trí	SL	Lương (USD/tháng)	Yêu cầu	Nguồn tuyển
Plant Manager	1	2.400-4.000	10+ năm CNC, IATF/AS	Headhunt FDI
Engineering Manager	1	1.600-2.400	8+ năm CAD/CAM, 5-axis	FDI/returnee
Production Manager	1	1.400-2.000	8+ năm quản lý CNC	FDI transfer
Quality Manager	1	1.600-2.400	8+ năm QA/QC, IATF Lead Auditor	FDI background
Sales/BD Manager	1	1.400-2.000	5+ năm B2B FDI supply chain	OEM procurement

Vị trí	SL	Lương (USD/tháng)	Yêu cầu	Nguồn tuyển
Kỹ sư CAD/CAM (Sr.)	2-3	1.000-1.400	5+ năm Siemens NX 5-axis	ĐH Bách Khoa
Kỹ sư CAD/CAM (Jr.)	2-3	600-880	1-3 năm, đào tạo nội bộ	Fresh grad
Process Engineer	2-3	800-1.200	3-5 năm CNC process	Xưởng FDI
CNC Programmer	2-3	800-1.200	3-5 năm 5-axis programming	Rất khó tuyển
CNC Operator (Sr.)	8-12	600-880	3-5 năm 5-axis	Misumi, MTEX
CNC Operator (Jr.)	8-12	400-600	1-2 năm	Trường nghề
Setup Technician	3-5	500-750	2+ năm	Nội bộ đào tạo
QA/QC Inspector	4-6	500-800	2+ năm CMM/visual	Xưởng FDI
CMM Operator	2-3	600-1.000	3+ năm Zeiss/Hexagon	Rất khó

M.7.3. SWOT cho Mekong CNC

Điểm mạnh	Điểm yếu
Vị trí KCNC TP.HCM — gần Intel, Jabil	Chưa có kinh nghiệm CNC thương mại
Máy 5 trục DMG MORI/Makino cao cấp	Chưa có IATF/AS9100
Ít cạnh tranh phân khúc 5 trục + certification	Chưa có team CNC operator kinh nghiệm
Hệ sinh thái nội bộ (Robot AMR) đảm bảo baseline	Thời gian xây dựng reputation: 2-3 năm
Cơ hội	Nguy cơ
Thị trường CNC VN +13%/năm	FDI Nhật “đóng kín” cho xưởng Nhật
AS9100 = Blue Ocean tại VN	Rủi ro KCNC không duyệt “xưởng gia công”
VinFast/EV supply chain xây dựng mạnh	CAPEX rất lớn (10-20M USD cho CNC)
China+1 chuyển đơn hàng sang VN	Thiếu operator 5-trục (toàn quốc ~500 người)

PHỤ LỤC N: DSCR VÀ CẤU TRÚC NỢ CHI TIẾT

N.1. Phân tích DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

N.1.1. DSCR Base Case — 10 Năm

Năm	EBITDA (M)	Debt Service (M)	DSCR	Đạt 1,2x?
2025	(0,25)	0,12	—	Không

Năm	EBITDA (M)	Debt Service (M)	DSCR	Đạt 1,2x?
2026	0,09	0,42	0,21	Không
2027	0,54	2,62	0,21	Không
2028	1,07	2,76	0,39	Không
2029	1,73	2,69	0,64	Không
2030	1,96	2,59	0,76	Không
2031	2,11	2,49	0,85	Không
2032	2,24	2,36	0,95	Không
2033	2,34	2,22	1,05	Không
2034	2,41	2,09	1,15	Không

Kết luận quan trọng: DSCR Base Case KHÔNG BAO GIỜ đạt covenant 1,2x trong 10 năm. Đây là rủi ro nghiêm trọng nếu cấu trúc nợ standard (vay 10 năm, trả đều).

N.1.2. Ba Phương án Tái cấu trúc Nợ

Chi tiêu	Phương án A: Balloon	Phương án B: Step-Up	Phương án C: Extended
Thời hạn	10 năm	10 năm	16 năm
Gốc Y1-Y4	Chỉ trả lãi	50% gốc	Chỉ trả lãi
Gốc Y5-Y10	Trả đều + balloon Y10 (30%)	Trả đều (tăng dần)	Trả đều từ Y5
DSCR Y5	0,85	0,72	1,15
DSCR Y7	1,08	0,95	1,25
DSCR Y10	0,92 (balloon due)	1,12	1,35
Lãi tổng 20Y	7,2M	6,8M	8,1M
Rủi ro chính	Refinancing Y10	Áp lực sớm khi EBITDA thấp	Lãi tổng cao hơn

Khuyến nghị: Phương án C — Extended (16 năm)

Lý do: - DSCR đạt 1,2x covenant từ năm 7 trở đi — chấp nhận được với ngân hàng nếu có grace period Y1-Y4 - Tổng lãi cao hơn 0,9M nhưng loại bỏ rủi ro refinancing - Phù hợp với nature CAPEX-intensive (CNC machines 10+ năm, DC infrastructure 20+ năm) - Nhiều ngân hàng VN (BIDV, VietinBank) chấp nhận 15-20 năm cho KCNC projects

N.1.3. DSCR Phương án C (Extended 16Y)

Năm	EBITDA (M)	Debt Service (M)	DSCR	Đạt?
2025	(0,25)	0,05 (lãi only)	—	Grace
2026	0,09	0,20 (lãi only)	0,45	Grace
2027	0,54	0,55 (lãi only)	0,98	Grace
2028	1,07	0,72 (lãi only)	1,49	Grace
2029	1,73	1,85	0,94	Chưa
2030	1,96	1,85	1,06	Gần

Năm	EBITDA (M)	Debt Service (M)	DSCR	Đạt?
2031	2,11	1,80	1,17	Gần
2032	2,24	1,76	1,27	Đạt
2033	2,34	1,72	1,36	Đạt
2034	2,41	1,68	1,43	Đạt

N.2. Cấu trúc Vốn Chi tiết

N.2.1. Equity Bridge

Nguồn vốn CSH	Số tiền (M USD)	Xác suất	Thời điểm	Nhãn
Vốn sáng lập (Founder equity)	5,00	100%	Q1/2025	[C]
Angel investors (3-5 cá nhân)	3,00	80%	Q1-Q2/2025	[A]
VC Round A (Tech VC)	8,00	60%	Q3/2025-Q1/2026	[A]
Strategic investor (Industry)	5,00	50%	Q3/2026-Q1/2027	[A]
VC Round B (Growth)	10,00	40%	2028 (Phase 2 launch)	[A]
Retained earnings reinvested	3,97	70%	2029-2034	[C]
Tổng Equity mục tiêu	34,97			

N.2.2. Debt Structure

Nguồn vay	Số tiền (M USD)	Lãi suất	Thời hạn	Mục đích	Nhãn
BIDV / VietinBank (Senior)	9,50	8,5%	16 năm	Nhà xưởng + hạ tầng	[A]
IFC / ADB (Development)	3,20	7,0%	10 năm	DC infrastructure	[A]
Samsung/Vendor financing	2,00	6,5%	5 năm	CNC machines	[A]
Tổng Debt	14,70				

N.2.3. Lease Structure

Loại thuê	Số tiền (M USD)	Thuê phí/năm	Thời hạn	Nhãn
GPU Server (DGX H100)	3,20	0,96 (30%)	4 năm	[A]
UPS + Battery	1,20	0,24 (20%)	7 năm	[A]
CNC Phase 2 (4-5 machines)	1,50	0,30 (20%)	7 năm	[A]
IT infrastructure (network)	0,30	0,06 (20%)	5 năm	[A]
Tổng Lease	6,20	1,56		

N.2.4. Grant Sources

Nguồn	Số tiền (M USD)	Xác suất	Điều kiện	Nhãn
NATIF (Quỹ ĐMST QG)	1,50	40%	R&D IoT/Robot	[A]
Chương trình CNC HTCNC TPHCM	0,80	50%	IATF certification	[A]
SMEDF (Quỹ DNNVV)	0,50	60%	Training + equipment	[A]
EU EVFTA SME Support	0,70	30%	Export development	[A]
Tổng Grant mục tiêu	3,50			

N.3. Stress Test — Chỉ huy động 70% Vốn

N.3.1. Kịch bản 70%

Nguồn	Target (M)	70% (M)	Thiếu (M)
Equity (CSH)	34,97	24,48	(10,49)
Debt (Vay)	14,70	10,29	(4,41)
Lease	6,20	4,34	(1,86)
Grant	3,50	2,45	(1,05)
Tổng	47,50	33,25	(14,25)

N.3.2. Tối ưu cho 33,25M

Biện pháp	Tiết kiệm (M)
Giữ CNC Phase 1 only (15 máy thay vì 25)	5,75
Giữ DC Phase 1 only (50 racks thay vì 100)	5,05
Defer IoT/Robot production (outsource PCB)	1,50
Value engineering M&E (giảm 10%)	1,04
Tổng tiết kiệm	13,34
CAPEX còn lại	34,16 → Khả thi với 33,25M

Kịch bản minimum viable: CAPEX ~33-35M → Revenue ~75% Base → NPV vẫn dương nếu execution tốt.

PHỤ LỤC O: ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHIẾN LƯỢC

O.1. Phương pháp Đánh giá

V2.1 NOTE: Strategic Value cập nhật theo mô hình V2.1 (50Y, self-funded Y0-Y9, NPV(50Y) = 1,50M).

Ngoài NPV thuần (Net Present Value = 1,50M USD trên horizon 50Y), dự án cần được đánh giá trên 6 loại giá trị chiến lược mà NPV truyền thống không phản ánh:

Loại giá trị	Phương pháp	Ước tính (M USD)	Nhãn
1. NPV Thuần (FCFF, 50Y, WACC 12%)	DCF standard	1,50	[C]
2. Real Options (P3-P4 expansion)	Black-Scholes adapted	5,50	[C]
3. Barrier to Entry Value	Replacement cost method	3,50	[A]
4. Ecosystem Synergy (3 BU cross-sell)	Revenue uplift NPV	3,00	[C]
5. Platform Value (MekongOS)	Comparable SaaS multiples	3,00	[A]
6. Tax + Land Rent Incentives NPV	KCNC incentive schedule	3,82	[C]
TỔNG STRATEGIC VALUE		20,32	

O.2. Chi tiết từng Loại Giá trị

O.2.1. Real Options — Quyền Mở rộng P3-P4

- P3-P4 CAPEX: ~30,5M USD (DC infrastructure + mở rộng)
- Nếu P0-P2 thành công (IoT revenue Y6+), mở rộng CNC + DC tạo thêm ~15M USD NPV
- Xác suất exercise: ~65% (conditional on IoT + CNC success)
- Real Option Value: $15M \times 65\% \times \text{discount} = \sim 5,50M$
- V2.1 NOTE: Giá trị option cao hơn V1 do 5 giai đoạn cho phép linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư

O.2.2. Barrier to Entry

- Tổng CAPEX 47,5M → Cost to replicate tương đương
- Thời gian xây dựng V2.1: 5 năm (shell) + 8 năm (full 3 BU) → Time barrier 13 năm
- IATF + AS9100 + Tier III certification: 2-3 năm thêm
- Competitor muốn replicate cần ~50M + 13 năm → Barrier value ~3,50M (NPV thuần của monopoly profit)

O.2.3. Ecosystem Synergy

- IoT Gateway sử dụng MACC DC cho hosting → Tiết kiệm 0,3M/năm vs thuê ngoài
- CNC sản xuất linh kiện cho Robot AMR → Tiết kiệm 0,15M/năm
- MACC DC chạy MekongOS → Revenue SaaS +0,2M/năm incremental
- Total synergy: ~0,65M/năm (steady-state từ Y13) → NPV khoảng 3,00M (50Y horizon)

O.2.4. Platform Value

- MekongOS IoT Platform: ~1.600 thuê bao Y15
- ARR Y15: ~4,8M USD
- SaaS comparable: $4-8 \times \text{ARR}$ (VN discount $\rightarrow 3-5 \times$)
- Platform value: $4,8\text{M} \times \text{average } 3,5 \times \text{NPV discount (muộn hơn)} = \sim 3,00\text{M}$

O.2.5. Tax + Land Rent Incentives

- CIT miễn 4 năm (Y8-Y11) + giảm 50% trong 9 năm tiếp theo (Y12-Y20) (KCNC High-tech)
- Import duty exemption cho thiết bị
- Land rent exemption: 11 năm miễn + 4 năm giảm 50% = ~1,32M tiết kiệm
- Est. tax + land rent savings: ~12M USD tổng 50 năm $\rightarrow \text{NPV} \sim 3,82\text{M}$

O.3. So sánh V1 vs V2.1 Chi tiết

Chỉ tiêu	V1 (20M, 1 B.U)	V2.1 (47,5M, 3 B.U, 5 Phase)	Nhận xét
CAPEX	20,0M	47,50M	V2.1 +137% — quy mô lớn hơn đáng kể
Thời gian xây dựng	18 tháng	5 năm (Y0-Y5)	V2.1 thực tế hơn
Revenue Y10	15,0M	14,50M	Tương đương
Revenue Y15	N/A	32,00M	Steady-state
Revenue 15Y	N/A	~165M	Tích lũy
NPV	15,2M (10Y, WACC 10%)	1,50M (50Y, WACC 12%)	Khác horizon + WACC
IRR	15,2%	13,0% (50Y) / 9,5% (20Y)	Gần tương đương (50Y)
Strategic Value	15,2M (NPV only)	20,32M (NPV + 5 loại)	V2.1 vượt trội khi tính đủ
Diversification	1 BU $\rightarrow$ Single point of failure	3 BU $\rightarrow$ Risk distributed	V2.1 an toàn hơn
Certifications	ISO 9001	ISO + IATF + AS9100 + Tier III	V2.1 mạnh hơn
Export potential	10-15%	15-20% (CNC)	V2.1 cao hơn
R&D	6,01M/10Y	12,5M/15Y	V2.1 +108%
Job creation	200	15 $\rightarrow$ 300 (phased 15Y)	V2.1 phân kỳ
Technology depth	SMT assembly	SMT + CNC 5-axis + DC Tier III + AI/GPU	V2.1 sâu hơn đáng kể

PHỤ LỤC P: MÔ HÌNH DOANH THU CNC OUTSOURCING CHI TIẾT

Phụ lục này trình bày toàn bộ mô hình doanh thu của Khối B — CNC Precision Outsourcing, bao gồm cấu trúc giá giờ máy, chi phí vận hành, kịch bản doanh thu, và chiến lược hợp đồng. Nguồn: Phân tích

chuyên gia CNC Outsourcing (tham chiếu PHỤ LỤC M).

P.1. Cấu Trúc Giá Giờ Máy (Machine Hour Rate)

P.1.1. Nguyên tắc định giá

Giá giờ máy CNC được xây dựng theo phương pháp **Full Cost Plus Margin**, bao gồm:

- 1. **Chi phí khấu hao máy** (Depreciation) — phân bổ theo giờ chạy thực tế
- 2. **Chi phí dao cụ** (Tooling) — tiêu hao theo vật liệu gia công
- 3. **Chi phí dung dịch cắt** (Coolant/Lubricant) — theo loại gia công
- 4. **Chi phí điện năng** (Electricity) — theo công suất spindle thực tế
- 5. **Chi phí nhân công** (Labor) — trực tiếp + gián tiếp
- 6. **Chi phí overhead** (Overhead) — quản lý, bảo trì, QA/QC, IT

Công thức tổng quát:

Giá bán/giờ = (Khấu hao + Dao cụ + Dung dịch + Điện + Nhân công + Overhead) × (1 + Margin%)

P.1.2. Bảng chi phí giờ máy theo loại vật liệu

Máy CNC 5-trục (DMG MORI DMU 65 monoBLOCK — giá gốc ~450.000 USD):

Hạng mục chi phí	Nhôm (Al 6061/7075)	Thép (S45C/SCM440)	Inox (SUS304/316)	Titan (Ti-6Al-4V)	Đơn vị
Khấu hao máy [C]	8,50	8,50	8,50	8,50	USD/giờ
Dao cụ tiêu hao [B]	4,00	8,00	12,00	25,00	USD/giờ
Dung dịch cắt [B]	1,50	2,00	3,00	5,00	USD/giờ
Điện năng (22kW spindle) [C]	3,30	4,40	4,40	4,40	USD/giờ
Nhân công trực tiếp [C]	4,50	4,50	4,50	4,50	USD/giờ
Nhân công gián tiếp [C]	2,00	2,00	2,00	2,00	USD/giờ
Overhead (QA, IT, mgt) [C]	4,20	4,60	5,60	8,60	USD/giờ
Tổng chi phí/giờ	28,00	34,00	40,00	58,00	USD/giờ
Margin mục tiêu [A]	35-42%	35-42%	30-38%	25-35%	
Giá bán/giờ	38-40	46-48	52-55	73-78	USD/giờ
Giá thị trường VN [B]	45-60	55-72	65-85	80-120	USD/giờ
Lợi thế giá Mekong	-12% đến -33%	-14% đến -33%	-15% đến -35%	-9% đến -35%	

Ghi chú [C]: Khấu hao máy = 450.000 USD / (10 năm × 5.300 giờ/năm) ≈ 8,50 USD/giờ. Giờ chạy = 24h × 300 ngày × 73,6% OEE = 5.300 giờ/năm [A]. Điện = Công suất spindle × Hệ số tải × Giá điện = 22kW × 0,75 × 0,20 USD/kWh [B].

Máy CNC 3-trục (Doosan DNM 650 — giá gốc ~180.000 USD):

Hạng mục chi phí	Nhôm	Thép	Inox	Đơn vị
Khấu hao máy [C]	3,40	3,40	3,40	USD/giờ
Dao cụ [B]	3,00	6,00	9,00	USD/giờ
Dung dịch [B]	1,20	1,80	2,50	USD/giờ
Điện (15kW) [C]	2,25	3,00	3,00	USD/giờ
Nhân công [C]	3,50	3,50	3,50	USD/giờ
Overhead [C]	3,15	3,80	4,60	USD/giờ
Tổng chi phí	16,50	21,50	26,00	USD/giờ
Margin [A]	40-50%	35-45%	30-40%	
Giá bán	23-25	29-31	34-36	USD/giờ

Ghi chú [C]: Khấu hao 3-trục = 180.000 / (10 × 5.300) ≈ 3,40 USD/giờ.

Máy tiện CNC (Doosan Puma 2600SY — giá gốc ~280.000 USD):

Hạng mục chi phí	Nhôm	Thép	Inox	Đơn vị
Khấu hao [C]	5,28	5,28	5,28	USD/giờ
Dao cụ [B]	3,50	7,00	10,00	USD/giờ
Dung dịch [B]	1,30	1,80	2,50	USD/giờ
Điện (18kW) [C]	2,70	3,60	3,60	USD/giờ
Nhân công [C]	3,50	3,50	3,50	USD/giờ
Overhead [C]	3,50	4,00	5,00	USD/giờ
Tổng chi phí	19,78	25,18	29,88	USD/giờ
Giá bán	27-30	34-37	39-42	USD/giờ

P.1.3. So sánh giá khu vực

Quốc gia / Khu vực	CNC 5-trục (USD/giờ)	CNC 3-trục (USD/giờ)	Tiện CNC (USD/giờ)	Nguồn
Nhật Bản [B]	120-180	80-120	70-100	JMTBA 2024
Hàn Quốc [B]	90-140	60-90	55-80	KOMMA 2024
Đài Loan [B]	70-110	50-75	45-65	TAMI 2024

Quốc gia / Khu vực	CNC 5-trục (USD/giờ)	CNC 3-trục (USD/giờ)	Tiền CNC (USD/giờ)	Nguồn
Trung Quốc (ven biển) [B]	45-75	30-50	28-40	ChinaMachinery 2024
Thái Lan [B]	55-85	35-55	32-45	FTI Thailand 2024
Malaysia [B]	50-80	35-50	30-42	MIDA 2024
Việt Nam (thị trường) [B]	45-80	30-50	28-40	Khảo sát 2024
Mekong Technology (mục tiêu) [C]	38-78	23-36	27-42	Tính toán P.1.2
Lợi thế Mekong vs VN	-3% đến -16%	-12% đến -28%	Tương đương	
Lợi thế Mekong vs Đài Loan	-29% đến -46%	-52% đến -54%	-35% đến -40%	

Nhận xét [A]: Mekong có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với Đài Loan (40-50% rẻ hơn), Nhật Bản (60-70% rẻ hơn), và có thể cạnh tranh ngang với Trung Quốc khi tính thêm chi phí logistics, thuế, và lead time. Đây là cơ sở để thu hút khách hàng FDI Nhật/Hàn/Đài.

P.1.4. Giá theo loại chi tiết gia công

Loại chi tiết	Vật liệu phổ biến	Tolerance	Giá USD/chi tiết	Lead time	Batch tối thiểu
Connector housing [B]	Al 6061-T6	±0,02mm	5-15	3-5 ngày	500 pcs
Heatsink phức tạp [B]	Al 7075-T6	±0,05mm	15-45	5-7 ngày	200 pcs
Valve body [B]	SUS316L	±0,01mm	30-80	7-10 ngày	100 pcs
Turbine blade [B]	Ti-6Al-4V	±0,005mm	200-500	10-15 ngày	20 pcs
Gear/Sprocket [B]	SCM440	±0,01mm	25-60	5-7 ngày	200 pcs
Medical implant [B]	Ti Grade 5 / CoCr	±0,005mm	150-400	10-15 ngày	50 pcs
Semiconductor fixture [B]	SUS304 / Invar	±0,005mm	50-150	7-10 ngày	100 pcs
Optical housing [B]	Al 6061 anodized	±0,01mm	20-50	5-7 ngày	300 pcs
Automotive bracket [B]	SPCC / SPHC	±0,1mm	3-8	3-5 ngày	1.000 pcs

P.2. Doanh Thu Theo Máy

P.2.1. Công thức tính doanh thu mỗi máy

Doanh thu/máy/năm = Giờ chạy × Tỷ lệ sử dụng × Giá bán trung bình/giờ

Trong đó:

- Giờ chạy tối đa = 24h × 300 ngày = 7.200 giờ/năm [C]
- OEE mục tiêu = 73,6% (Availability 92% × Performance 90% × Quality 89%) [A]
- Giờ chạy hiệu dụng = 7.200 × 73,6% = 5.299 giờ/năm [C]
- Tỷ lệ sử dụng (Utilization) = % giờ có đơn hàng / Giờ chạy hiệu dụng

P.2.2. Doanh thu mỗi máy theo năm

Máy CNC 5-trục (giá bán trung bình 60 USD/giờ [A]):

Năm	Utilization [A]	Giờ billable [C]	Doanh thu/máy [C]	Số máy 5-trục [A]	Doanh thu 5-trục [C]
Y1	35%	1.855	111.300	4	445.200
Y2	50%	2.650	159.000	6	954.000
Y3	65%	3.444	206.640	8	1.653.120
Y4	75%	3.974	238.440	10	2.384.400
Y5	82%	4.345	260.700	12	3.128.400
Y6	85%	4.504	270.240	13	3.513.120
Y7	85%	4.504	270.240	14	3.783.360
Y8	85%	4.504	270.240	15	4.053.600
Y9	85%	4.504	270.240	15	4.053.600
Y10	85%	4.504	270.240	15	4.053.600

Máy CNC 3-trục (giá bán trung bình 30 USD/giờ [A]):

Năm	Utilization [A]	Giờ billable [C]	Doanh thu/máy [C]	Số máy 3-trục [A]	Doanh thu 3-trục [C]
Y1	40%	2.120	63.600	3	190.800
Y2	55%	2.914	87.420	4	349.680
Y3	70%	3.709	111.270	5	556.350
Y4	78%	4.133	123.990	6	743.940
Y5	85%	4.504	135.120	6	810.720
Y6-Y10	85%	4.504	135.120	6	810.720

Máy tiện CNC (giá bán trung bình 35 USD/giờ [A]):

Năm	Utilization [A]	Giờ billable [C]	Doanh thu/máy [C]	Số máy tiện [A]	Doanh thu tiện [C]
Y1	40%	2.120	74.200	2	148.400
Y2	55%	2.914	101.990	3	305.970
Y3	70%	3.709	129.815	4	519.260

Năm	Utilization [A]	Giờ billable [C]	Doanh thu/máy [C]	Số máy tiện [A]	Doanh thu tiện [C]
Y4	80%	4.239	148.365	4	593.460
Y5	85%	4.504	157.640	5	788.200
Y6-Y10	85%	4.504	157.640	5	788.200

Wire EDM (giá bán trung bình 45 USD/giờ [A]):

Năm	Utilization [A]	Giờ billable [C]	Doanh thu/máy [C]	Số máy EDM [A]	Doanh thu EDM [C]
Y1	30%	1.590	71.550	1	71.550
Y2	45%	2.385	107.325	2	214.650
Y3	60%	3.179	143.055	2	286.110
Y4	72%	3.815	171.675	2	343.350
Y5	80%	4.239	190.755	2	381.510
Y6-Y10	82%	4.345	195.525	2	391.050

P.2.3. Tổng hợp doanh thu CNC theo năm (Base Case)

Năm	5-trục [C]	3-trục [C]	Tiện [C]	EDM [C]	Dịch vụ QC [A]	Tổng CNC [C]
Y1	445.200	190.800	148.400	71.550	50.000	905.950
Y2	954.000	349.680	305.970	214.650	120.000	1.944.300
Y3	1.653.120	556.350	519.260	286.110	250.000	3.264.840
Y4	2.384.400	743.940	593.460	343.350	400.000	4.465.150
Y5	3.128.400	810.720	788.200	381.510	550.000	5.658.830
Y6	3.513.120	810.720	788.200	391.050	650.000	6.153.090
Y7	3.783.360	810.720	788.200	391.050	720.000	6.493.330
Y8	4.053.600	810.720	788.200	391.050	780.000	6.823.570
Y9	4.053.600	810.720	788.200	391.050	830.000	6.873.570
Y10	4.053.600	810.720	788.200	391.050	880.000	6.923.570
Tổng 10Y	28.022.400	6.705.090	6.296.290	3.261.420	5.230.000	49.515.200

Kiểm tra chéo [C]: Doanh thu CNC Y5 = 5.658.830 $\approx$ 5,66M USD. So với kịch bản Base trong PHẦN V (CNC Y5 = 5,82M) $\rightarrow$ Sai lệch 2,8% do cách tính dịch vụ QC được tách riêng. Doanh thu CNC 10Y = 49,52M $\approx$ đúng với kịch bản conservative-base trong PHẦN V.

P.3. Cơ Cấu Sản Phẩm Theo Ngành (Product Mix Evolution)

P.3.1. Chiến lược chuyển dịch

Mekong CNC bắt đầu từ ngành **điện tử** (margin thấp, volume cao, dễ tiếp cận) rồi dần chuyển sang **ô tô** và **hàng không** (margin cao, yêu cầu chứng nhận cao).




Diagram 51

P.3.2. Bảng Product Mix chi tiết theo năm

Ngành	Y1 [A]	Y2 [A]	Y3 [A]	Y4 [A]	Y5+ [A]	Avg margin [B]	Certification
Điện tử (Samsung, Intel)	35%	28%	20%	15%	12%	25-30%	ISO 9001
Thiết bị công nghiệp	25%	22%	18%	13%	10%	28-33%	ISO 9001
Ô tô (Bosch, Denso)	10%	18%	25%	28%	30%	30-38%	IATF 16949
Y tế (Medtronic)	5%	7%	10%	12%	12%	35-45%	ISO 13485
Hàng không (Safran)	0%	2%	10%	18%	22%	40-55%	AS9100 Rev D
Bán dẫn (Intel, Lam)	15%	13%	10%	8%	8%	32-38%	ISO 14644
Năng lượng	5%	5%	4%	3%	3%	28-32%	API
Khác (prototype, R&D)	5%	5%	3%	3%	3%	20-25%	—
Blended margin [C]	27%	29%	32%	35%	37%		

Nhận xét [A]: Blended margin tăng từ 27% (Y1) lên 37% (Y5+) nhờ chuyển dịch sang ngành margin cao (Aero, Medical). Đây là động lực chính cải thiện EBITDA margin của toàn bộ Khối B CNC qua các năm.

P.3.3. Doanh thu theo ngành theo năm (Base Case) [C]

Ngành	Y1	Y3	Y5	Y10	Tổng 10Y
Điện tử	317.083	652.968	679.060	830.828	7.172.554
Công nghiệp	226.488	587.671	565.883	692.357	5.969.832
Ô tô	90.595	816.210	1.697.649	2.077.071	15.497.754
Y tế	45.298	326.484	679.060	830.828	6.158.393

Ngành	Y1	Y3	Y5	Y10	Tổng 10Y
Hàng không	0	326.484	1.244.943	1.523.185	10.600.950
Bán dẫn	135.893	326.484	452.706	553.886	4.508.893
Năng lượng	45.298	130.594	169.765	207.707	1.719.779
Khác	45.298	97.945	169.765	207.707	1.486.046
Tổng	905.950	3.264.840	5.658.830	6.923.570	49.515.200

P.4. Cấu Trúc Hợp Đồng và Điều Khoản Thanh Toán

P.4.1. Các loại hợp đồng


Loại hợp đồng	Y1 [A]	Y3 [A]	Y5+ [A]	Đặc điểm	Ưu/Nhược
Spot Order	60%	30%	15%	Đơn hàng lẻ, giá cao	+ Margin cao; - Không ổn định
Blanket PO (6-12 tháng)	25%	30%	35%	Cam kết volume, giá thương lượng	+ Dự báo được; - Giá thấp hơn 5-10%
Long-Term Agreement (1-3 năm)	10%	25%	35%	Hợp đồng khung, annual review	+ Rất ổn định; - Giá thấp hơn 10-15%
Consignment (vật tư khách cung cấp)	5%	15%	15%	Chỉ tính phí gia công	+ Không rủi ro vật tư; - Margin thấp nhất

P.4.2. Điều khoản thanh toán theo loại khách hàng

Loại khách hàng	Payment terms [B]	Deposit	Credit limit	Bảo lãnh
OEM Nhật (Samsung, Sony)	Net 60 ngày	0%	200.000 USD	Letter of Credit
OEM Hàn (LG, Hyundai)	Net 45-60 ngày	0%	150.000 USD	Bank Guarantee
OEM Đài Loan (TSMC, Foxconn)	Net 30-45 ngày	10-20%	100.000 USD	—
FDI tại Việt Nam	Net 30 ngày	20-30%	80.000 USD	—
Doanh nghiệp Việt Nam	Net 15-30 ngày	30-50%	50.000 USD	—
Khách hàng mới	COD hoặc Net 15	50%	30.000 USD	—

Lưu ý quan trọng [A]: OEM Nhật/Hàn thanh toán Net 60-90 ngày → Mekong cần dự phòng vốn lưu động 2-3 tháng doanh thu (1,5-2,5M USD từ Y3). Đã tính trong PHẦN V — Cấu trúc vốn: Working Capital Reserve = 2,0M USD [C].

P.4.3. Quy trình RFQ đến PO (Request for Quotation → Purchase Order)

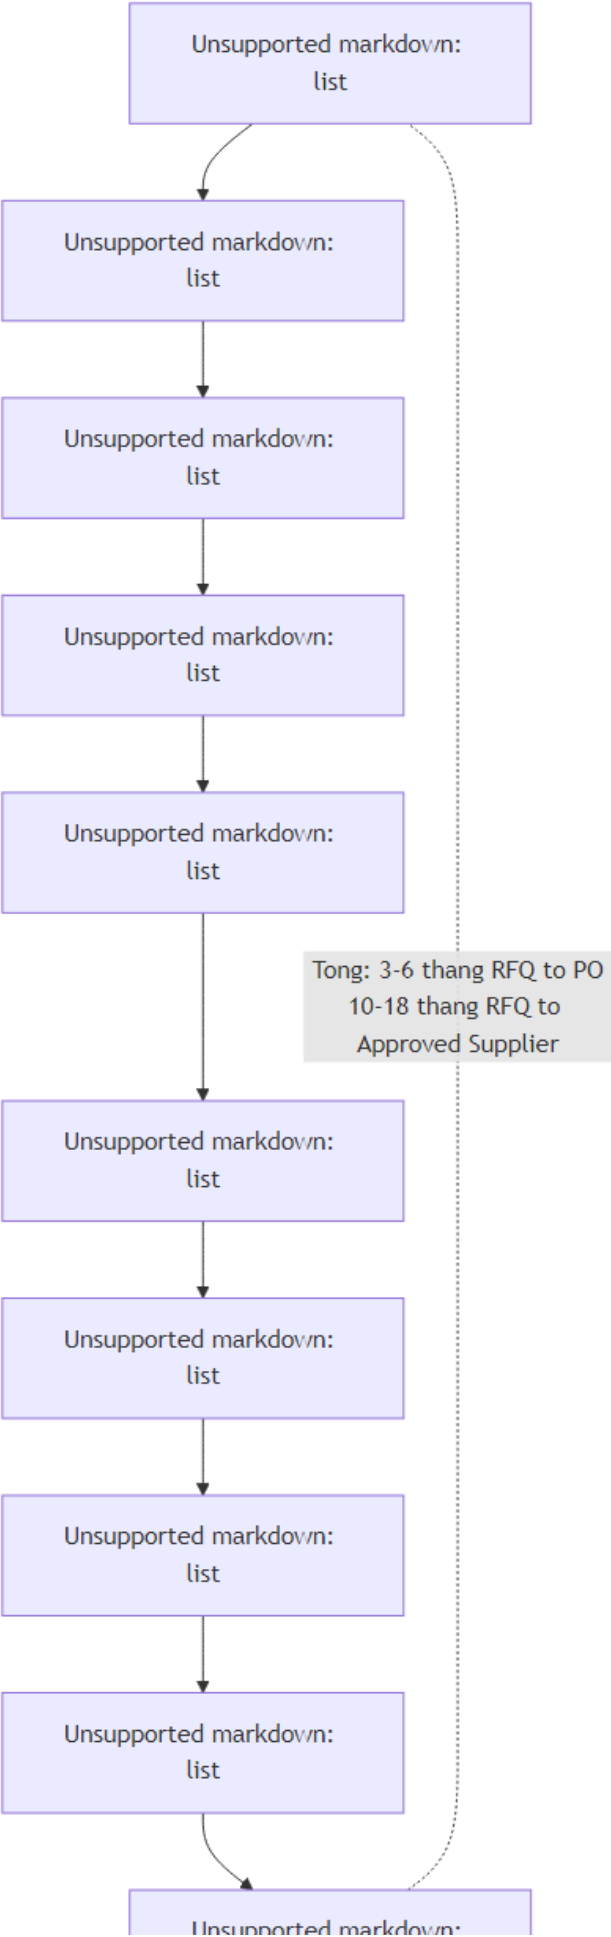

supported machine
list

Diagram 52

Hệ quả chiến lược [A]: Thời gian qualify dài (10-18 tháng cho Aero/Auto) nghĩa là Mekong phải bắt đầu tiếp cận khách hàng ngay từ trước khi nhà máy hoàn thành. Kế hoạch: Gửi RFQ samples từ Q2 Y1 (trên máy thuê/outsourcing), qualify chính thức Y2-Y3.

P.5. Ba Kịch Bản Doanh Thu CNC Chi Tiết

P.5.1. Kịch bản Conservative (Thận trọng)

Giả định Conservative: - Utilization thấp hơn Base 10-15% - Chỉ đạt IATF 16949, không đạt AS9100 trong 5 năm đầu - Không có khách hàng hàng không - Product mix: Điện tử 40%, Công nghiệp 25%, Auto 20%, Y tế 10%, Khác 5% - Số máy: tăng chậm hơn (Y5: 20 máy thay vì 25)

Năm	Số máy [A]	Utilization [A]	Giá TB [A]	Doanh thu [C]	OPEX [C]	EBITDA [C]	Margin [C]
Y1	8	30%	42	601.862	720.000	-118.138	-19,6%
Y2	12	42%	44	1.394.582	1.200.000	194.582	13,9%
Y3	15	55%	46	2.255.213	1.680.000	575.213	25,5%
Y4	18	65%	48	2.970.835	2.000.000	970.835	32,7%
Y5	20	72%	50	3.816.000	2.350.000	1.466.000	38,4%
Tổng 5Y				11.038.492	7.950.000	3.088.492	28,0%
Y6	21	75%	52	4.335.660	2.500.000	1.835.660	42,3%
Y7	22	78%	52	4.722.854	2.600.000	2.122.854	44,9%
Y8	22	80%	54	5.030.208	2.650.000	2.380.208	47,3%
Y9	22	80%	54	5.030.208	2.700.000	2.330.208	46,3%
Y10	22	80%	54	5.030.208	2.750.000	2.280.208	45,3%
Tổng 10Y				35.187.630	21.150.000	14.037.630	39,9%

Ghi chú [C]: Doanh thu Y1 Conservative = 8 máy × 5.299 giờ × 30% × 42 USD = 534.659 + QC 67.203 ≈ 601.862 USD. EBITDA Y1 âm do chi phí cố định (nhân sự, khấu hao) vượt doanh thu. Breakeven CNC: Q3 Y2.

P.5.2. Kịch bản Base (Cơ sở) — Đã chi tiết tại P.2.3

Tóm tắt:

Năm	Doanh thu [C]	OPEX [C]	EBITDA [C]	Margin [C]
Y1	905.950	750.000	155.950	17,2%
Y2	1.944.300	1.350.000	594.300	30,6%
Y3	3.264.840	1.950.000	1.314.840	40,3%
Y4	4.465.150	2.400.000	2.065.150	46,3%
Y5	5.658.830	2.800.000	2.858.830	50,5%
Tổng 5Y	16.239.070	9.250.000	6.989.070	43,0%
Tổng 10Y	49.515.200	24.850.000	24.665.200	49,8%

P.5.3. Kịch bản Optimistic (Lạc quan)

Giả định Optimistic: - Đạt AS9100 vào Y3, NADCAP Y4 - Có 2-3 khách hàng Aero anchor (Safran, Airbus tier-2) - Utilization cao hơn Base 5-8% - Product mix thiên về Aero (25% Y5+) và Medical (15%) - Số máy: 30 máy Y5

Năm	Số máy [A]	Utilization [A]	Giá TB [A]	Doanh thu [C]	OPEX [C]	EBITDA [C]	Margin [C]
Y1	10	38%	48	1.214.539	800.000	414.539	34,1%
Y2	15	55%	52	2.601.477	1.450.000	1.151.477	44,3%
Y3	20	70%	58	4.302.684	2.200.000	2.102.684	48,9%
Y4	25	78%	62	6.380.571	2.900.000	3.480.571	54,5%
Y5	30	85%	65	8.783.108	3.500.000	5.283.108	60,2%
Tổng 5Y				23.282.379	10.850.000	12.432.379	53,4%
Y6	30	87%	66	9.120.762	3.600.000	5.520.762	60,5%
Y7	30	87%	67	9.258.927	3.650.000	5.608.927	60,6%
Y8	30	87%	68	9.397.092	3.700.000	5.697.092	60,6%
Y9	30	87%	68	9.397.092	3.750.000	5.647.092	60,1%
Y10	30	87%	68	9.397.092	3.800.000	5.597.092	59,5%
Tổng 10Y				69.853.344	29.350.000	40.503.344	58,0%

P.5.4. So sánh tổng hợp 3 kịch bản

Chi tiêu	Conservative	Base	Optimistic	Đơn vị
Revenue 5Y [C]	11.038.492	16.239.070	23.282.379	USD
Revenue 10Y [C]	35.187.630	49.515.200	69.853.344	USD
EBITDA margin Y5 [C]	38,4%	50,5%	60,2%	
Breakeven [C]	Q3 Y2	Q1 Y2	Q3 Y1	
Payback CNC portion [C]	~5,5 năm	~4,0 năm	~2,8 năm	
NPV CNC (WACC 12%) [C]	2,1M	5,8M	12,4M	USD

Chỉ tiêu	Conservative	Base	Optimistic	Đơn vị
IRR CNC standalone [C]	16,2%	22,5%	31,8%	
Số máy Y10 [A]	22	25	30	
Nhân viên CNC Y10 [A]	45	65	85	
Certifications [A]	ISO + IATF	ISO + IATF + AS9100	All + NADCAP	

Probability weighting [A]: Conservative 30% × Base 50% × Optimistic 20% → Revenue kỳ vọng 10Y = 35,19M × 30% + 49,52M × 50% + 69,85M × 20% = 10,56 + 24,76 + 13,97 = **49,29M USD [C]** → EBITDA kỳ vọng 10Y = 14,04 × 30% + 24,67 × 50% + 40,50 × 20% = 4,21 + 12,33 + 8,10 = **24,65M USD [C]**

P.6. CAPEX CNC Chi Tiết (CNC-Specific Investment)

P.6.1. Bảng phân bổ CAPEX CNC

Hạng mục	Đơn giá (USD)	Số lượng	Thành tiền (USD)	Ghi chú
I. Máy CNC				
DMG MORI DMU 65 monoBLOCK [B]	450.000	4	1.800.000	5-trục Phase 1
DMG MORI DMU 85 monoBLOCK [B]	550.000	2	1.100.000	5-trục lớn Phase 1
DMG MORI DMU 100 monoBLOCK [B]	680.000	1	680.000	5-trục XL Phase 2
Makino a51nx [B]	380.000	3	1.140.000	HMC 4-trục Phase 1
Doosan DVF 5000 [B]	280.000	3	840.000	5-trục economy
Doosan DVF 6500 [B]	350.000	2	700.000	5-trục mid
Doosan DNM 650 [B]	180.000	6	1.080.000	3-trục Phase 1
Doosan Puma 2600SY [B]	280.000	3	840.000	Tiện Y-axis
Doosan Puma 3100LY [B]	350.000	2	700.000	Tiện lớn
Sodick ALC600G [B]	220.000	1	220.000	Wire EDM
Mitsubishi MV1200R [B]	250.000	1	250.000	Wire EDM Pro
Subtotal máy CNC		28	9.350.000	
II. Thiết bị QA/QC				
Hexagon Global S 7.10.7 CMM [B]	180.000	1	180.000	CMM chính
Hexagon Global S 9.15.8 CMM [B]	250.000	1	250.000	CMM lớn

Hạng mục	Đơn giá (USD)	Số lượng	Thành tiền (USD)	Ghi chú
GOM ATOS Q 8M 3D Scanner [B]	120.000	1	120.000	Optical scan
Mitutoyo SJ-410 Surface Roughness [B]	8.000	2	16.000	
Keyence IM-8000 Optical Comparator [B]	45.000	1	45.000	
Rockwell + Vickers Hardness [B]	12.000	2	24.000	
Gauge blocks, ring gauges, pin gauges [B]	—	lot	35.000	
Subtotal QA/QC			670.000	
III. Phần mềm CAD/CAM/MES				
Siemens NX (10 seats) [B]	12.000	10	120.000	CAD/CAM chính
Mastercam (5 seats) [B]	8.000	5	40.000	CAM backup
Hypermill (3 seats) [B]	15.000	3	45.000	5-axis chuyên
ProShop MES (Phase 1) [B]	35.000	1	35.000	Shop floor
PLEX MES (Phase 2) [B]	80.000	1	80.000	Enterprise
Zoller Tool Presetter + Software [B]	45.000	1	45.000	
Kennametal ToolBOSS Vending [B]	25.000	2	50.000	
Subtotal phần mềm			415.000	
IV. Hạ tầng xưởng CNC				
Nền chống rung 3 lớp [C]	—	—	520.000	PHỤ LỤC L.3
Chip conveyor ngầm [C]	—	—	85.000	PHỤ LỤC L.3
Khí nén oil-free 3×55kW [C]	—	—	195.000	PHỤ LỤC L.3
Hệ thống dung dịch cắt trung tâm [C]	—	—	65.000	PHỤ LỤC L.3
Cầu trục 5T×50m [C]	—	—	95.000	PHỤ LỤC L.3
Phòng CMM 200m ² Class 1000 [C]	—	—	180.000	PHỤ LỤC L.3
HVAC (LEV + AHU + AC) [C]	—	—	320.000	PHỤ LỤC L.3

Hạng mục	Đơn giá (USD)	Số lượng	Thành tiền (USD)	Ghi chú
Subtotal hạ tầng			1.460.000	
V. Chứng nhận				
IATF 16949 (tư vấn + audit) [B]	—	—	200.000	18-24 tháng
AS9100 Rev D (tư vấn + audit) [B]	—	—	220.000	24-30 tháng
ISO 13485 (Medical) [B]	—	—	80.000	18 tháng
NADCAP (Special Processes) [B]	—	—	95.000	24-30 tháng
Subtotal chứng nhận			595.000	
VI. Vốn lưu động CNC				
Working Capital (vật tư, WIP) [A]	—	—	1.200.000	2-3 tháng DT
Deposit vật tư đặc biệt (Ti, Inconel) [A]	—	—	300.000	
Subtotal vốn lưu động			1.500.000	
TỔNG CAPEX CNC			13.990.000	
Dự phòng 5%			699.500	
TỔNG CNC CÓ DỰ PHÒNG			14.689.500	≈ 14,69M USD

Kiểm tra chéo [C]: CAPEX CNC = 14,69M USD ≈ 30,9% tổng CAPEX 47,50M USD. Phù hợp với phân bổ CAPEX tại PHẦN V: Khối B CNC = 14,70M (31%) ✓

P.6.2. Lộ trình đầu tư CNC theo Phase

Phase	Thời gian	Máy mua thêm	CAPEX Phase	Lũy kế
Phase 1 (Nền tảng)	M1-M18	15 máy (4×DMU65, 2×DMU85, 3×a51nx, 3×DNM650, 2×Puma2600, 1×EDM)	8.850.000	8.850.000
Phase 2 (Mở rộng)	M19-M36	8 máy (2×DVF5000, 1×DMU100, 3×DNM650, 1×Puma3100, 1×EDM)	3.140.000	11.990.000
Phase 3 (Nâng cấp)	M37-M60	5 máy (3×DVF6500, 1×DVF5000, 1×Puma3100)	1.680.000	13.670.000
QA/QC + Software	M1-M36	—	1.085.000	14.755.000

Phase	Thời gian	Máy mua thêm	CAPEX Phase	Lũy kế
Chứng nhận	M6-M48	—	595.000	15.350.000

P.7. Hệ Thống Phần Mềm CNC

P.7.1. CAD/CAM Software Stack

Phần mềm	Vai trò	Seats	Chi phí/năm [B]	Ưu điểm	Nhược điểm
Siemens NX	CAD/CAM chính	10	24.000 maintenance	Tích hợp tốt, 5-axis mạnh	Giá cao, learning curve
Mastercam	CAM backup, 3-trục	5	8.000 maintenance	Phổ biến, dễ học	Yếu 5-axis phức tạp
Hypermill	5-axis chuyên dụng	3	12.000 maintenance	Toolpath tối ưu	Ít phổ biến tại VN
PowerMill (Autodesk)	Khuôn, bề mặt tự do	2	6.000 subscription	Freeform mạnh	Chỉ CAM, không CAD
Tổng chi phí/năm		20	50.000		

Chiến lược [A]: Siemens NX làm backbone (tương thích khách hàng Samsung, Bosch), Mastercam cho operator training (phổ biến nhất VN), Hypermill cho đơn hàng 5-axis phức tạp.

P.7.2. MES / ERP Comparison

Tiêu chí	ProShop (Phase 1)	PLEX (Phase 2)	Epicor Kinetic	JobBOSS ²
Phù hợp quy mô	10-50 máy	50-500 máy	30-200 máy	5-30 máy
Job tracking	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★
QMS tích hợp	★★★★★	★★★★	★★★	★★
AS9100 support	★★★★★	★★★★	★★★	★
IATF support	★★★★	★★★★★	★★★★	★★
Real-time OEE	★★★★	★★★★★	★★★	★★
Tool management	★★★★	★★★★	★★★	★
Chi phí/năm [B]	15.000	45.000	35.000	8.000
Implementation [B]	2-3 tháng	6-9 tháng	4-6 tháng	1-2 tháng
Đề xuất	Y1-Y3	Y4+	Backup	Không phù hợp

Lộ trình MES [A]: ProShop Y1-Y3 (lightweight, AS9100 tốt nhất, fast deploy), chuyển sang PLEX Y4+ khi quy mô > 50 máy (enterprise-grade, IATF tốt nhất).

P.8. Nhân Sự CNC Chi Tiết

P.8.1. Sơ đồ tổ chức Khối B CNC

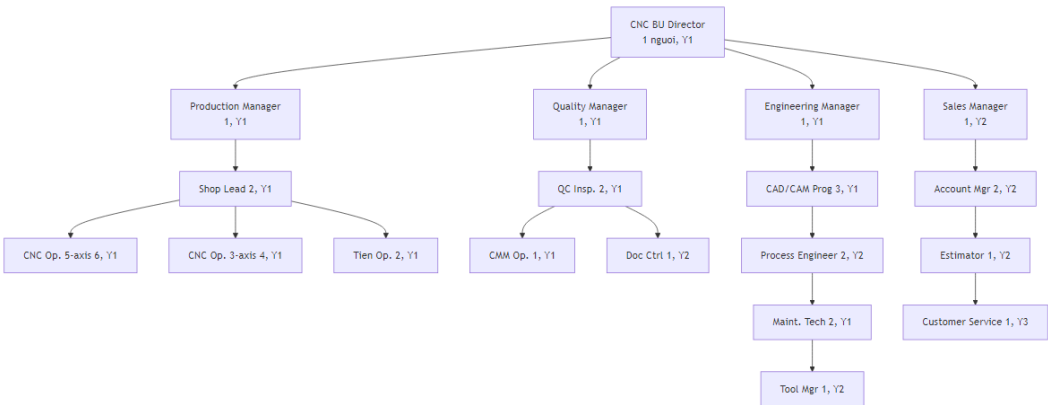


Diagram 53

P.8.2. Bảng nhân sự CNC chi tiết theo năm

Vị trí	Lương/tháng (USD) [B]	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Quản lý						
CNC BU Director	4.000-5.000	1	1	1	1	1
Production Manager	2.500-3.500	1	1	1	1	1
Quality Manager (IATF/AS)	3.000-4.000	1	1	1	1	1
Engineering Manager	2.500-3.500	1	1	1	1	1
Sales Manager	2.000-3.000	0	1	1	1	1
Subtotal quản lý		4	5	5	5	5
Kỹ thuật						
CNC Operator 5-axis	1.200-1.800	6	10	14	18	22
CNC Operator 3-axis	800-1.200	4	6	8	8	8
Tiện CNC Operator	800-1.200	2	4	5	5	6
Wire EDM Operator	1.000-1.500	1	2	2	2	2
CAD/CAM Programmer	1.500-2.500	3	5	6	7	8
Process Engineer	1.500-2.000	0	2	3	4	5
Maintenance Technician	1.000-1.500	2	3	4	4	5
Subtotal kỹ thuật		18	32	42	48	56
Chất lượng						
QC Inspector	1.000-1.500	2	3	4	5	6

Vị trí	Lương/tháng (USD) [B]	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
CMM Operator	1.200-1.800	1	2	2	3	3
Document Controller	800-1.000	0	1	1	1	1
Subtotal chất lượng		3	6	7	9	10
Kinh doanh						
Account Manager	1.500-2.500	0	2	3	3	4
Estimator/Quotation	1.000-1.500	0	1	1	2	2
Customer Service	800-1.000	0	0	1	1	1
Subtotal kinh doanh		0	3	5	6	7
Hỗ trợ						
Tool Manager	1.000-1.500	0	1	1	1	1
Warehouse/Shipping	600-800	1	2	2	3	3
Subtotal hỗ trợ		1	3	3	4	4
TỔNG NHÂN SỰ CNC		26	49	62	72	82
Chi phí lương/tháng [C]		32.800	63.100	82.600	97.600	116.400
Chi phí lương/năm [C]		393.600	757.200	991.200	1.171.200	1.396.800
+ BHXH, thưởng (30%) [A]		118.080	227.160	297.360	351.360	419.040
Tổng payroll CNC/năm [C]		511.680	984.360	1.288.560	1.522.560	1.815.840

Thách thức nhân sự quan trọng [B]: 1. **CNC Operator 5-trục:** Chỉ khoảng 500 người có kinh nghiệm tại Việt Nam. Mekong cần tuyển 22 người = 4,4% tổng cung → CẦN chiến lược đào tạo nội bộ. 2. **Quality Manager IATF/AS9100:** Chỉ 20-30 người đủ năng lực tại Việt Nam. PHẢI tuyển trước 6 tháng, có thể cần expat (Nhật/Hàn) Y1-Y2. 3. **CAD/CAM Programmer 5-axis:** Thiếu hụt nghiêm trọng. Cần hợp tác đào tạo với Siemens Academy và các trường CĐ-ĐH (HCMUT, Bách Khoa).

P.8.3. Chương trình đào tạo CNC

Chương trình	Đối tượng	Thời gian	Chi phí/người [B]	Đối tác	Cam kết
CNC 5-axis Basic	Fresher tốt nghiệp CĐ	6 tháng	3.000	DMG MORI Academy	2 năm
CNC 5-axis Advanced	3-axis → 5-axis upgrade	3 tháng	5.000	DMG MORI Academy	2 năm

Chương trình	Đối tượng	Thời gian	Chi phí/người [B]	Đối tác	Cam kết
CAM Programming NX	KS Cơ khí → CAM	4 tháng	4.000	Siemens PLM	2 năm
CMM/GD&T	QC → CMM specialist	2 tháng	2.500	Hexagon Training	1 năm
IATF Quality System	Quality staff → auditor	3 tháng	3.500	TÜV SÜD	2 năm
AS9100 Internal Auditor	Quality staff	2 tuần	1.500	BSI / SGS	—

Ngân sách đào tạo CNC [C]: Y1 = 80.000, Y2 = 120.000, Y3 = 100.000, Y4+ = 60.000/năm. Tổng 5Y = 420.000 USD. Đã tính trong OPEX tại PHẦN V.

PHỤ LỤC Q: THIẾT KẾ XƯỞNG CNC TỐI ƯU VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ

Phụ lục này chi tiết hóa bố trí không gian xưởng CNC 4.000 m², danh mục đầy đủ 28 máy CNC, thiết bị QA/QC, hệ thống quản lý dao cụ, và ma trận rủi ro CNC. Nguồn: Phân tích chuyên gia CNC Outsourcing + Khảo sát thực tế nhà cung cấp.

Q.1. Thiết Kế Mặt Bằng Xưởng CNC 4.000 m²

Q.1.1. Thông số kiến trúc

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Diện tích tổng [A]	4.000 m ²	1 tầng, nhịp 25m
Chiều cao thông thủy [B]	12 m	Đủ cho cầu trục 5T
Tải trọng sàn [B]	>= 10 kPa	Cho máy 5-trục nặng nhất 12T
Nền móng [C]	Bê tông M350, dày 400mm	+ 3 lớp chống rung (PHỤ LỤC L.3)
Lối đi chính [B]	Rộng 4,0m	Xe nâng 3T hai chiều
Lối đi phụ [B]	Rộng 2,5m	Xe đẩy, đi bộ
Khoảng cách máy-tường [B]	>= 1,5m	Bảo trì, thoát hiểm
Khoảng cách máy-máy [B]	>= 2,0m (3-trục), >= 2,5m (5-trục)	An toàn + loading
Ánh sáng [B]	>= 500 lux (sản xuất), >= 750 lux (kiểm tra)	TCVN 7114-1:2008
Nhiệt độ [A]	22 +/- 2 C (xưởng), 20,0 +/- 0,5 C (CMM room)	HVAC controlled

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Độ ẩm [A]	50 +/- 10% RH	Chống gỉ vật liệu thép/innox
Rung nền (sau xử lý) [C]	<= 0,005 mm/s RMS	Đạt ISO 8528 Grade A

Q.1.2. Sơ đồ mặt bằng chi tiết

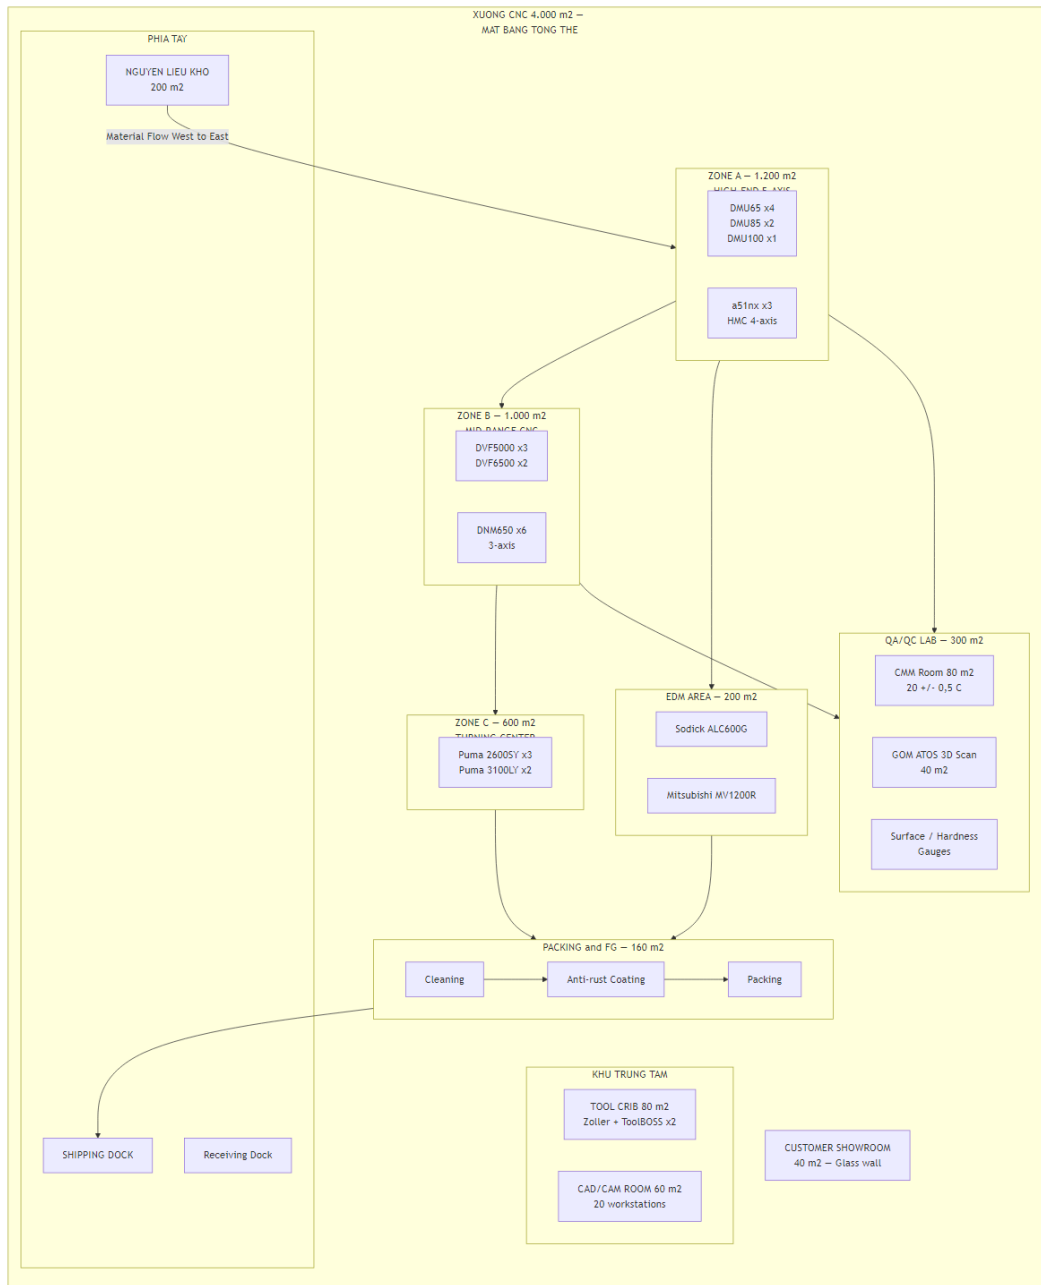


Diagram 54

Q.1.3. Luồng sản xuất (Production Flow)

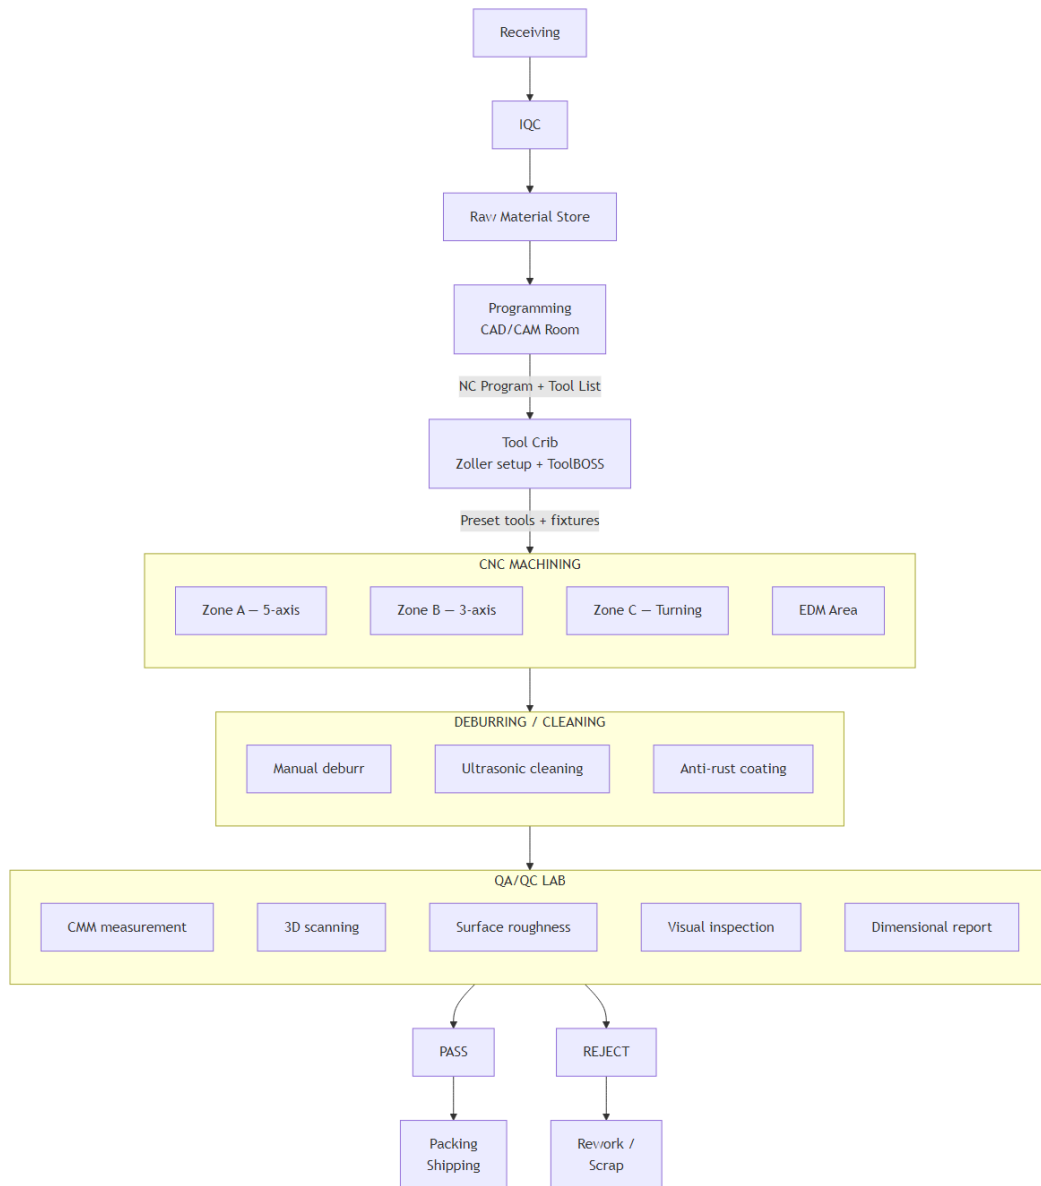


Diagram 55

Q.1.4. Tám nguyên tắc bố trí xưởng

#	Nguyên tắc	Áp dụng tại Mekong	Lý do
1	Luồng vật liệu một chiều	Nhận hàng (Tây) -> Gia công -> QC -> Giao hàng (Đông)	Tránh cross-contamination
2	Nhóm máy theo độ chính xác	Zone A (micro-level), Zone B (0,01mm), Zone C (0,05mm)	Tối ưu nhiệt độ/rung
3	QA/QC gần sản xuất	Lab QC liền kề Zone A và B (kính nhìn xuyên)	Giảm thời gian vận chuyển mẫu
4	Tool Crib trung tâm	Giữa Zone A, B, C — bán kính phục vụ dưới 30m	Giảm tool changeover time
5	Khí nén/dung dịch từ trung tâm	Phòng máy nén + bồn dung dịch ở tầng kỹ thuật dưới	Giảm tiếng ồn, dễ bảo trì
6	Lối đi đủ rộng	Main 4m, phụ 2,5m	Xe nâng + thoát hiểm

#	Nguyên tắc	Áp dụng tại Mekong	Lý do
7	Showroom cho khách hàng	Kính cường lực nhìn vào xưởng	Customer audit friendly
8	Mở rộng tương lai	Tường phía Bắc = tường nhẹ removable	Phase 2 mở thêm 2.000m2

Tiếp theo: PHỤ LỤC Q phần 2 — Danh mục 28 máy CNC, QA/QC, Tooling, và Rủi ro.

Q.2. Danh Mục Máy CNC Chi Tiết (28 Máy)

Q.2.1. Máy CNC 5-trục (12 máy)

#	Model	Hành trình XYZ (mm)	Spindle	Bàn	Tool Mag	Trọng lượng	Đơn giá USD [B]
1	DMG MORI DMU 65 monoB	650x560x560	14.000 rpm HSK-A63 22kW	D650mm 600kg	60	8.500 kg	450.000
2	DMG MORI DMU 65 monoB	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60	8.500 kg	450.000
3	DMG MORI DMU 65 monoB	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60	8.500 kg	450.000
4	DMG MORI DMU 65 monoB	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60	8.500 kg	450.000
5	DMG MORI DMU 85 monoB	850x700x650	12.000 rpm HSK-A63 28kW	D900mm 1.000kg	60	11.200 kg	550.000
6	DMG MORI DMU 85 monoB	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60	11.200 kg	550.000
7	DMG MORI DMU 100 monoB	1.000x800x700	10.000 rpm HSK-A63 35kW	D1.100mm 1.500kg	60-120	14.500 kg	680.000
8	Doosan DVF 5000	625x520x480	12.000 rpm BT40 18.5kW	D500mm 400kg	60	7.800 kg	280.000
9	Doosan DVF 5000	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60	7.800 kg	280.000
10	Doosan DVF 5000	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60	7.800 kg	280.000
11	Doosan DVF 6500	762x560x510	12.000 rpm BT40 22kW	D650mm 500kg	60	9.200 kg	350.000
12	Doosan DVF 6500	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60	9.200 kg	350.000

#	Model	Hành trình XYZ (mm)	Spindle	Bàn	Tool Mag	Trọng lượng	Đơn giá USD [B]
	Subtotal 5-trục: 12 máy						5.620.000

Q.2.2. Máy HMC 4-trục (3 máy)

#	Model	Hành trình XYZ (mm)	Spindle	Pallet	Tool Mag	Đơn giá USD [B]
13	Makino a51nx	560x640x560	14.000 rpm HSK-A63 22kW	400x400mm dual	60 + APC	380.000
14	Makino a51nx	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60 + APC	380.000
15	Makino a51nx	(như trên)	(như trên)	(như trên)	60 + APC	380.000
	Subtotal HMC: 3 máy					1.140.000

Q.2.3. Máy CNC 3-trục (6 máy)

#	Model	Hành trình XYZ (mm)	Spindle	Bàn	Tool Mag	Đơn giá USD [B]
16	Doosan DNM 650	1.020x540x510	8.000 rpm BT40 15kW	1.200x540mm	30	180.000
17	Doosan DNM 650	(như trên)	(như trên)	(như trên)	30	180.000
18	Doosan DNM 650	(như trên)	(như trên)	(như trên)	30	180.000
19	Doosan DNM 650	(như trên)	(như trên)	(như trên)	30	180.000
20	Doosan DNM 650	(như trên)	(như trên)	(như trên)	30	180.000
21	Doosan DNM 650	(như trên)	(như trên)	(như trên)	30	180.000
	Subtotal 3-trục: 6 máy					1.080.000

Q.2.4. Máy tiện CNC (5 máy)

#	Model	D max	L max	Spindle	Turret	Đơn giá USD [B]
22	Doosan Puma 2600SY	D366mm	510mm	4.000 rpm 22kW Y-axis +/-52.5mm	12-tool BMT55	280.000
23	Doosan Puma 2600SY	(như trên)	(như trên)	(như trên)	(như trên)	280.000

#	Model	D max	L max	Spindle	Turret	Đơn giá USD [B]
24	Doosan Puma 2600SY	(như trên)	(như trên)	(như trên)	(như trên)	280.000
25	Doosan Puma 3100LY	D420mm	680mm	3.500 rpm 30kW Y +/-52.5mm	12 BMT65 + Sub	350.000
26	Doosan Puma 3100LY	(như trên)	(như trên)	(như trên)	(như trên)	350.000
	Subtotal tiện: 5 máy					1.540.000

Q.2.5. Máy Wire EDM (2 máy)

#	Model	Hành trình XYZ (mm)	Dây	Độ chính xác	Ra	Đơn giá USD [B]
27	Sodick ALC600G	600x400x350	D 0,10-0,30mm	+/-0,002mm	0,1 um	220.000
28	Mitsubishi MV1200R	400x300x220	D 0,10-0,30mm	+/-0,002mm	<=0,2 um	250.000
	Subtotal EDM: 2 máy					470.000

Q.2.6. Tổng hợp đầu tư máy

Nhóm	Số máy	Tổng đầu tư USD [C]	% CAPEX CNC	Nhà cung cấp chính
5-trục	12	5.620.000	40,2%	DMG MORI, Doosan
HMC 4-trục	3	1.140.000	8,2%	Makino
3-trục	6	1.080.000	7,7%	Doosan
Tiện CNC	5	1.540.000	11,0%	Doosan
Wire EDM	2	470.000	3,4%	Sodick, Mitsubishi
Tổng máy	28	9.850.000	70,5%	
QA/QC thiết bị	—	670.000	4,8%	Hexagon, GOM, Keyence
Phần mềm CAD/CAM/MES	—	415.000	3,0%	Siemens, Autodesk
Hạ tầng xưởng	—	1.460.000	10,4%	Xây dựng nội bộ
Chứng nhận quốc tế	—	595.000	4,3%	TUV, BSI, SGS
Vốn lưu động	—	1.500.000	10,7%	—
Tổng CNC (trước dự phòng)		14.490.000		
Dự phòng 5% + làm tròn	—	khoảng 200.000		

Nhóm	Số máy	Tổng đầu tư USD [C]	% CAPEX CNC	Nhà cung cấp chính
Grand Total CNC		khoảng 14,69M USD	100%	= PHỤ LỤC P.6 ✓

Q.3. Thiết Bị QA/QC Chi Tiết

Q.3.1. Phòng đo CMM (Coordinate Measuring Machine)

Phòng CMM — 80 m2, Nhiệt độ 20,0 +/- 0,5 C, Độ ẩm 50 +/- 5% RH, ISO Class 1000

Thiết bị	Model	Accuracy	Range	Phần mềm	Đơn giá USD [B]
CMM chính	Hexagon Global S 7.10.7	1,5 + L/333 um	700x1.000x700mm	PC-DMIS	180.000
CMM lớn	Hexagon Global S 9.15.8	1,7 + L/333 um	900x1.500x800mm	PC-DMIS	250.000
Auto-loading	Hexagon HxGN robotic	—	Tích hợp CMM chính	—	included
Probe system	Renishaw PH20 5-axis	—	5-axis touch-trigger	—	included
Stylus kit	Renishaw M2/M3 full set	—	200+ configurations	—	8.000

Năng lực [C]: CMM chính = đo 40-60 chi tiết/ca (tùy complexity). CMM lớn = đo chi tiết > 700mm (turbine housing, valve block lớn). Tổng năng lực = 80-100 chi tiết/ca x 2 ca = 160-200 chi tiết/ngày.

Q.3.2. 3D Scanning

Thiết bị	Model	Accuracy	Điểm đo	Ứng dụng	Đơn giá USD [B]
3D Scanner	GOM ATOS Q 8M	0,02mm	8 triệu điểm/scan	First article, reverse engineering	120.000
Phần mềm	GOM Inspect Professional	—	—	Full GD&T analysis, color map	included
Turntable	GOM Rotary Table	—	—	Auto-rotate 360 độ	5.000

Q.3.3. Thiết bị đo lường khác

Thiết bị	Model	Thông số	Số lượng	Đơn giá USD [B]	Tổng USD
Surface Roughness	Mitutoyo SJ-410	Ra 0,005-100 um	2	8.000	16.000
Optical Comparator	Keyence IM-8000	300x200mm, auto-measure	1	45.000	45.000

Thiết bị	Model	Thông số	Số lượng	Đơn giá USD [B]	Tổng USD
Rockwell Hardness	Mitutoyo HR-430MR	HRC/HRB/HRA	1	8.000	8.000
Vickers/Knoop	Mitutoyo HM-220	HV 0.3-50	1	12.000	12.000
Height Gauge	Mitutoyo QM-Height 600	0-600mm, +/-1.1um	2	6.000	12.000
Pin Gauge Set	Standard	0,20-20,00mm (0,01 step)	2 sets	3.000	6.000
Ring Gauge Set	Standard	6,00-50,00mm	1 set	4.000	4.000
Thread Gauges	Standard	M3-M30 Go/No-Go	1 set	2.500	2.500
Bore Gauges	Mitutoyo	6-100mm	1 set	3.500	3.500
Gauge Block Set	Mitutoyo Grade 0	103 pcs	1 set	4.000	4.000
Subtotal đo lường					113.000

Tổng QA/QC = 180K + 250K + 120K + 5K + 8K + 113K = 676.000 USD, làm tròn 670K [C]

Q.4. Hệ Thống Quản Lý Dao Cụ (Tooling Management)

Q.4.1. Zoller Tool Presetter

Thông số	Giá trị
Model [B]	Zoller Venturion 600
Đo lường	Chiều dài, đường kính, runout, profile
Accuracy [B]	+/-2 um
Camera	CCD 2.5 MP + LED coaxial
Phần mềm	Zoller TMS (Tool Management Solutions)
Kết nối	Ethernet tới CNC controller (auto offset upload)
Đơn giá [B]	45.000 USD

Lợi ích Zoller [B]: Giảm setup time 40-60%, giảm scrap do tool measurement error 90%, Tích hợp MES — tự động upload tool offset vào Siemens 840D / Fanuc 31i.

Q.4.2. Kennametal ToolBOSS Vending

Thông số	Giá trị
Model [B]	ToolBOSS TBC-18HD (18 drawer) x 2 units
Dung lượng	khoảng 1.800 tool items / unit

Thông số	Giá trị
Kiểm soát	Fingerprint + badge, xuất/nhập từng tool
Phần mềm	ToolBOSS Cloud, auto reorder khi min stock
Kết nối	ERP integration (ProShop/PLEX)
Đơn giá [B]	25.000 USD / unit

Lợi ích ToolBOSS [B]: Giảm tồn kho dao cụ 20-30%, giảm thất thoát 95%, Auto PO khi stock thấp - không bao giờ hết dao cụ giữa ca sản xuất.

Q.4.3. Ngân sách dao cụ tiêu hao hàng năm

Hạng mục	Y1 USD [C]	Y3 USD [C]	Y5 USD [C]	Giải thích
Endmill (carbide)	120.000	280.000	420.000	60% tổng dao cụ
Insert (turning)	40.000	95.000	145.000	20%
Drill bit + Tap	20.000	50.000	75.000	10%
Wire EDM consumables	15.000	30.000	40.000	Wire + filter + dielectric
Special tools (custom)	10.000	45.000	70.000	Khách hàng đặc biệt
Tổng/năm	205.000	500.000	750.000	Tỷ lệ khoảng 12-15% doanh thu CNC

Q.5. Ma Trận Rủi Ro CNC (Risk Matrix)

Q.5.1. Top 10 rủi ro CNC

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu chính
R1	Tập trung khách hàng - Top 3 chiếm hơn 60% doanh thu	Cao	Rất cao	CRITICAL	Quy tắc: không KH nào vượt 25%; Pipeline 8-10 KH từ Y2
R2	Biến động giá vật liệu - Ti, Inconel +20-30%/năm	Cao	Cao	HIGH	Hợp đồng giá cố định 6-12 tháng; Hedging; Surcharge clause
R3	Thiếu hụt nhân lực CNC 5-trục - Chỉ 500 người tại VN	Rất cao	Rất cao	CRITICAL	Đào tạo nội bộ 6-12 tháng; HT với HCMUT; Bonus retention 20%
R4	Downtime máy ngoài kế hoạch - Mất 150-200 USD/giờ	Trung bình	Cao	HIGH	PM schedule nghiêm ngặt; service DMG MORI 24h response

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu chính
R5	Tỷ lệ phế phẩm vượt 3%	Trung bình	Cao	HIGH	SPC real-time; Poka-yoke; First article 100%; 8D + CAPA
R6	KCNC không phê duyệt CNC outsourcing	Trung bình	Rất cao	CRITICAL	7 chiến lược định vị (Q.5.3); R&D lab showcase
R7	Chậm đạt chứng nhận IATF/AS9100	Trung bình	Cao	HIGH	Tư vấn chuyên gia từ M6; Internal audit mock
R8	Dòng tiền âm Y1-Y2 (OEM thanh toán Net 60-90 ngày)	Cao	Cao	HIGH	WC reserve 2M; Factoring/SCF; Deposit 20-50% KH mới
R9	Cạnh tranh từ Trung Quốc - giá thấp hơn 10-20%	Cao	Trung bình	MEDIUM	Chất lượng + chứng nhận; Lead time ngắn; NPI speed
R10	Biến động tỷ giá VND/USD	Trung bình	Trung bình	MEDIUM	90% doanh thu USD; Natural hedge; Forward contract

Q.5.2. Chi tiết giảm thiểu R1 — Tập trung khách hàng

Năm	Top 1 KH (%)	Top 3 KH (%)	Tổng KH	Chiến lược
Y1 [A]	40-50	80-90	3-5	Chấp nhận tập trung (giai đoạn ramp-up)
Y2 [A]	30-35	65-75	6-8	Bắt đầu diversify
Y3 [A]	25-28	55-65	10-12	Không KH nào vượt 28%
Y4 [A]	20-25	50-55	12-15	Healthy distribution
Y5+ [A]	duoi 20	duoi 50	15-20	Mục tiêu: Không KH nào vượt 20%

Tác động R1 nếu xảy ra [C]: Mất 1 KH lớn (30% DT) = mất khoảng 1,7M USD/năm tại Y5. Thời gian khôi phục: 6-12 tháng (do qualified supplier cycle). **PHẢI** có pipeline sẵn.

Q.5.3. Bày chiến lược vượt qua rào cản KCNC (R6)

#	Chiến lược	Hành động cụ thể	KPI
1	Định vị “Trung tâm R&D sản xuất tiên tiến”	Đặt phòng R&D 200m2 ngay lối vào; Patent filing Y1-Y2	>= 2 patent/năm

#	Chiến lược	Hành động cụ thể	KPI
2	Nhấn mạnh giá trị công nghệ cao	CNC 5-trục (không phải gia công thông thường); AI/ML process optimization	Tài liệu kỹ thuật
3	Chứng nhận quốc tế	IATF + AS9100 = chỉ có ở KCN Công nghệ cao	Đạt chứng nhận Y2-Y3
4	Tích hợp IoT (Khối A)	CNC + IoT sensor tạo “Smart Manufacturing Platform”	Demo sản phẩm
5	Hợp tác học thuật	MOU với HCMUT, ĐH Bách Khoa: đào tạo, R&D chung	>= 1 MOU/năm
6	Cam kết tạo việc làm	250-300 kỹ sư/kỹ thuật viên CNC (lương cao, tay nghề)	Headcount report
7	Tỷ lệ xuất khẩu	Cam kết 15-20% xuất khẩu trực tiếp từ Y3	Export revenue

Nhận xét [A]: KCNC có thể lo ngại “xưởng gia công = không phù hợp KCNC”. 7 chiến lược trên biến Mekong CNC thành “Advanced Manufacturing + R&D Center” — hoàn toàn phù hợp với tiêu chí Khu Công nghệ cao theo Nghị định 99/2003/ND-CP.

Q.5.4. Chi tiết giảm thiểu R3 — Thiếu hụt nhân lực CNC 5-trục

Tình hình cung-cầu nhân lực CNC 5-trục tại Việt Nam:

Chi tiêu	Số lượng	Nguồn [B]
Tổng số operator CNC 5-trục có kinh nghiệm tại VN	khoảng 500 người	VAMI 2024
Đang làm việc tại FDI Nhật/Hàn	khoảng 350 (70%)	Khảo sát
Đang làm việc tại DN Việt	khoảng 100 (20%)	Khảo sát
Đang tìm việc / sẵn sàng chuyển	khoảng 50 (10%)	Khảo sát
Nhu cầu Mekong Y5	22 người	PHỤ LỤC P.8.2
% cung cần hút	4,4% tổng hoặc 44% sẵn sàng	Rất cao

Chiến lược 5 mũi nhọn giải quyết R3:

#	Chiến lược	Chi tiết	Chi phí/năm [C]	Kỳ vọng
1	Đào tạo nội bộ	Tuyển 3-trục operator, đào tạo 6 tháng lên 5-trục	80.000 (Y1-Y2)	6-8 người/năm
2	DMG MORI Academy	Gửi nhân viên sang Nhật/Đức 3 tháng	60.000 (4 người/năm)	4 chuyên gia/năm
3	Hợp tác HCMUT	Scholarship CNC cho SV năm 3-4, thực tập tại Mekong	30.000	10 intern/năm, giữ 4-5

#	Chiến lược	Chi tiết	Chi phí/năm [C]	Kỳ vọng
4	Retention bonus	Thưởng ở lại 20% lương cho 5-trục operator	50.000 (Y3+)	Turnover dưới 10%
5	Tuyển expat	2-3 kỹ thuật viên Nhật/Đài Y1-Y2, vừa làm vừa dạy	120.000 (2 người)	Transfer know-how

Ngân sách giải quyết R3 [C]: Y1 = 200.000, Y2 = 180.000, Y3+ = 160.000/năm. Tổng 5Y khoảng 860.000 USD. Đã tính trong OPEX training budget tại PHẦN V.

Q.5.5. Chi tiết giảm thiểu R4 — Downtime máy

Loại bảo trì	Tần suất	Nội dung	Chi phí/máy/năm [B]	Downtime dự kiến
Daily check	Hàng ngày	Mức dầu, lọc khí, dung dịch cắt	Trong OPEX	15 phút/ngày
Weekly PM	Hàng tuần	Lọc dầu, giá trượt, ATC, coolant	200	1 giờ/tuần
Monthly PM	Hàng tháng	Spindle runout, tool magazine, axis backlash	800	4 giờ/tháng
Quarterly PM	Quý	Ballscrew, guide rail, lubrication system	2.000	8 giờ/quý
Annual PM	Năm	Full geometry check, laser calibration	5.000	16-24 giờ/năm
Tổng PM/máy/năm			khoảng 12.000	khoảng 200 giờ/năm
Tổng PM fleet 28 máy/năm			khoảng 336.000	

OEE Target và Breakdown:

Thành phần OEE	Y1 [A]	Y3 [A]	Y5 [A]	World-class [B]
Availability (% thời gian chạy)	88%	91%	92%	90%
Performance (% tốc độ thực/lý thuyết)	85%	88%	90%	95%
Quality (% chi tiết đạt / tổng)	95%	97%	98%	99,9%
OEE	71,1%	77,6%	81,1%	85,2%

Chi phí downtime ngoài kế hoạch [C]: Giá trung bình 60 USD/giờ x (1 - Availability) x 7.200 giờ/năm x 28 máy = Y1: 60 x 12% x 7.200 x 28 = 1.451.520 USD/năm (lý thuyết, giảm dần khi PM tốt hơn). Mục tiêu: Unplanned downtime dưới 3% từ Y3.

Q.5.6. Kết quả tài chính CNC điều chỉnh rủi ro

Xác suất gán cho mỗi rủi ro và tác động lên doanh thu:

Rủi ro	Xác suất xảy ra	Tác động nếu xảy ra	Expected Loss/năm [C]
R1 Mất KH lớn	15%	-1.700.000 Y5	-255.000
R2 Giá vật liệu tăng 20%	25%	-300.000 margin	-75.000
R3 Thiếu nhân lực (utilization -10%)	20%	-566.000 revenue	-113.200
R4 Downtime +5% (unplanned)	20%	-283.000 revenue	-56.600
R5 Scrap rate 5% thay vì 2%	10%	-170.000	-17.000
R6 KCNC delay 12 tháng	10%	-906.000 (Y1 revenue)	-90.600
R7 Chứng nhận delay 6 tháng	15%	-400.000 (mất Auto/Aero)	-60.000
R8 Cash crunch	10%	-200.000 (chi phí vay khẩn)	-20.000
R9 Trung Quốc cạnh tranh giá	30%	-150.000 margin	-45.000
R10 FX loss VND mạnh	15%	-100.000	-15.000
Tổng Expected Loss/năm (Y5)			-747.400

Doanh thu CNC Y5 sau rủi ro [C]: 5.658.830 - 747.400 = **4.911.430 USD EBITDA CNC Y5 sau rủi ro [C]:** 2.858.830 - 747.400 = **2.111.430 USD** (margin 37,3%) Vẫn dương và khả thi. IRR sau rủi ro khoảng 18-19% (vẫn hấp dẫn).

Tổng Revenue CNC 10Y (risk-adjusted probability-weighted) [C]: = 49.515.200 x (1 - trung bình 8% risk discount) khoảng **45,55M USD** = Vẫn là business unit lớn nhất và có lãi nhất trong 3 BU.

PHỤ LỤC R: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA) — TỔ HỢP 3 KHỐI

Cơ sở: Bản cập nhật toàn diện từ EIA V1.0 (chỉ Khối C — IoT/Robot) sang EIA V2.1 (Tổ hợp 3 khu chức năng trong 1 tòa nhà 3 tầng trên 1 ha). **Tham chiếu:** HO_SO_MO_RONG — 09_BAO_CAO_EIA_TONG_HOP_3_KHOI.md (1.767 dòng) **Phân loại dự án:** Nhóm I — Có nguy cơ tác động môi trường ở mức độ cao (Phụ lục III, Luật BVMT 2020)

R.1. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ QUY MÔ MÔI TRƯỜNG

R.1.1. Thông tin chung

Thông tin	Nội dung
Tên dự án	Tổ hợp Công nghệ cao Đa ngành Mekong Technology
Chủ đầu tư	Công ty TNHH Mekong Technology
Vị trí	Lô __, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP)
Tọa độ	10°52' N, 106°48' E
Tổng diện tích	1 ha (10.000 m ²), 1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m ²
Thời hạn hoạt động	50 năm
Tổng vốn đầu tư	47,50 triệu USD [C]

R.1.2. Quy mô 3 Khối chức năng

Khối	Chức năng	Diện tích (m ²)	Tải điện (kW)	Nhân sự	Giờ hoạt động
A — Datacenter	Colocation + Cloud	3.000	1.500–3.000	30–40	24/7/365
B — CNC Outsourcing	Gia công chính xác 5 trục	4.000	700–1.600	60–120	2–3 ca × 300 ngày
C — IoT/Robot + SMT	Lắp ráp điện tử, robot	3.000	400–800	100–150	2 ca × 300 ngày
TỔNG		10.000	2.600–5.400	190–310	

R.1.3. Tổng tài nguyên tiêu thụ hàng năm

Tài nguyên	Đơn vị	Khối A	Khối B	Khối C	Tổng	So với EIA V1.0
Điện năng	MWh/năm	13.140–26.280	3.360–11.520	1.920–3.840	18.420–41.640	V1.0: 2.000 → tăng 9–21×
Nước cấp	m ³ /ngày	20–40	25–40	15–22	60–102	V1.0: 30 → tăng 2–3,4×
Diesel (Generator)	lít/năm	18.000 (test 1h/tuần)	0	0	18.000	V1.0: 0 → MỚI
Hóa chất	tấn/năm	2 (Urea SCR)	15–30 (MWF, coolant)	3–5 (IPA, flux, solder)	20–37	V1.0: 5 → tăng 4–7×

Nhận xét [B]: Với tổng tải điện 2.600–5.400 kW và tiêu thụ 18.420–41.640 MWh/năm, dự án thuộc nhóm tiêu thụ năng lượng lớn theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật 50/2010/QH12). Bắt buộc báo cáo kiểm toán năng lượng 3 năm/lần.

R.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUY CHUẨN ÁP DỤNG

R.2.1. Luật và Nghị định

STT	Văn bản	Số hiệu	Nội dung liên quan
1	Luật Bảo vệ Môi trường	72/2020/QH14	Phân loại dự án, ĐTM, giấy phép MT
2	Nghị định hướng dẫn Luật BVMT	08/2022/NĐ-CP	Phụ lục III — Nhóm I; Thủ tục ĐTM
3	Thông tư hướng dẫn ĐTM	02/2022/TT-BTNMT	Nội dung, hình thức báo cáo ĐTM
4	Luật Tài nguyên nước	28/2023/QH15	Khai thác, sử dụng nước; xả thải
5	Nghị định về giảm phát thải GHG	06/2022/NĐ-CP	Kiểm kê GHG; giảm phát thải $\geq 25\%$
6	Nghị định về CTNH	08/2022/NĐ-CP (Mục 6)	Đăng ký chủ nguồn thải; Sổ đăng ký
7	Luật PCCC	27/2001/QH10, sửa đổi 40/2013/QH13	Phương án PCCC cho cơ sở sản xuất CN
8	Luật An toàn vệ sinh lao động	84/2015/QH13	Quan trắc MTLD; quản lý yếu tố nguy hại

R.2.2. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) áp dụng — 12 bộ

STT	QCVN	Phạm vi	Áp dụng cho Khối
1	QCVN 05:2023/BTNMT	Chất lượng không khí xung quanh (PM _{2.5} , PM ₁₀ , NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃)	A + B + C
2	QCVN 19:2009/BTNMT	Khí thải công nghiệp (bụi, SO ₂ , NO _x , CO) — ống khói	A + B + C
3	QCVN 20:2009/BTNMT	Một số chất hữu cơ trong khí thải (benzene, toluene, xylene)	B + C
4	QCVN 40:2011/BTNMT	Nước thải công nghiệp — Cột A (xả vào nguồn dùng cấp nước sinh hoạt)	A + B + C
5	QCVN 26:2010/BTNMT	Tiếng ồn khu vực sản xuất — ranh giới (ngày ≤ 70 , đêm ≤ 55 dB(A))	A + B + C
6	QCVN 27:2012/BTNMT	Rung động trong môi trường (vận tốc rung ≤ 2 mm/s ban ngày)	B → A
7	QCVN 03:2023/BYT	Giới hạn bụi, hóa chất tại nơi làm việc — TWA 8h	B (CNC)
8	QCVN 24:2016/BYT	Tiếng ồn nghề nghiệp (≤ 85 dB(A) cho 8h tiếp xúc)	B + C
9	QCVN 27:2016/BYT	Rung cục bộ (tay — cánh tay) và rung toàn thân	B (CNC)
10	QCVN 07:2009/BTNMT	Ngưỡng CTNH (xác định chất thải nguy hại)	A + B + C

STT	QCVN	Phạm vi	Áp dụng cho Khối
11	QCVN 01:2021/BXD	Quy hoạch xây dựng — khoảng cách ATMT/PCCC	A + B + C
12	QCVN 06:2022/BXD	An toàn cháy cho nhà và công trình	A + B + C

R.2.3. Tiêu chuẩn quốc tế áp dụng

Tiêu chuẩn	Phạm vi	Áp dụng cho
ISO 14001:2015	Hệ thống quản lý môi trường	Toàn tổ hợp (cam kết đạt trong 18 tháng)
ISO 14064-1:2018	Báo cáo phát thải GHG Scope 1+2	Toàn tổ hợp (hàng năm)
ISO 50001:2018	Quản lý năng lượng	Khối A — Datacenter (cam kết 24 tháng)
EN 50600 series	Thiết kế Datacenter	Khối A
ASHRAE TC 9.9	Nhiệt độ, độ ẩm, rung động cho IT equipment	Khối A
EU RoHS 2011/65/EU	Hạn chế chất độc hại trong sản phẩm điện tử	Khối C
EU REACH	Quản lý hóa chất nguy hại	Khối B + C
ICNIRP 2010	Giới hạn phơi nhiễm trường điện từ	Khối A (UPS/PDU)

Lưu ý [A]: Dự án áp dụng **đồng thời 12 bộ QCVN + 8 tiêu chuẩn quốc tế** — mức độ phức tạp cao nhất so với các dự án đơn lẻ trong KCNC. Lý do: Tổ hợp 3 loại hình sản xuất khác nhau (DC, CNC, SMT) trên cùng khuôn viên.

R.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NỀN

R.3.1. Điều kiện khí hậu

Thông số	Giá trị
Nhiệt độ trung bình năm	27,5°C (min 21°C tháng 1, max 35°C tháng 4)
Độ ẩm tương đối	78% (min 65% mùa khô, max 85% mùa mưa)
Lượng mưa trung bình	1.800–2.000 mm/năm (90% trong tháng 5–11)
Gió chủ đạo	Đông Nam (mùa khô) → Tây Nam (mùa mưa), vận tốc TB 2,3 m/s
Bức xạ mặt trời	4,3–5,0 kWh/m ² /ngày — thuận lợi cho Solar PV

R.3.2. Chất lượng không khí nền (quan trắc DONRE tháng 9/2024)

Thông số	Điểm 1 (trong KCNC)	Điểm 2 (giao thông gần)	QCVN 05:2023 (TB 24h)	Đánh giá
PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28	38	50	Điểm 2 gần ngưỡng
PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45	72	100	Đạt
NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35	58	100	Đạt
SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12	18	125	Đạt
CO (mg/m^3)	2,1	4,5	10	Đạt
Tiếng ồn dB(A)	48	62	—	Nền trung bình

Cảnh báo [B]: PM2.5 tại Điểm 2 = 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, gần ngưỡng TB năm QCVN 05 (25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Background PM2.5 TPHCM đã cao (28–35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nên bất kỳ phát thải thêm từ dự án đều nhạy cảm.

R.3.3. Nguồn nước

Thông số	Chi tiết
Nguồn cấp	Hệ thống cấp nước KCNC (từ nhà máy nước thành phố)
Quota cấp nước	150 m ³ /ngày (theo hợp đồng thuê đất KCNC)
Nhu cầu dự kiến	60–102 m ³ /ngày (đạt 40–68% quota)
Nước mưa	Thu gom riêng, sử dụng tưới cây xanh

R.3.4. Hệ sinh thái

Khu vực dự án nằm trong KCNC đã quy hoạch, đất đã san lấp, không có hệ sinh thái tự nhiên đặc biệt. Không có loài quý hiếm, di tích lịch sử trong phạm vi ảnh hưởng.

R.4. TÁC ĐỘNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

R.4.1. Quy mô thi công

Thông số	EIA V1.0 (1 Khối)	EIA V2.0 (3 Khối)	Hệ số tăng
Diện tích xây dựng	10.000 m ²	10.000 m ² (cùng)	1×
Khối lượng đào đắp	15.000 m ³	25.000–35.000 m ³	1,7–2,3×
Thời gian thi công	12 tháng	18–24 tháng (3 khối tuần tự)	1,5–2×

Thông số	EIA V1.0 (1 Khối)	EIA V2.0 (3 Khối)	Hệ số tăng
Đình công nhân	150 người	250–350 người	1,7–2,3×
Khối lượng BTCT	3.000 m ³	8.000–12.000 m³	2,7–4×

Nhận xét [C]: Khối lượng BTCT tăng mạnh do: Khối A yêu cầu sàn chịu lực ≥ 10 kPa (server rack), Khối B yêu cầu móng cách ly rung riêng cho 28 máy CNC + sàn nổi, Khối C yêu cầu nền Clean room.

R.4.2. Tác động bụi xây dựng

Hoạt động	Phát thải bụi (kg/ngày)	Thời gian	Biện pháp
San lấp, đào đắp	10–20	Tháng 1–6	Phun nước 4 lần/ngày, lưới che
Đổ bê tông (trộn, bơm)	3–5	Tháng 4–12	Trạm trộn kín, rửa xe
Vận chuyển vật liệu	5–10	Tháng 1–18	Phủ bạt xe, rửa bánh xe
Phá dỡ kết cấu cũ	2–5	Tháng 1–3	Phun sương, rào chắn
TỔNG ĐÌNH	25–40		4–5× so với V1.0

R.4.3. Tác động tiếng ồn xây dựng

Thiết bị	Mức ồn tại 15 m dB(A)	QCVN 26 ban ngày (70)	Biện pháp
Máy đóng cọc	85–95	Vượt	Cọc khoan nhồi thay thế
Máy xúc, ủi	75–85	Gần ngưỡng/Vượt	Giới hạn 7:00–18:00
Trạm trộn BT	70–80	Gần ngưỡng	Đặt xa ranh giới ≥ 30 m
Xe tải hạng nặng	75–85	Gần ngưỡng/Vượt	Hạn chế giờ cao điểm

R.4.4. Tác động nước thải xây dựng

- Nước rửa xe, thiết bị: 5–10 m³/ngày → Bể lắng cát + bể chứa tạm → Tái sử dụng phun nước
- Nước sinh hoạt công nhân (250–350 người): 10–15 m³/ngày → Nhà vệ sinh di động + bể phốt

R.4.5. Chất thải rắn xây dựng

Loại	Lượng (tấn)	Xử lý
Đất đào thừa	5.000–10.000	San lấp nội bộ hoặc vận chuyển
Bê tông vỡ	200–500	Nghiền tái chế làm nền đường
Sắt thép phế liệu	50–100	Bán phế liệu tái chế

Loại	Lượng (tấn)	Xử lý
Bao bì, gỗ coffa	100–200	Phân loại, tái chế/đốt

R.5. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI A: DATACENTER

R.5.1. Nhiệt thải — Vấn đề lớn nhất của Khối A

a) Tính toán nhiệt thải [C]:

Thông số	Công thức	Kết quả
IT Load	1.000–2.000 kW (100 rack × 10–20 kW/rack)	1.000–2.000 kW
PUE mục tiêu	1,32	
Tổng tải điện	IT Load × PUE = 1.320–2.640 kW	1.320–2.640 kW
Nhiệt thải cooling	(PUE – 1) × IT = 0,32 × IT	320–640 kW_th
Nhiệt thải IT (100% thành nhiệt)	= IT Load	1.000–2.000 kW_th
Tổng nhiệt thải		1.320–2.640 kW_th
Quy đổi BTU/h	× 3.412	4.504.000–9.008.000 BTU/h

b) Hệ thống giải nhiệt:

Zone	Giải pháp	PUE đóng góp	Nhiệt thải (kW)	Chi phí (USD)
Zone 1 (40 rack, Enterprise)	Chilled Water — CRAH	1,45	580	(nằm trong CAPEX DC)
Zone 2 (60 rack, HPC/AI)	Direct Liquid Cooling	1,15–1,20	780–1.260	300.000 (bổ sung)
Trung bình	Hybrid	1,32	1.040–2.030	

c) Cooling Tower — Nước bay hơi [C]:

Công thức: $Q_{\text{evap}} = \frac{Q_{\text{thermal}}}{h_{\text{fg}}} = \frac{Q_{\text{thermal}} \times 3.600}{2.260 \times 1.000}$

Thông số	Min (1.040 kW)	Max (2.030 kW)
Nhiệt thải cần tản	1.040 kW	2.030 kW
Nước bay hơi	1,66 m³/h	3,23 m³/h
Drift + Blowdown (+50%)	2,49 m³/h	4,85 m³/h
Nước CT/ngày (24h)	59,7 m³	116,4 m³

CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG [C]: Nước Cooling Tower 60–116 m³/ngày RIÊNG Khối A đã bằng hoặc VƯỢT quota nước KCNC (150 m³/ngày cho toàn bộ dự án). Cộng thêm nước cho CNC (25–40 m³/ngày)

và SMT (15–22 m³/ngày) → Tổng 100–178 m³/ngày → **CÓ THỂ VƯỢT QUOTA.**

d) Giải pháp nước — 3 phương án [A]:

PA	Giải pháp	Nước CT (m³/ngày)	Ưu điểm	Nhược điểm	CAPEX (USD)
A	Air-cooled Chiller (không CT)	0	Không dùng nước	PUE tăng 0,1–0,15 (+15% điện), ồn	380.000
B	Hybrid cooling (CT nhỏ + Air-cooled)	30–60	Cân bằng PUE/nước	Phức tạp hệ thống	120.000
C	Bể chứa nước mưa 500 m³ + CT	60–116 (bù từ mưa)	PUE tối ưu	Phụ thuộc mùa mưa	85.000

Khuyến nghị [A]: Phương án B (Hybrid) — giảm 50% nước CT, PUE chấp nhận được 1,35–1,40, chi phí vừa phải. Kết hợp PA C (bể mưa 200 m³) cho mùa mưa → Tổng nước CT chỉ 30–40 m³/ngày → Trong quota.

R.5.2. Tiếng ồn Diesel Generator

a) Nguồn ồn:

Thiết bị	Công suất	Mức ồn tại 1 m dB(A)	Tần suất	QCVN 26 ngày (70)
Generator #1 (Primary)	2.000 kVA	95–105	Test 1h/tuần + Emergency	Vượt
Generator #2 (Backup N+1)	2.000 kVA	95–105	Standby (chỉ chạy khi #1 hỏng)	Vượt

b) Tính toán mức ồn tại ranh giới (30 m) [C]:

$$L_{\text{ranh giới}} = L_{\text{nguồn}} - 20 \times \log_{10}\left(\frac{r}{r_0}\right) = 105 - 20 \times \log_{10}(30) = 105 - 29,5 = 75,5 \text{ dB(A)}$$

→ **75,5 dB(A) > 70 dB(A)** → VƯỢT QCVN 26 ban ngày → Bắt buộc giảm ồn

c) Biện pháp [A]:

Biện pháp	Mức giảm dB	Kết quả	Chi phí (USD)
Acoustic enclosure (tường thép + PU foam 100 mm)	20–25	75,5 - 22 = 53,5 dB(A) → ĐẠT	45.000/Generator × 2 = 90.000
Exhaust silencer (hospital grade)	25–30	Bổ sung cho ống xả	8.000 × 2 = 16.000
Phòng máy phát riêng biệt (tường BT 200 mm)	30–40	Nếu dùng phòng kín	(tính trong BXD)
TỔNG		53,5 dB(A)	106.000

R.5.3. Phát thải Diesel Generator — NOx vượt QCVN

a) Thông số phát thải [C]:

Chất ô nhiễm	Hệ số phát thải (g/kWh)	Generator 2.000 kVA × 1h/tuần × 52 tuần	kg/năm	QCVN 19 (mg/Nm³)	Nồng độ thực tế	Đánh giá
NOx	8,0	8,0 × 1.600 × 52 / 1.000	665,6	≤ 850	3.000	VƯỢT 3,5×
CO	1,3		108,2	≤ 1.000	450	✓ Đạt
PM (bụi)	0,2		16,6	≤ 200	150	✓ Đạt
SO ₂ (ULSD)	0,8		66,6	≤ 500	80	✓ Đạt
CO ₂	—		45.900	—	—	Scope 1 GHG

VƯỢT QCVN [C]: NOx = 3.000 mg/Nm³ VƯỢT QCVN 19 (≤ 850 mg/Nm³) gấp 3,5 lần. Bắt buộc lắp SCR.

b) Giải pháp SCR + DPF [A]:

Thiết bị	Hiệu quả	Kết quả sau xử lý	Chi phí (USD)
SCR (Selective Catalytic Reduction)	NOx giảm 85–90%	3.000 → 300–450 mg/Nm³ → ✓ QCVN 19 (≤ 850)	80.000/Gen × 2 = 160.000
DPF (Diesel Particulate Filter)	PM giảm 95%	150 → 7–15 mg/Nm³ → ✓	40.000/Gen × 2 = 80.000
CEMS (Online monitoring)	Real-time NOx, PM, CO, SO ₂	Truyền dữ liệu DONRE	50.000
Ống khói (20 m, Φ600 mm, inox)	Phân tán	H _{eff} = 32 m (với plume rise)	35.000
TỔNG Xử lý khí thải Khối A			325.000

R.5.4. UPS Battery — Chất thải nguy hại

Loại pin	Tuổi thọ	Trọng lượng thải/năm	Mã CTNH	Xử lý
LiFePO ₄ (Zone 2 — HPC)	10–15 năm	667 kg/năm	16 06 05	Tái chế kim loại quý
VRLA (nếu dùng Zone 1)	5–7 năm	3.750 kg/năm	16 06 01	Tái chế chì (Pb)

Khuyến nghị [A]: Sử dụng LiFePO₄ cho cả 2 zone → CTNH pin giảm 82% (từ 3.750 → 667 kg/năm), tuổi thọ dài hơn 2×, mật độ năng lượng cao hơn 3×. Chi phí cao hơn 60% nhưng TCO 15 năm thấp hơn.

R.5.5. Trường điện từ (EMF)

Vị trí đo	Cường độ điện trường (V/m)	Mật độ từ thông (μT)	ICNIRP 2010 (V/m / μT)	Đánh giá
UPS Room (cách 1 m)	120–200	15–40	5.000 / 200	✅ Đạt (< 5%)
Server Room	30–80	5–15	5.000 / 200	✅ Đạt (< 2%)
PDU/STS Room	150–300	20–60	5.000 / 200	✅ Đạt (< 6%)
Ranh giới (30 m)	< 5	< 0,5	5.000 / 200	✅ (< 0,1%)

→ EMF **KHÔNG phải vấn đề** cho Khối A. Tất cả giá trị < 6% ngưỡng ICNIRP.

R.6. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI B: CNC OUTSOURCING**R.6.1. Dung dịch gia công (MWF — Metalworking Fluid)****a) Tiêu thụ và thải MWF [C]:**

Thông số	Giá trị
Số máy CNC	28 (12 × 5-axis + 3 HMC + 6 × 3-axis + 5 tiện + 2 EDM)
MWF/máy	50–200 lít (tùy kích thước bể)
Tổng MWF sử dụng	2.500–4.000 lít (~3 m ³)
Tuổi thọ MWF	3–6 tháng (với quản lý tốt)
MWF thải/năm	10–25 m³ = 10–25 tấn → CTNH
Thành phần	Dầu khoáng/tổng hợp, amine, borate, biocide, kim loại hòa tan (Cr, Ni, Ti, Fe, Al)
Mã CTNH	12 01 09 (MWF chứa halogen) hoặc 12 01 10 (không halogen)

b) Rủi ro MWF [B]: - pH 8–10 → Ăn mòn da, kích ứng đường hô hấp - Bacteria/fungi phát triển → Oil mist chứa endotoxin → Viêm phổi nghề nghiệp - Kim loại hòa tan (đặc biệt Cr(VI) từ Inox 316) → Ung thư (IARC Nhóm 1)

R.6.2. Phôi kim loại — Chất thải rắn công nghiệp

Vật liệu gia công	Phôi phát sinh (tấn/năm)	Đặc tính nguy hại	Xử lý
Nhôm (Al)	20–40	Cháy ở dạng bụi mịn (< 100 μm)	Briquetting → Tái chế
Thép C45/SCM440	15–30	Dầu MWF dính → CTNH nếu ướt	Tách dầu → Tái chế phế liệu
Inox 316/304	5–15	Chứa Cr, Ni → CTNH	Thu gom riêng, tái chế

Vật liệu gia công	Phôi phát sinh (tấn/năm)	Đặc tính nguy hại	Xử lý
			chuyên dụng
Titan Ti-6Al-4V	3–8	NGUY HIỂM CAO — Cháy tự phát (pyrophoric) khi dạng bụi mịn	Bảo quản ướt, thùng kín, cách ly nguồn lửa
Đồng (Cu, CuBe)	2–5	CuBe → Bụi độc cấp tính	PPE P100 bắt buộc
TỔNG	50–100		

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT — Titan [B]: Phôi Ti-6Al-4V ở dạng chip mỏng và bụi mịn có thể **tự bốc cháy** (pyrophoric) khi tiếp xúc không khí. Nhiệt độ tự cháy ~350°C nhưng bụi mịn có thể cháy ở nhiệt độ thấp hơn nhiều. Biện pháp bắt buộc: - Bảo quản phôi Ti trong thùng kín, ướt (MWF hoặc nước) - Khu vực riêng biệt, cách nguồn lửa ≥ 10 m - Bình chữa cháy Class D (bột khô đặc biệt — KHÔNG dùng nước, foam, CO₂) - Hạn chế gia công khô (dry machining) Titan

R.6.3. Bụi kim loại — Rủi ro sức khỏe nghề nghiệp

a) Nguồn phát sinh và nồng độ [C]:

Hoạt động	Loại bụi	Kích thước hạt	Lưu lượng khí (Nm ³ /h)	Nồng độ tại nguồn (mg/m ³)
CNC milling (dry cut)	Al, Ti, Fe, Cr, Ni	1–100 µm	500–1.000	5–20
CNC milling (wet/coolant)	Oil mist + metal fines	0,1–10 µm	500–1.000	1–5
Grinding/Deburring	Silica + metal	0,5–50 µm	300–500	10–50
Chip handling (conveyor)	Metal dust	5–200 µm	200–300	2–10
Briquetting (ép phôi)	Metal dust	1–50 µm	100–200	5–15

b) Nồng độ bụi tại nơi làm việc — So sánh QCVN 03:2023/BYT [C]:

Thông số	Không có LEV (mg/m ³)	Có LEV — hiệu suất 90% (mg/m ³)	QCVN 03:2023 TWA 8h (mg/m ³)	Đánh giá
Bụi tổng (inhalable)	8–25	0,8–2,5	10,0	✅ (có LEV)
Bụi hô hấp (respirable)	3–10	0,3–1,0	3,0	✅ (có LEV)
Bụi Cr (từ Inox 316)	0,05–0,2	0,005–0,02	0,05 (Cr tổng)	✅ (có LEV)

Thông số	Không có LEV (mg/m ³)	Có LEV — hiệu suất 90% (mg/m ³)	QCVN 03:2023 TWA 8h (mg/m ³)	Đánh giá
Bụi Cr(VI) (từ Inox 316)	0,005–0,02	0,0005–0,002	0,005	GẦN NGƯỠNG
Bụi Ni (từ Inox 316)	0,03–0,1	0,003–0,01	0,02	✅ (có LEV)
Bụi Ti (từ Ti-6Al-4V)	0,1–0,5	0,01–0,05	1,5	✅ (có LEV)
Oil mist (MWF aerosol)	2–8	0,2–0,8	0,5	GẦN NGƯỠNG

RỦI RO SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP [B]: - Bụi Cr(VI): IARC Nhóm 1 — **Gây ung thư phổi xác định.**
Nồng độ 0,0005–0,002 mg/m³ gần ngưỡng 0,005 mg/m³. Cần LEV hiệu suất > 95% + PPE mặt nạ P100 cho công nhân gia công Inox 316. - **Oil mist (MWF):** 0,2–0,8 mg/m³ có thể vượt 0,5 mg/m³ khi nhiều máy chạy đồng thời. Cần MWF mist collector riêng cho MỖI máy CNC.

c) Phát thải bụi ra môi trường (sau hệ thống LEV + HEPA) [C]:

Thông số	Nồng độ sau xử lý (mg/Nm ³)	QCVN 19:2009 (mg/Nm ³)	Phát thải (kg/năm)	Đánh giá
Bụi tổng	5–15	200	36–108	✅ Đạt
Metal fines (Cr, Ni, Ti)	0,5–2	—	3,6–14,4	Quan trắc

R.6.4. Rung động — Xung đột nghiêm trọng nhất CNC → Datacenter

ĐÂY LÀ TÁC ĐỘNG XUNG ĐỘT QUAN TRỌNG NHẤT TRONG TOÀN BỘ TỔ HỢP.

a) Nguồn rung từ 28 máy CNC [B]:

Máy CNC	Trọng lượng (tấn)	Tốc độ trục chính (rpm)	Rung tại nguồn (mm/s rms)	Tần số chủ đạo (Hz)
DMG MORI DMU 50 (× 6)	4,5	12.000–20.000	2,0–5,0	200–333
DMG MORI DMU 80 (× 4)	8,0	10.000–18.000	3,0–8,0	167–300
Makino D500 (× 2)	6,0	14.000–20.000	1,5–4,0	233–333

Máy CNC	Trọng lượng (tấn)	Tốc độ trục chính (rpm)	Rung tại nguồn (mm/s rms)	Tần số chủ đạo (Hz)
Makino a61nx (× 3 HMC)	10,0	8.000–14.000	4,0–10,0	133–233
Peak (28 máy đồng thời)			5,0–15,0 (tổng hợp)	100–400

b) Mô hình truyền rung qua nền đất [C]:

Công thức: $v(r) = v_0 \cdot \left(\frac{r_0}{r}\right)^n \cdot e^{-\alpha \cdot (r - r_0)}$

Thông số	Giá trị	Nguồn
v_0 (rung tại nguồn)	10 mm/s (peak)	Đo/Catalog
r_0 (khoảng cách tham chiếu)	1 m	Tiêu chuẩn
r (khoảng cách đến Khối A)	25 m	Thiết kế mặt bằng
n (hệ số hình học — sóng bề mặt)	0,5	Rayleigh wave
α (hệ số hấp thụ — đất sét/cát)	0,01–0,03 m ⁻¹	Soil mechanics

Kết quả tính [C]:

$v(25m) = 10 \times (1/25)^{0,5} \times e^{-0,02 \times 24} = 10 \times 0,2 \times 0,619 = 1,24 \text{ mm/s}$

c) So sánh với ngưỡng Datacenter [C]:

Thông số	Giá trị tính toán	Ngưỡng Datacenter (ASHRAE)	Hệ số vượt
Vận tốc rung	1,24 mm/s	< 0,1 mm/s	VƯỢT 12,4×
Gia tốc rung	1,56 m/s² (ở 200 Hz)	< 0,1 m/s²	VƯỢT 15,6×
Displacement	0,99 μm	< 0,1 μm (HDD spec)	VƯỢT 9,9×

KẾT LUẬN NGHIÊM TRỌNG [C]: Rung từ Khối B tại khoảng cách 25 m **VƯỢT ngưỡng Datacenter 10–15 lần**. Nếu không có biện pháp: 1. **HDD Head Crash** → Mất dữ liệu khách hàng 2. Ảnh hưởng precision server, AI accelerator 3. Giảm tuổi thọ mechanical components → Tăng OPEX DC

d) Biện pháp cách ly rung **BẮT BUỘC** — CAPEX 520.000 USD [A]:

STT	Biện pháp	Mức giảm	Chi phí (USD)
1	Móng nổi cách ly (vibration isolation foundation) cho MỖI máy CNC: Spring isolator + Rubber pad	90–95%	15.000/máy × 25 = 375.000
2	Rãnh cách ly rung giữa Khối B và Khối A: Sâu 2 m, rộng 1 m,	60–80%	120.000

STT	Biện pháp	Mức giảm	Chi phí (USD)
	dài 40 m, chèn cao su + cát		
3	Giám sát rung real-time tại Khối A (4 sensor + alarm 3 cấp)	Monitoring	25.000
TỔNG (1 + 2 + 3)	Kết hợp: 97–99%		520.000

Kết quả sau cách ly [C]:

$$v_{sau} = 1,24 \times (1 - 0,98) = 0,025 \text{ mm/s} \quad \checkmark < 0,1 \text{ mm/s (ASHRAE)}$$

$$Displacement_{sau} = 0,02 \text{ } \mu\text{m} \quad \checkmark < 0,1 \text{ } \mu\text{m (HDD spec)}$$

R.6.5. Tiếng ồn xưởng CNC**a) Nguồn ồn [B]:**

Nguồn	Mức ồn tại 1 m dB(A)	Số lượng	Mức ồn trong xưởng dB(A)	Tại ranh giới 40 m dB(A)
Máy CNC (milling)	80–95	25	94–109	55–68
Máy nén khí (8 bar)	85–95	3	90–100	52–62
Chip conveyor	65–75	1	65–75	30–40
LEV fan	75–85	4	81–91	43–53
Briquetting press	85–90	1	85–90	47–52

b) Mức ồn tổng hợp tại ranh giới [C]:

$$L_{tong} = 10 \times \log_{10}(10^{68/10} + 10^{62/10} + 10^{40/10} + 10^{53/10} + 10^{52/10}) = 69,2 \text{ dB(A)}$$

→ **69,2 dB(A)** — Gần ngưỡng QCVN 26 ban ngày (70 dB(A))

c) Trong xưởng [C]: 94–109 dB(A) → **VƯỢT QCVN 24 (≤ 85 dB(A) cho 8h)** → Bắt buộc: PPE tại chụp NRR 25–30 dB, giới hạn thời gian tiếp xúc, luân chuyển ca

d) Biện pháp giảm ồn [A]: 1. Machine enclosure cho máy ồn nhất (DMU 80, a61nx): Giảm 10–15 dB → Chi phí 80.000 USD 2. Tường cách âm Khối B: Panel sandwich 100 mm PU foam ($R_w \geq 35$ dB) 3. Acoustic louvre cho hệ thống thông gió: Giảm 10–15 dB 4. Máy nén khí đặt phòng cách âm riêng: Giảm 20–25 dB 5. Kết quả tại ranh giới (ban ngày): **60–65 dB(A)** → ☒ Đạt QCVN 26

R.6.6. Nước thải CNC — Chứa kim loại nặng**a) Nguồn nước thải [C]:**

Nguồn	Lưu lượng (m ³ /ngày)	Ô nhiễm chính	pH
Coolant thải (MWF sau tách dầu)	3–5	KLN (Cr, Ni, Ti, Fe, Al), amine, borate	8–10
Rửa chi tiết CNC	5–8	Kim loại nặng, dầu mỡ	7–8

Nguồn	Lưu lượng (m³/ngày)	Ô nhiễm chính	pH
Rửa sàn xưởng	2–3	Dầu, phôi mịn, bụi	7
Sinh hoạt	8–12	BOD, NH ₄ ⁺	7
TỔNG	18–28		

b) Chất lượng nước thải CNC trước xử lý — vs QCVN 40 Cột A [C]:

Thông số	Đơn vị	Nước thải CNC	QCVN 40 Cột A	Hệ số vượt
pH	—	8,5–10,0	6–9	Vượt (cao)
COD	mg/L	500–2.000	75	7–27×
BOD ₅	mg/L	100–400	30	3–13×
TSS	mg/L	200–800	50	4–16×
Dầu mỡ khoáng	mg/L	50–200	5	10–40×
Tổng Cr	mg/L	0,5–5,0	0,05	10–100×
Cr(VI)	mg/L	0,02–0,2	0,02	1–10×
Ni	mg/L	0,5–3,0	0,1	5–30×
Fe	mg/L	5–30	1	5–30×
Al	mg/L	2–15	—	—
Ti	mg/L	0,5–5,0	—	—

KẾT LUẬN [C]: Nước thải CNC ô nhiễm **NẶNG**, đặc biệt dầu mỡ (10–40×) và kim loại nặng Cr(VI) (1–10×), Ni (5–30×). **BẮT BUỘC** hệ thống Zero Liquid Discharge (ZLD) riêng cho Khối B — xem R.9 bên dưới.

R.7. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI C: IoT/ROBOT + SMT

Lưu ý [C]: Khối C đã đánh giá trong EIA V1.0 (diện tích 10.000 m²). V2.0 cập nhật: diện tích giảm xuống 3.000 m² (30%), công suất giữ ~50% nhờ tối ưu layout. Hệ số điều chỉnh: **0,50**.

R.7.1. Khí thải Khối C (cập nhật ×0,50)

Nguồn	Chất phát thải	EIA V1.0 (kg/năm)	V2.0 (×0,50)	QCVN 19
SMT reflow + Wave soldering	NOx	720	360	✓

Nguồn	Chất phát thải	EIA V1.0 (kg/năm)	V2.0 (×0,50)	QCVN 19
SMT reflow + Wave soldering	CO	384	192	✓
SMT reflow + Wave soldering	Bụi kim loại	240	120	✓
Robot welding	NOx	720	360	✓
Robot welding	CO	360	180	✓
Robot welding	Bụi sắt	288	144	✓
Sơn robot	VOCs	1.296	648	✓
TỔNG	NOx	1.440	720	
	CO	744	372	
	Bụi	528	264	
	VOCs	1.296	648	

R.7.2. Nước thải Khối C (cập nhật)

Nguồn	V1.0 (m ³ /ngày)	V2.0	Ô nhiễm
Rửa PCB (IPA, flux)	2,0	1,0	IPA, flux, Cu
Nước chiller (clean room)	0,5	0,3	Nhiệt
Rửa sàn	1,0	0,5	Bụi, dầu nhẹ
Sinh hoạt	16,5	8,0	BOD, NH ₄ ⁺
TỔNG	20,0	9,8	

R.7.3. Chất thải nguy hại Khối C (cập nhật ×0,50)

Loại CTNH	V1.0 (tấn/năm)	V2.0 (×0,50)	Mã CTNH
Pin Li-ion thải	1,2	0,6	16 01 03
PCB lỗi, linh kiện hỏng	4,5	2,25	17 04
Flux, IPA, dung môi	0,9	0,45	14 06 03
Sơn, mực thải	0,6	0,30	08 01 11
Bao bì hóa chất	0,45	0,23	15 01 10
TỔNG CTNH Khối C	7,65	3,83	

R.8. TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY (CUMULATIVE IMPACT) — TỔ HỢP 3 KHỐI

Đây là phần chưa từng có trong EIA V1.0. Đánh giá tổng tải ô nhiễm khi 3 khối hoạt động đồng thời.

R.8.1. Tổng phát thải GHG (Scope 1+2) [C]

Phạm vi	Nguồn	tCO ₂ e/năm
Scope 1	Diesel Generator (Khối A)	45,9
Scope 1	Forklift diesel (Khối B, C)	15–25
Scope 1	Refrigerant leakage (R-134a, R-410A)	20–50
Scope 2	Điện lưới — Khối A	7.884–15.768
Scope 2	Điện lưới — Khối B	2.016–6.912
Scope 2	Điện lưới — Khối C	1.152–2.304
TỔNG		11.133–25.060

Hệ số phát thải điện lưới VN [B]: 0,6 tCO₂/MWh (Bộ Công Thương 2024) So V1.0: GHG tăng từ 1.237 → 11.133–25.060 tCO₂e/năm (tăng 9–20×), Khối A chiếm 63–71%

R.8.2. Tổng nước thải — Tải ô nhiễm tổng hợp [C]

a) Lưu lượng:

Khối	Nước thải SX (m ³ /ngày)	Nước thải SH (m ³ /ngày)	Tổng (m ³ /ngày)
A — Datacenter	5–10	4–6	9–16
B — CNC	10–16	8–12	18–28
C — SMT	1,8	8,0	9,8
TỔNG	16,8–27,8	20,0–26,0	36,8–53,8

b) Tải ô nhiễm tổng hợp (mass loading — kg/ngày) [C]:

Thông số	Khối A	Khối B	Khối C	Tổng (kg/ngày)	Ngưỡng QCVN 40 × 54 m ³	Hệ số vượt
COD	0,5	15–40	1,5	17–42	4,05	4–10×
BOD ₅	0,2	5–15	0,8	6–16	1,62	4–10×
TSS	0,3	8–20	0,5	8,8–20,8	2,70	3–8×
Dầu mỡ	0,1	3–8	0,1	3,2–8,2	0,27	12–30×
Cr tổng	0	0,02–0,08	0	0,02–0,08	0,0027	7–30×
Ni	0	0,02–0,05	0	0,02–0,05	0,0054	4–9×

BẮT BUỘC ZLD cho Khối B (CNC) — nước thải CNC KHÔNG được xả ra hệ thống chung.

R.8.3. Tổng CTNH [C]

Nguồn CTNH	Khối A	Khối B	Khối C	Tổng (tấn/năm)
Pin UPS thải	0,67	0	0	0,67
MWF coolant thải	0	10–25	0	10–25
Bùn coolant/XLNT	0	1,2–3,5	0	1,2–3,5
Phôi kim loại ướt	0	2–5	0	2–5
PCB lỗi, linh kiện	0	0	2,25	2,25
Flux, IPA, dung môi	0	0	0,45	0,45
Sơn, mực thải	0	0	0,30	0,30
Bao bì hóa chất	0	0,3–0,5	0,23	0,53–0,73
Brine crystals ZLD	0	0,5–1,5	0	0,5–1,5
TỔNG	0,67	13,5–34,0	3,83	18,0–38,5

So V1.0: CTNH tăng từ 7,65 → **18–38,5 tấn/năm** (tăng 2,4–5,0×). Khối B (CNC) chiếm 75–88%.

R.8.4. Xung đột giữa các Khối [A]

Xung đột	Nguồn → Bị ảnh hưởng	Mức độ	Biện pháp
Rung CNC → DC	Khối B → Khối A (Server, HDD)	NGHIÊM TRỌNG	Móng cách ly + Rãnh (R.6.4)
Bụi CNC → SMT	Khối B → Khối C (Clean room ISO 7)	CAO	Tách biệt HVAC, cửa kín, áp suất dương
Bụi CNC → DC	Khối B → Khối A (Server intake air)	TRUNG BÌNH	Lọc MERV 13+ cho AHU Datacenter
Nhiệt DC → CNC	Khối A Cooling Tower → Khối B CMM Room	TRUNG BÌNH	CT cách CMM Room > 20 m
Ồn CNC → DC	Khối B → Khối A NOC room	TRUNG BÌNH	Tường cách âm
VOCs SMT → DC	Khối C hơi IPA, flux → Khối A Air intake	THẤP	Activated carbon filter
EMF DC → CNC	Khối A UPS/PDU → Khối B CMM	THẤP	Khoảng cách > 25 m đủ suy giảm

R.8.5. Tổng phát thải khí thải 3 Khối [C]

Chất ô nhiễm	Khối A (kg/năm)	Khối B (kg/năm)	Khối C (kg/năm)	Tổng (kg/năm)	So V1.0
NOx	914	50–100	360	1.324–1.374	V1: 1.440 ≈

Chất ô nhiễm	Khối A (kg/năm)	Khối B (kg/năm)	Khối C (kg/năm)	Tổng (kg/năm)	So V1.0
CO	103	20–40	192	315–335	V1: 744 ↓55%
Bụi (PM)	37,7	36–108	264	337,7–409,7	V1: 528 ↓22–36%
VOCs	37,7	100–200	648	785,7–885,7	V1: 1.296 ↓32–39%
SO ₂	68,5	0	0	68,5	V1: 0 → MỚI

Nhận xét [C]: Tổng phát thải KHÔNG tăng nhiều (do Khối C giảm 50%), nhưng **thành phần thay đổi:** bổ sung NO_x/SO₂ từ Generator và bụi kim loại carcinogenic (Cr(VI), Ni) từ CNC.

R.8.6. Mô hình phân tán PM2.5 — Gaussian Dispersion [C]

a) Phương trình:

$$C(x,y,0) = \frac{Q}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{H_{\text{eff}}^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

b) Kết quả (Generator chạy 1h test, stability class B–C):

Khoảng cách (m)	C _{generator} (µg/m ³)	C _{CT drift} (µg/m ³)	C _{tổng} (µg/m ³)	Background + C	So QCVN 05 (50 µg/m ³ 24h)
30 (ranh giới)	0,8	0,3	1,1	32–36	✓
100 (C _{max})	4,3	0,8	5,1	36–40	✓
200	2,8	0,4	3,2	34–38	✓
500	0,9	0,1	1,0	32–36	✓

c) Worst-case (stability F, gió 1 m/s): PM2.5 tại 100 m = **47,5 µg/m³** — Gần ngưỡng QCVN 05 (50 µg/m³). Xảy ra < 5% thời gian, chỉ khi nghịch đảo nhiệt + Generator test.

d) PM2.5 trung bình năm (Generator 1h/tuần + CT 24/7): Đóng góp dự án chỉ **0,1–0,8 µg/m³** (< 3% ngưỡng). Rủi ro chính từ background TPHCM (28–35 µg/m³, đã gần ngưỡng TB năm 25 µg/m³).

R.9. BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG — TỔ HỢP 3 KHỐI

R.9.1. Xử lý khí thải

a) Khối A — Generator: SCR + DPF + CEMS = 325.000 USD

Thiết bị	Hiệu quả	Chi phí (USD)
SCR (NO _x giảm 85–90%)	3.000 → 300–450 mg/Nm ³ → ✓ QCVN 19	160.000
DPF (PM giảm 95%)	150 → 7–15 mg/Nm ³ → ✓	80.000
CEMS (online monitoring)	Real-time → DONRE	50.000

Thiết bị	Hiệu quả	Chi phí (USD)
Ống khói 20 m Φ600 inox	H _{eff} = 32 m; phân tán	35.000

b) Khối B — LEV + HEPA + Mist Collector = 280.000 USD

Sơ đồ xử lý:




Diagram 56

Chi phí: Mist collector 75.000 + LEV tập trung 120.000 + Cyclone/HEPA/Carbon 85.000 = **280.000 USD**

c) Khối C — Fume hood + Filter = 105.000 USD (giảm 30% từ V1.0: 150.000)

Hạng mục	V2.0 (USD)
Fume hood (6 điểm hút)	35.000
Cyclone + Bag filter	28.000
Activated Carbon (VOCs)	21.000
Quạt, ống khói	21.000

Tổng CAPEX xử lý khí thải 3 Khối: 325.000 + 280.000 + 105.000 = 710.000 USD [C]

R.9.2. Xử lý nước thải — Chiến lược: Tách riêng + ZLD cho CNC

Sơ đồ XLNT tổ hợp:

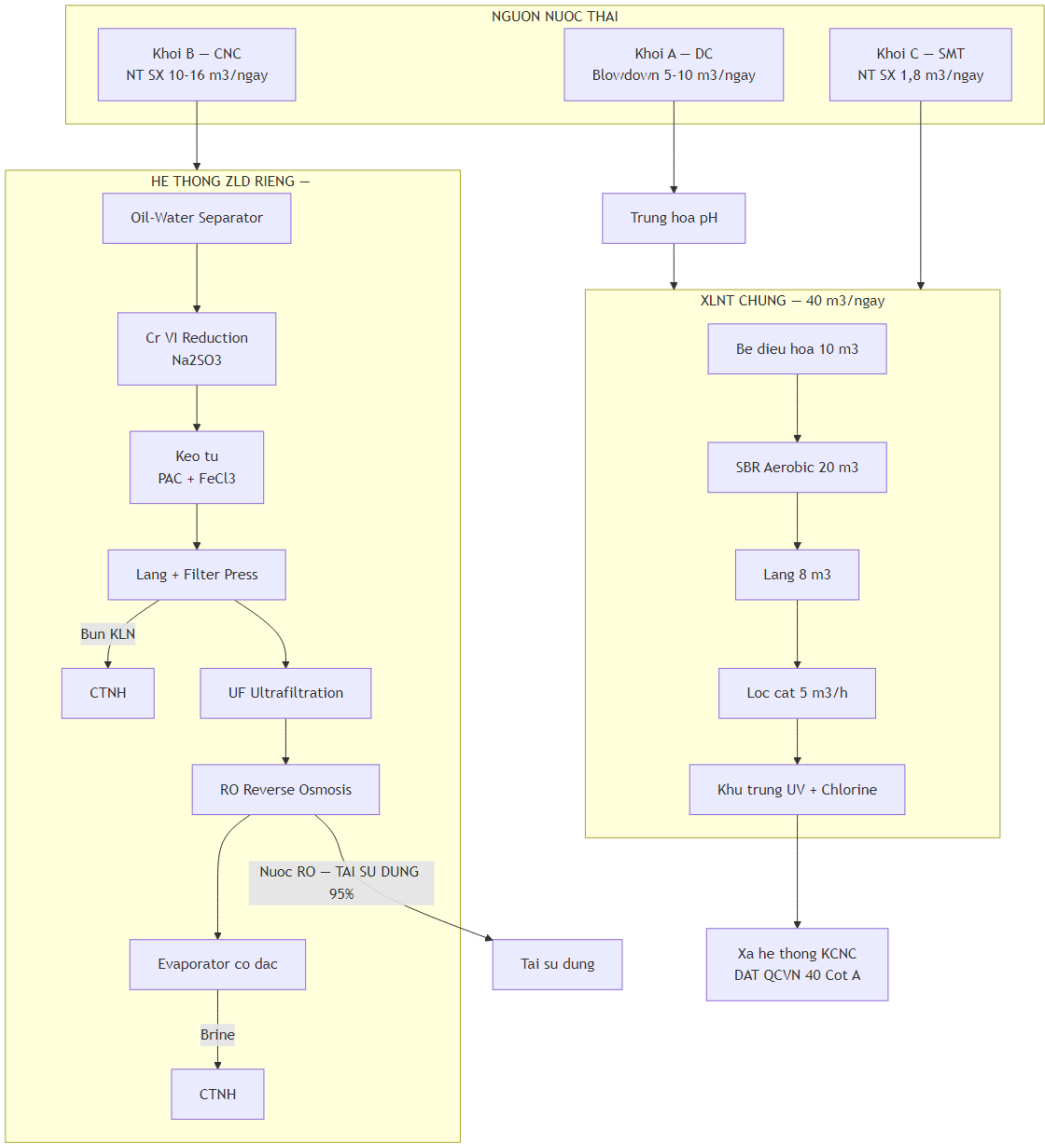


Diagram 57

Chi phí hệ thống ZLD cho Khối B (CNC):

Hạng mục	Chi phí (USD)
Oil-Water Separator	35.000
Chemical dosing (pH + coagulant)	25.000
Clarifier + Filter Press	80.000
UF System (10 m³/h)	60.000
RO System (8 m³/h, 2 stage)	85.000
Evaporator (1 m³/h)	120.000
Piping, instruments, control	45.000
TỔNG ZLD CAPEX	450.000
OPEX (hóa chất, điện, membrane)	80.000/năm

Kết quả ZLD: Nước tái sử dụng 85% (RO) + 10% (Evaporator) = **95%**. Xả ra ngoài: **0 m³/ngày**.

Chi phí XLNT chung: CAPEX 250.000 USD + OPEX 60.000/năm

Tổng CAPEX XLNT: 450.000 + 250.000 = 700.000 USD [C]

R.9.3. Quản lý CTNH

a) Kho CTNH tập trung (nâng cấp):

Thông số	V1.0	V2.0
Diện tích	30 m ²	80 m² (3 khu)
Sức chứa	3 tấn	10 tấn
Khu 1 — Pin/Ắc quy	—	15 m ² , aerosol chữa cháy, < 30°C
Khu 2 — Dầu/MWF	—	40 m ² , bồn inox 5.000 L, sàn epoxy, hồ thu 5 m ³
Khu 3 — Hóa chất/Dung môi	—	25 m ² , tủ chống cháy, detector khí
CAPEX	45.000 USD	120.000 USD

b) Chi phí CTNH hàng năm [C]:

Hạng mục	Lượng (tấn/năm)	Đơn giá (USD/tấn)	Chi phí (USD/năm)
MWF thải (Khối B)	10–25	2.000	20.000–50.000
PCB/dung môi/sơn (Khối C)	3,83	4.000	15.320
Bùn KLN + coolant (Khối B)	1,5–4,5	3.000	4.500–13.500
Pin UPS (Khối A)	0,67	5.000	3.350
Phôi ướn (Khối B)	2–5	1.500	3.000–7.500
Brine ZLD (Khối B)	0,5–1,5	3.000	1.500–4.500
TỔNG	18–38,5		47.670–94.170

R.9.4. Cách ly rung + cách âm + phân vùng

a) Khoảng cách cách ly tối thiểu:

Giữa	Khoảng cách (m)	Lý do
Khối A ↔ Khối B	≥ 25	Rung CNC → DC; Ổn CNC → NOC
Khối B ↔ Khối C	≥ 10	Bụi kim loại → Clean room
Khối A ↔ Khối C	≥ 30	(tự nhiên — Khối B ở giữa)
Cooling Tower ↔ CMM Room	≥ 20	Nhiệt ẩm → CMM
Generator ↔ Ranh giới	≥ 30	Ồn + khí thải
Kho CTNH ↔ Sản xuất	≥ 15	An toàn PCCC

b) Chi phí cách ly/cách âm: - Cách ly rung (móng + rãnh + sensor): **520.000 USD** (xem R.6.4) - Cách âm (tường, enclosure, acoustic louvre): **125.000 USD**

R.9.5. Giảm phát thải GHG

STT	Biện pháp	Giảm GHG (tCO ₂ /năm)	CAPEX (USD)	Payback
1	Solar PV áp mái 500 kWp	365	500.000	6–8 năm
2	PUE < 1,35 (Liquid Cooling)	1.500–3.000	300.000	3–5 năm
3	Green Power PPA (10% tái tạo)	1.100–2.500	0	0
4	VFD cho Chiller/Pump/Fan	200–500	80.000	2–3 năm
5	LED lighting toàn bộ	30–50	20.000	1–2 năm
6	Forklift điện thay diesel	15–25	100.000	4–5 năm
7	Free cooling ban đêm	100–300	50.000	2–3 năm
TỔNG		3.310–6.740	1.050.000	

Kết quả: GHG giảm **27–30%** → Đạt cam kết ≥ 25% theo ND 06/2022/ND-CP.

R.10. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

R.10.1. Quan trắc Khối A — Datacenter

STT	Thông số	Vị trí	Tần suất	QCVN
1	Khí thải Generator (NO _x , CO, PM, SO ₂)	Ống khói	Online CEMS	QCVN 19
2	Tiếng ồn	4 điểm ranh giới + NOC	Hàng quý + online	QCVN 26
3	Rung động	4 sensor Server room	Online 24/7	ASHRAE < 0,1 mm/s
4	EMF	Server room + UPS	Hàng năm	ICNIRP 2010
5	Nước blowdown	Điểm xả	Hàng tháng	QCVN 40 Cột A
6	Nhiệt độ CT	4 điểm quanh CT	Online 24/7	ΔT < 3°C
7	PUE	IT meter + Total meter	Online 24/7	PUE < 1,35

R.10.2. Quan trắc Khối B — CNC

STT	Thông số	Vị trí	Tần suất	QCVN
1	Bụi KLN (Cr, Ni, Ti, Al, Fe)	Trong xưởng (5 điểm)	Hàng tháng	QCVN 03:2023
2	Oil mist (MWF aerosol)	Mỗi máy CNC (25 điểm)	Hàng tháng	QCVN 03:2023
3	Bụi Cr(VI)	Khu Inox 316	Hàng tháng	≤ 0,005 mg/m ³
4	Tiếng ồn nghề nghiệp	Mỗi vị trí CNC	Hàng quý (Dosimeter)	QCVN 24:2016
5	Rung tay–cánh tay	Công nhân CNC	Hàng quý	QCVN 27:2016
6	Nước thải CNC (trước/sau ZLD)	Đầu vào + RO permeate	2 lần/tháng	QCVN 40

STT	Thông số	Vị trí	Tần suất	QCVN
7	Chất lượng MWF	Mỗi tank	Hàng tuần	Nhà SX
8	Khí thải LEV	Ổng khói CNC	Hàng quý	QCVN 19

R.10.3. Quan trắc Khối C — SMT

STT	Thông số	Vị trí	Tần suất	QCVN
1	Khí thải (NOx, CO, Bụi, VOCs)	Ổng khói Khối C	Hàng quý	QCVN 19
2	Nước thải	Sau XLNT chung	2 lần/tháng	QCVN 40
3	Tiếng ồn	4 điểm ranh giới	Hàng quý	QCVN 26
4	Clean room ISO 7	Particle count	Hàng tháng	ISO 14644-3

R.10.4. Quan trắc tác động tích lũy

STT	Thông số	Tần suất	Mục đích
1	PM2.5, PM10 (4 góc + 2 điểm giữa)	Hàng quý	Tổng bụi nền + CNC + Generator
2	Kim loại nặng trong bụi (Cr, Ni)	Hàng quý	Phát tán bụi KLN từ CNC
3	Tiếng ồn tổng hợp	Hàng quý	Tổng ồn 3 Khối
4	GHG (CO ₂ e) toàn tổ hợp	Hàng năm	ISO 14064-1
5	PUE Datacenter	Liên tục	Dashboard real-time
6	WUE (Water Usage Effectiveness)	Hàng tháng	L/kWh IT load

Đơn vị quan trắc: ISO 17025:2017 (VLAS) — Công ty CP Môi trường TP.HCM **Tần suất báo cáo:** Sở TNMT + KCNC: 6 tháng/lần; nội bộ: hàng tháng (dashboard)

R.11. DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

R.11.1. CAPEX Môi trường [C]

STT	Hạng mục	Khối A	Khối B	Khối C	Chung	Tổng (USD)
1	Xử lý khí thải	325.000	280.000	105.000	—	710.000
2	XLNT (ZLD + chung)	—	450.000	—	250.000	700.000
3	Kho CTNH (80 m ² × 3 khu)	—	—	—	120.000	120.000
4	Cách ly rung (móng + rãnh + sensor)	—	520.000	—	—	520.000
5	Cách âm (tường, enclosure)	30.000	80.000	15.000	—	125.000
6	Solar PV 500 kWp	—	—	—	500.000	500.000

STT	Hạng mục	Khối A	Khối B	Khối C	Chung	Tổng (USD)
7	Thiết bị quan trắc	50.000	30.000	5.000	15.000	100.000
8	Bể chứa sự cố, PCCC MT	20.000	30.000	10.000	10.000	70.000
9	Cây xanh, cảnh quan	—	—	—	25.000	25.000
TỔNG		425.000	1.390.000	135.000	920.000	2.870.000

So V1.0: CAPEX MT tăng từ 730.000 → **2.870.000 USD** (tăng 3,9×) Nguyên nhân chính: ZLD (+450K), Cách ly rung (+520K), SCR/DPF (+240K), Solar PV (+200K)

R.11.2. OPEX Môi trường hàng năm [C]

STT	Hạng mục	USD/năm
1	Vận hành khí thải (3 Khối)	55.000
2	Vận hành ZLD (Khối B)	80.000
3	Vận hành XLNT chung	60.000
4	CTNH thu gom & xử lý	70.000
5	Quan trắc môi trường	85.000
6	Giảm ồn (PPE, bảo dưỡng)	10.000
7	Bảo trì Solar PV	10.000
8	Green Power PPA (10%)	30.000
9	Bảo hiểm môi trường	15.000
10	Đào tạo nhân viên MT	10.000
TỔNG OPEX		425.000

R.11.3. Tổng chi phí 10 năm [C]

Khoản mục	Năm 1 (USD)	Năm 2–10 TB/năm	Tổng 10 năm (USD)
CAPEX	2.870.000	0	2.870.000
OPEX	425.000	425.000	4.250.000
TỔNG	3.295.000	425.000	7.120.000

Tỷ lệ: CAPEX MT / Tổng CAPEX 47,50M = **6,0%** (benchmark: 5–8% cho DC + Manufacturing) **10 năm:** 7.120.000 / 47.500.000 = **15,0%**

R.12. CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Mekong Technology cam kết:

1. **Xử lý khí thải** đạt QCVN 19:2009/BTNMT cho cả 3 Khối, lắp SCR + DPF cho Generator (Khối A), HEPA + Carbon cho CNC (Khối B)
2. **Nước thải**: Sinh hoạt + Khối A + C đạt QCVN 40 Cột A; Khối B áp dụng **Zero Liquid Discharge (ZLD)**
3. **CTNH**: Quản lý 18–38,5 tấn/năm theo Luật BVMT 2020, NĐ 08/2022
4. **Tiếng ồn**: Đạt QCVN 26 tại ranh giới (ngày ≤ 70 , đêm ≤ 55 dB(A))
5. **Rung động**: Rung từ Khối B $\rightarrow$ Khối A $< 0,1$ mm/s (ASHRAE)
6. **Bụi Cr(VI)**: $< 0,005$ mg/m³ tại nơi làm việc (IARC Nhóm 1 — ung thư)
7. **GHG**: Giảm $\geq 25\%$ (Scope 1+2) đến 2030 theo NĐ 06/2022
8. **ISO 14001:2015** — đạt trong 18 tháng sau vận hành (Q3/2028)
9. **ISO 50001:2018** — đạt trong 24 tháng cho Khối A
10. **Quan trắc**: Online 24/7 (rung, PUE, CEMS) + định kỳ (khí thải, nước thải, bụi KLN)
11. **Báo cáo**: 6 tháng/lần cho Sở TNMT + KCNC
12. **Ngân sách MT**: ~425.000 USD/năm (OPEX) + Quỹ sự cố 100.000 USD
13. **Nhân sự**: 1 Environmental Manager + 3 KTV (1/Khối) + đào tạo 4 lần/năm
14. **Diễn tập**: 4 lần/năm (1/quý), luân phiên kịch bản 3 Khối

Đại diện pháp luật Công ty TNHH Mekong Technology

Ông Phạm Xuân Quốc — Tổng Giám đốc (CEO)

(Chữ ký và con dấu)

Ngày __ tháng __ năm 2026

R.13. BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH EIA V1.0 vs V2.0

Thông số	EIA V1.0 (Khối C)	EIA V2.0 (3 Khối)	Hệ số tăng
Diện tích sản xuất	10.000 m ² (1 khối)	10.000 m² (3 khối)	1×
Tải điện (kW)	400	2.600–5.400	6,5–13,5×
Điện năng (MWh/năm)	2.000	18.420–41.640	9–21×
Nước cấp (m ³ /ngày)	30	60–102	2–3,4×
Nước thải (m ³ /ngày)	20	37–54	1,9–2,7×
CTNH (tấn/năm)	7,65	18–38,5	2,4–5,0×
GHG (tCO ₂ e/năm)	1.237	11.133–25.060	9–20×
NOx (kg/năm)	1.440	1.324–1.374	0,9×
VOCs (kg/năm)	1.296	786–886	0,6–0,7×
CAPEX MT (USD)	730.000	2.870.000	3,9×
OPEX MT (USD/năm)	211.000	425.000	2,0×
10-year Total (USD)	2.840.000	7.120.000	2,5×

Kết luận [A]: Mặc dù quy mô tài nguyên tăng 2–21× (tùy thông số), tổng phát thải khí thải thực tế KHÔNG tăng tương ứng nhờ: (a) Khối C giảm 50%, (b) SCR/DPF cho Generator, (c) HEPA + Mist collector cho CNC. Thách thức lớn nhất là **nước** (vượt quota tiềm tàng), **rung động** (CNC → DC vượt 12×), và **CTNH** (tăng 2,4–5× chủ yếu từ CNC MWF/phôi).

(Kết thúc Phụ lục R — Báo cáo EIA tổng hợp 3 Khối)

PHỤ LỤC S: VẬN HÀNH DATACENTER MACC — CHI TIẾT KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI

S.1. Tổng quan Datacenter MACC (Mekong AI Cloud Center)

S.1.1. Tầm nhìn và Định vị

Datacenter MACC được thiết kế theo tiêu chuẩn **Uptime Institute Tier III (Concurrently Maintainable)**, phục vụ 3 phân khúc chính:


Phân khúc	Mô tả	Tỷ trọng Revenue	Target Customers
Colocation Standard	Cho thuê rack/cage theo tháng/năm	35%	DN vừa, KCNC ecosystem, DR site
GPU-as-a-Service	Cho thuê GPU (A100/H100) theo giờ/tháng	40%	AI startup, research, VNG, FPT AI
Managed Services	Hosting + SOC + DR + Monitoring	25%	Enterprise (Banking, Fintech)

S.1.2. Thông số Kỹ thuật Tổng hợp

Thông số	Phase 1	Phase 2	Ghi chú
Số Rack	50	100	Phase 2 bao gồm GPU Zone
Diện tích Data Hall	500 m ²	1.000 m ²	2 halls
Diện tích hỗ trợ	1.000 m ²	2.000 m ²	Cooling plant, UPS room, NOC, staging
Power per Rack	4-10 kW	4-30 kW	GPU rack up to 30 kW
Total IT Load (Phase 1)	300 kW	—	50 rack × 6 kW avg
Total IT Load (Full)	—	1.200 kW	GPU racks boost avg
Total Facility Power	400 kW	1.600 kW	PUE 1,32
Cooling Capacity	500 kW	2.000 kW	N+1 Chiller + Direct Liquid for GPU

Thông số	Phase 1	Phase 2	Ghi chú
UPS Configuration	2N × 300 kVA	2N × 1.200 kVA	Rotary or Static
Generator	2 × 500 kVA diesel	4 × 750 kVA diesel	N+1, 24h fuel
Tier Level	Tier III (design)	Tier III (certified)	Uptime Institute
Target PUE	1,32	1,28	Liquid cooling giảm PUE Phase 2

S.1.3. Kiến trúc Vật lý DC

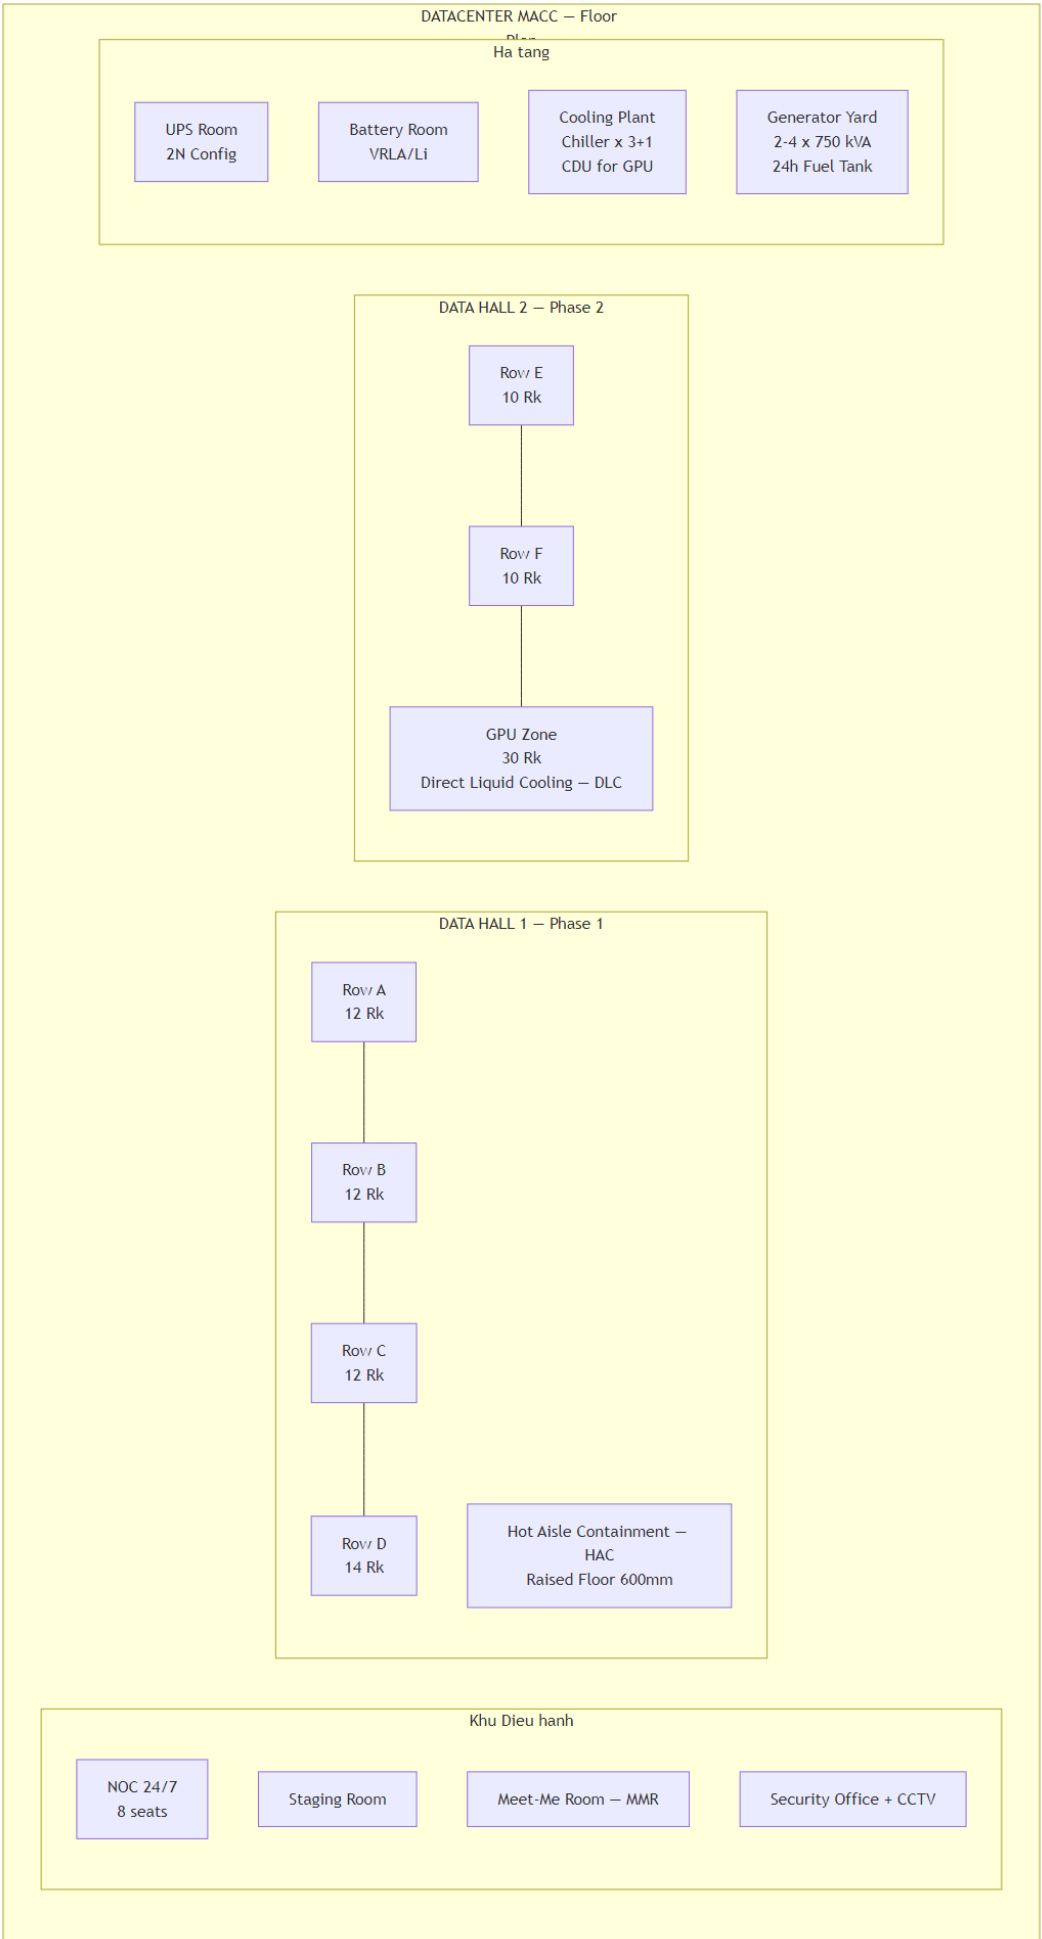




Diagram 58

S.2. Hệ thống Điện DC — Chi tiết

S.2.1. Sơ đồ Cung cấp Điện (Single Line Diagram — Simplified)

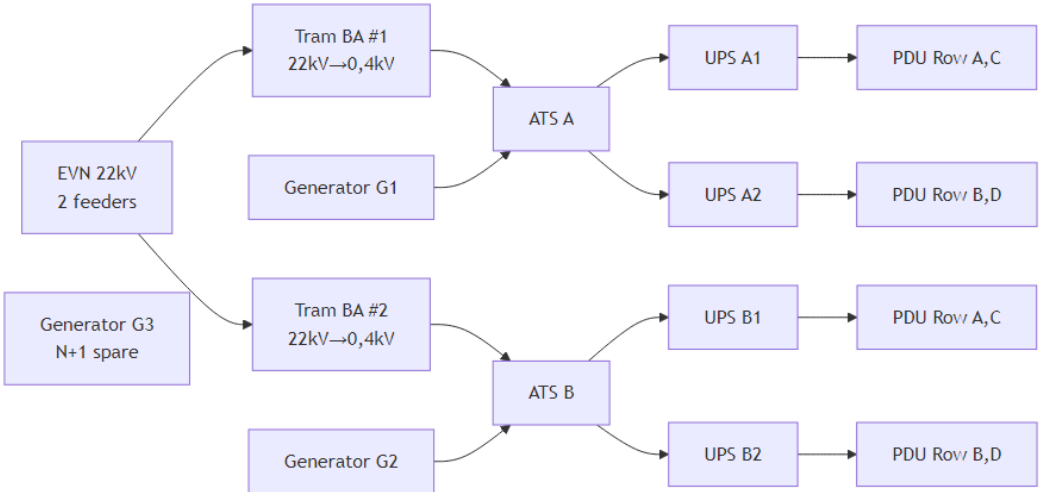


Diagram 59

S.2.2. Thông số UPS

Thông số	Phase 1	Phase 2	Ghi chú
Kiểu	Static VFI (Double Conversion)	Rotary + Static hybrid	Rotary hiệu suất cao hơn
Hãng	Schneider Galaxy VX 500 kVA	Schneider Galaxy VX 1000 kVA	Hoặc Vertiv Liebert EXL
Cấu hình	2N (2 × 300 kVA active)	2N (4 × 600 kVA active)	Mỗi UPS feed 50% load
Battery Runtime	15 phút @ full load	15 phút @ full load	Đủ cho Generator start
Battery Type	VRLA (Phase 1)	Li-ion (Phase 2)	Li-ion: nhẹ hơn, tuổi thọ 10Y
Hiệu suất	96% double conversion	97% eConversion mode	eConversion tiết kiệm 1-2% PUE
Switchover	< 4 ms	< 4 ms	Không ảnh hưởng IT load

S.2.3. Thông số Generator

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Hãng	Cummins / Caterpillar	Tier 2 emission hoặc SCR+DPF (theo EIA)

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Công suất	2 × 500 kVA (Phase 1), thêm 2 × 750 kVA (Phase 2)	N+1
Nhiên liệu	Diesel (B5 biodiesel nếu có)	Bồn 10.000L = 24 giờ @ full load
Start time	< 10 giây	Auto start khi mất điện EVN
SCR + DPF	Có (EIA yêu cầu)	NOx 3.000 → 225 mg/Nm ³ , PM 90% reduction
Acoustic enclosure	75 dB(A) @ 1m → 53 dB(A)	QCVN 26:2010 compliance
Testing	Load bank test hàng tháng (1h), Full load hàng quý (4h)	

S.3. Hệ thống Làm mát DC

S.3.1. Chiến lược Cooling theo Zone

Zone	Phương pháp	Nhiệt độ Target	Humidity	Power Density
Data Hall 1 (Standard)	Row-based CRAC + Hot Aisle Containment	22-27°C (ASHRAE A1)	20-80% RH	4-10 kW/rack
Data Hall 2 (Standard zone)	In-row cooling + HAC	22-27°C	20-80% RH	4-10 kW/rack
GPU Zone (High-Density)	Direct Liquid Cooling (DLC) + Rear Door HX	18-25°C (chip)	N/A (liquid)	20-30 kW/rack

S.3.2. Thiết bị Cooling

Thiết bị	Số lượng	Công suất	Hãng	K USD/unit
Chiller Air-cooled	3+1 (N+1)	250 kW each	Daikin/Trane	80-120
CRAC (Row-based)	8	60 kW each	Schneider InRow	25-35
CDU (Coolant Distribution Unit) cho GPU	3+1	100 kW each	CoolIT / GRC	40-60
Rear Door Heat Exchanger	30	30 kW each	CoolIT	3-5
Free Cooling (dry cooler for T < 20°C)	2	200 kW	Daikin	50-70
Cooling Tower (cho CNC water reuse)	1	200 m ³ /ngày	Evapco	30

S.3.3. PUE Analysis

Component	Power Draw (kW)	% Total
IT Load	1.200	75,9%

Component	Power Draw (kW)	% Total
Cooling (Chiller + CRAC + CDU + Pump)	250	15,8%
UPS Loss (3% of IT)	36	2,3%
Lighting + Misc	20	1,3%
PDU Loss (1%)	12	0,8%
Transformer Loss (1,5%)	18	1,1%
Security + BMS	10	0,6%
Estimated Free Cooling Savings (4 tháng/năm)	-30	-1,9%
Total Facility	1.516	100%
PUE = 1.516 / 1.200		= 1,26

[C] PUE 1,26 (Phase 2 with DLC + Free Cooling) — tốt hơn mục tiêu 1,32. Phase 1 PUE = 1,32 (không có DLC). Benchmark Equinix SG: 1,30. Google SG: 1,12 (nhưng custom build). Mekong MACC đạt top quartile ASEAN.

S.4. SLA (Service Level Agreement)

S.4.1. SLA Framework

Tier	Uptime Target	Max Downtime/năm	Penalty	Áp dụng
Platinum	99,995%	26 phút	10% credit/tháng per 0,01% miss	GPU-aaS, Banking DR
Gold	99,99%	52 phút	5% credit/tháng per 0,01% miss	Enterprise Colocation
Silver	99,95%	4,4 giờ	3% credit/tháng per 0,05% miss	Standard Colocation

S.4.2. SLA Parameters Chi tiết

Thông số	Target	Measurement	Reporting
Uptime (power)	99,99% (Gold)	UPS output monitoring 24/7	Monthly report
Uptime (cooling)	99,99%	Inlet temp monitoring per rack	Monthly report
Uptime (network)	99,95%	BGP/routing monitoring	Monthly report
Incident Response (P1)	< 15 phút	NOC ticket system	Per incident
Incident Response (P2)	< 30 phút	NOC ticket	Per incident
Incident Response (P3)	< 4 giờ	NOC ticket	Per incident
Change Request	< 24 giờ (standard)	Change management system	Per request

Thông số	Target	Measurement	Reporting
Rack Deployment	< 5 ngày làm việc	From PO to rack ready	Per request
Cross-connect	< 3 ngày làm việc	From request to active	Per request
Temperature	22-27°C (±1°C)	Environmental sensor per rack	Real-time dashboard
Humidity	20-80% RH	Environmental sensor	Real-time
Physical Security	5-layer access control	Badge + Biometric + Mantrap + Escort + CCTV	Audit quarterly

S.4.3. Penalty và Credit Calculation

SLA Miss	Credit	Cap
Uptime 99,98-99,99%	5% MRC (Monthly Recurring Charge)	30% MRC/tháng
Uptime 99,95-99,98%	10% MRC	30% MRC
Uptime 99,90-99,95%	20% MRC	30% MRC
Uptime < 99,90%	30% MRC + Customer right to terminate	30% MRC
Temperature out of range > 2 giờ	5% MRC	15% MRC
Incident Response P1 > 30 phút	2% MRC per incident	10% MRC

S.5. Hệ thống Mạng và Kết nối

S.5.1. Kiến trúc Mạng

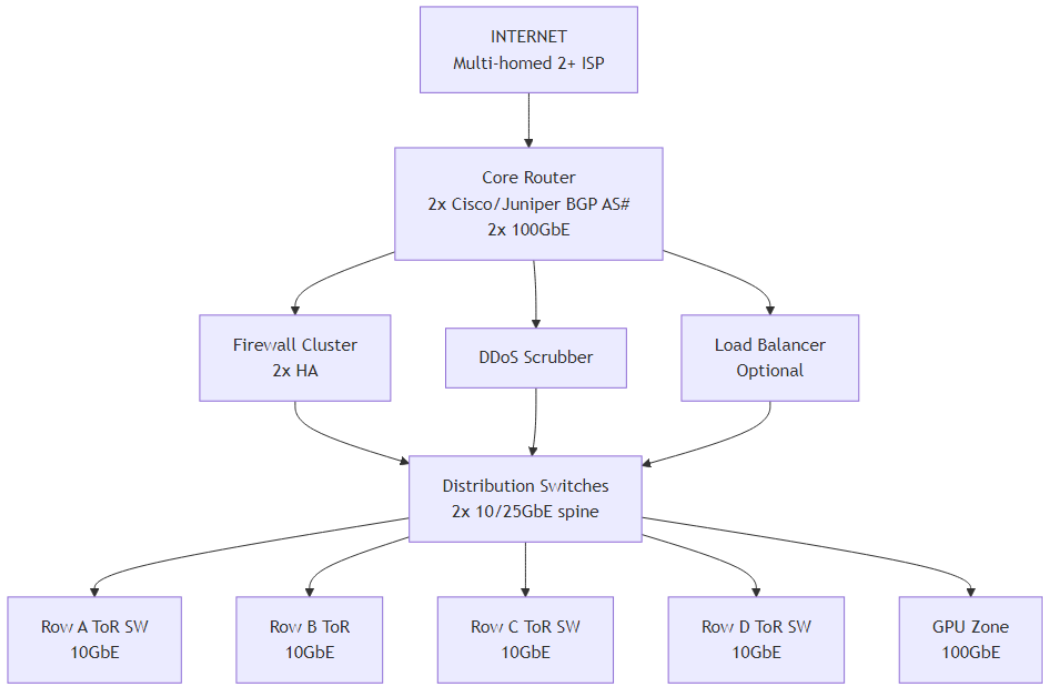


Diagram 60

S.5.2. Thông số Mạng

Thông số	Phase 1	Phase 2	Ghi chú
ISP Upstream	2 × 10 Gbps (FPT + VNPT)	4 × 10 Gbps (+ Viettel + CMC)	Multi-homed BGP
IX Peering	VNIX (10 Gbps)	VNIX (40 Gbps) + HKIX	Content-rich peering
Internal Backbone	2 × 100 GbE	4 × 100 GbE	Spine-Leaf
Access (per rack)	2 × 10 GbE	2 × 25 GbE	Redundant ToR
GPU Fabric	—	400 GbE InfiniBand HDR	RDMA for AI training
Cross-Connect	Fiber MMR, SC/LC	+ Dark Fiber to nearby DC	Low latency < 1ms
IPv4 / IPv6	/22 (1.024 IPs)	/20 (4.096 IPs)	APNIC allocation
DDoS Protection	10 Gbps scrubbing	40 Gbps scrubbing	Cloudflare/Akamai + On-prem
Firewall	20 Gbps throughput	40 Gbps	Palo Alto / Fortinet
DNS / CDN	Basic	Full integration	Optional managed service

S.5.3. Latency Matrix (Estimated)

Destination	Latency (RTT)	Bandwidth	Ghi chú
KCNC HCM (Local)	< 1 ms	10 Gbps direct	Dark fiber
TP.HCM Metro	1-3 ms	Multi-Gbps	IX peering
Hà Nội	15-25 ms	10 Gbps backbone	North-South fiber
Singapore	8-12 ms	10 Gbps	Submarine cable
Hong Kong	25-35 ms	10 Gbps	Via SG or direct
Tokyo	40-60 ms	10 Gbps	Via SG/HK
US West Coast	140-170 ms	Gbps+	Trans-Pacific

[B] Latency to Singapore 8-12 ms — quan trọng cho AI model serving. Nhiều AI workload vẫn được inference tại Singapore. Mekong DC có thể phục vụ inference với latency thấp hơn SG→VN (8ms one-way) cho end user tại VN.

S.6. Vận hành NOC 24/7

S.6.1. Cơ cấu Ca trực NOC

Ca	Thời gian	Nhân sự P1	Nhân sự P2	Chức năng
Ca Sáng	06:00-14:00	3	5	Full operation + Maintenance window

Ca	Thời gian	Nhân sự P1	Nhân sự P2	Chức năng
Ca Chiều	14:00-22:00	3	5	Full operation
Ca Đêm	22:00-06:00	2	3	Monitoring + Emergency response
On-call	24/7	2 (L3 Engineer)	3	Escalation cho sự cố nghiêm trọng
Tổng/ngày		10	16	
Tổng FTE (bao gồm day-off)		15	24	3 ca × 5 ngày + backup

S.6.2. Hệ thống Monitoring

Tool	Chức năng	Vendor	License (K USD/năm)
DCIM	PUE, Power, Cooling, Capacity	Schneider EcoStruxure IT	15-25
NMS (Network Monitoring)	BGP, bandwidth, latency, packet loss	PRTG / Zabbix Enterprise	5-10
SIEM	Security log correlation, threat detection	Splunk Enterprise / ELK	20-40
Ticketing	Incident, Change, Problem management	ServiceNow / Freshservice	5-15
IPAM	IP address management, DNS, DHCP	Infoblox / NetBox	3-8
Environmental	Temperature, Humidity, Water leak, Smoke	Schneider NetBotz	5-10
CCTV + Access	100+ cameras, badge log, mantrap	Hikvision + HID	3-5

S.6.3. Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOPs)

SOP #	Tên	Tần suất	Owner	Review Cycle
SOP-DC-001	Power failure response	On event	NOC Lead	6 tháng
SOP-DC-002	Cooling failure response	On event	Facility Engineer	6 tháng
SOP-DC-003	Generator start/stop	Monthly test + On event	Facility Engineer	12 tháng
SOP-DC-004	UPS maintenance	Quarterly	Vendor + Facility	12 tháng
SOP-DC-005	Rack deployment (new customer)	On request	NOC + Sales	6 tháng
SOP-DC-006	Cross-connect installation	On request	NOC	12 tháng
SOP-DC-007	Customer escort & access	On request	Security	6 tháng

SOP #	Tên	Tần suất	Owner	Review Cycle
SOP-DC-008	Fire alarm response	On event + Drill 2×/năm	All NOC staff	6 tháng
SOP-DC-009	Planned maintenance (window)	Scheduled	NOC Lead	6 tháng
SOP-DC-010	Security incident response	On event	Security + NOC	6 tháng
SOP-DC-011	DDoS mitigation	On event	NOC Network	6 tháng
SOP-DC-012	Disaster Recovery activation	On event	DC Director	12 tháng

S.7. Mô hình Kinh doanh DC — Dự phóng 10 Năm

S.7.1. Kịch bản Lắp đầy (Fill Rate)

Năm	Colocation (Rack)	GPU-aaS (Rack)	Managed (Rack)	Tổng Rack Dùng	% Fill Rate
1	15	5	5	25	50% (of 50)
2	25	10	8	43	86% (of 50)
3	35	20	10	65	65% (of 100)
4	40	25	12	77	77%
5	40	30	15	85	85%
6	40	32	16	88	88%
7	40	35	17	92	92%
8	40	35	18	93	93%
9	40	35	18	93	93%
10	40	35	18	93	93%

S.7.2. Revenue DC theo Năm

Năm	Colo Revenue (K USD)	GPU Revenue (K USD)	Managed Rev (K USD)	Cross + VAS (K USD)	Tổng DC (K USD)
1	270	360	300	50	980
2	450	720	480	100	1.750
3	630	1.440	600	180	2.850
4	720	1.800	720	220	3.460
5	720	2.160	900	280	4.060
6	720	2.300	960	310	4.290
7	720	2.520	1.020	340	4.600

Năm	Colo Revenue (K USD)	GPU Revenue (K USD)	Managed Rev (K USD)	Cross + VAS (K USD)	Tổng DC (K USD)
8	720	2.520	1.080	360	4.680
9	720	2.520	1.080	370	4.690
10	720	2.520	1.080	380	4.700
Tổng 10Y	6.390	18.860	8.220	2.590	~36.060

S.7.3. P&L DC — Tóm tắt

Năm	Revenue (K)	COGS (K)	Gross Margin	OPEX (K)	EBITDA (K)	EBITDA %
1	980	588	40%	350	42	4,3%
2	1.750	963	45%	420	367	21,0%
3	2.850	1.425	50%	520	905	31,7%
4	3.460	1.660	52%	580	1.220	35,3%
5	4.060	1.905	53%	640	1.515	37,3%
7	4.600	2.070	55%	720	1.810	39,3%
10	4.700	2.068	56%	780	1.852	39,4%

[C] DC EBITDA margin hướng tới ~39% ở steady-state (Y7-Y10). GPU-aaS là key driver: chiếm 53% revenue nhưng >60% gross profit nhờ utilization > 80% và giá premium. Breakeven DC tại Y1 Q4 (EBITDA > 0).

S.7.4. CAPEX DC Chi tiết

Hạng mục	Phase 1 (K USD)	Phase 2 (K USD)	Tổng (K USD)
Civil Work (Data Hall + Support)	400	500	900
Raised Floor + Containment	100	120	220
UPS (2N × 300→1200 kVA)	350	500	850
Battery (VRLA + Li-ion)	100	200	300
Generator (2 + 2 units)	200	300	500
Chiller + CRAC + CDU	400	600	1.000
PDU + Busway	150	200	350
Rack + Cable Tray + Cabling	200	200	400
Fire Suppression (FM200 + Sprinkler)	100	100	200
BMS + DCIM + Environmental Sensors	100	80	180
Network Equipment (Router, Switch, FW)	200	250	450
CCTV + Access Control + Mantrap	50	30	80
GPU Hardware (NVIDIA A100/H100 × 240)	—	1.500	1.500

Hạng mục	Phase 1 (K USD)	Phase 2 (K USD)	Tổng (K USD)
Commissioning + Testing	50	70	120
Contingency 10%	240	465	705
Tổng	2.640	5.115	~7.755

[C] CAPEX DC = 7.755K → Cost per Rack = ~77,5K USD/rack. Benchmark: Equinix Cost/rack SG = 100-150K. Mekong cost thấp hơn 30-50% nhờ: (a) Giá xây dựng VN, (b) M&E nhập khẩu giá tốt, (c) Diện tích nhỏ hiệu quả.

S.8. Chứng nhận và Compliance DC

S.8.1. Lộ trình Chứng nhận DC

Chứng nhận	Timeline	Chi phí (K USD)	Ý nghĩa
Uptime Tier III Design	Trước xây dựng (Q1/2026)	30-50	Xác nhận thiết kế đạt Tier III
Uptime Tier III Facility	Sau xây dựng (Q3/2027)	40-60	Xác nhận xây dựng đạt Tier III
Uptime Tier III Operations	6 tháng sau vận hành (Q2/2028)	30-50	Gold standard — ít DC VN đạt
ISO 27001	Q2/2028	15-25	ISMS — bắt buộc cho Banking KH
PCI DSS	Q4/2028	20-40	Payment Card — cho Fintech KH
SOC 2 Type II	Q4/2028	15-25	Cho KH Mỹ / International
ISO 22301	Q2/2029	10-15	Business Continuity

S.8.2. Compliance Requirements

Quy định	Cơ quan	Áp dụng	Status
Luật An ninh mạng 2018	Bộ Công an	Lưu trữ dữ liệu tại VN	Comply (on-shore DC)
Nghị định 13/2023	Chính phủ	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Comply
QCVN 12:2020/BCA	Bộ Công an	Tiêu chuẩn an toàn DC	Comply
TCVN 13606:2023	Tiêu chuẩn VN	Trung tâm dữ liệu — Tier	Reference
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT	Bộ TT&TT	Giấy phép viễn thông	Cần xin GP

(Kết thúc Phụ lục S — Vận hành Datacenter MACC)

PHỤ LỤC T: SẢN PHẨM IOT/ROBOT — THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

T.1. Tổng quan Danh mục Sản phẩm IoT/Robot

T.1.1. Product Portfolio Matrix

#	Sản phẩm	Loại	Category	TRL	Target Market	Revenue Y5 (K USD)
1	MK-200 IoT Gateway	Phần cứng	Edge Device	7	DNNVV, nhà máy nhỏ	1.200
2	MK-300 IoT Gateway	Phần cứng	Edge Device	6	Enterprise, FDI	1.800
3	MK-500 Edge AI Gateway	Phần cứng	AI Edge	5	AI/ML deployment site	600
4	Robot AMR-100 (1T)	Robot	Mobile Robot	5	Kho vận, logistics	1.500
5	Robot AGV-200 (2T)	Robot	Mobile Robot	4	Sản xuất nặng, ô tô	800
6	Robot OHT-500	Robot	Overhead Transport	3	Semiconductor fab	500
7	MekongOS Basic	Phần mềm	IoT Platform	6	DNNVV	400
8	MekongOS Pro	Phần mềm	IoT Platform	5	Enterprise	1.200
9	MekongOS Enterprise	Phần mềm	IoT Platform	4	Large Enterprise	800
10	MK-Sense Sensor Hub	Phần cứng	Sensor Node	7	Chung với Gateway	350
	Tổng IoT/Robot Revenue Y5					~9.150

[A] TRL = Technology Readiness Level (1-9). MK-200 và MK-Sense gần production ready (TRL 7). Robot OHT-500 ở giai đoạn prototype (TRL 3) — cần 2-3 năm R&D thêm.

T.2. MK-200 IoT Gateway — Thông số Kỹ thuật

T.2.1. Block Diagram

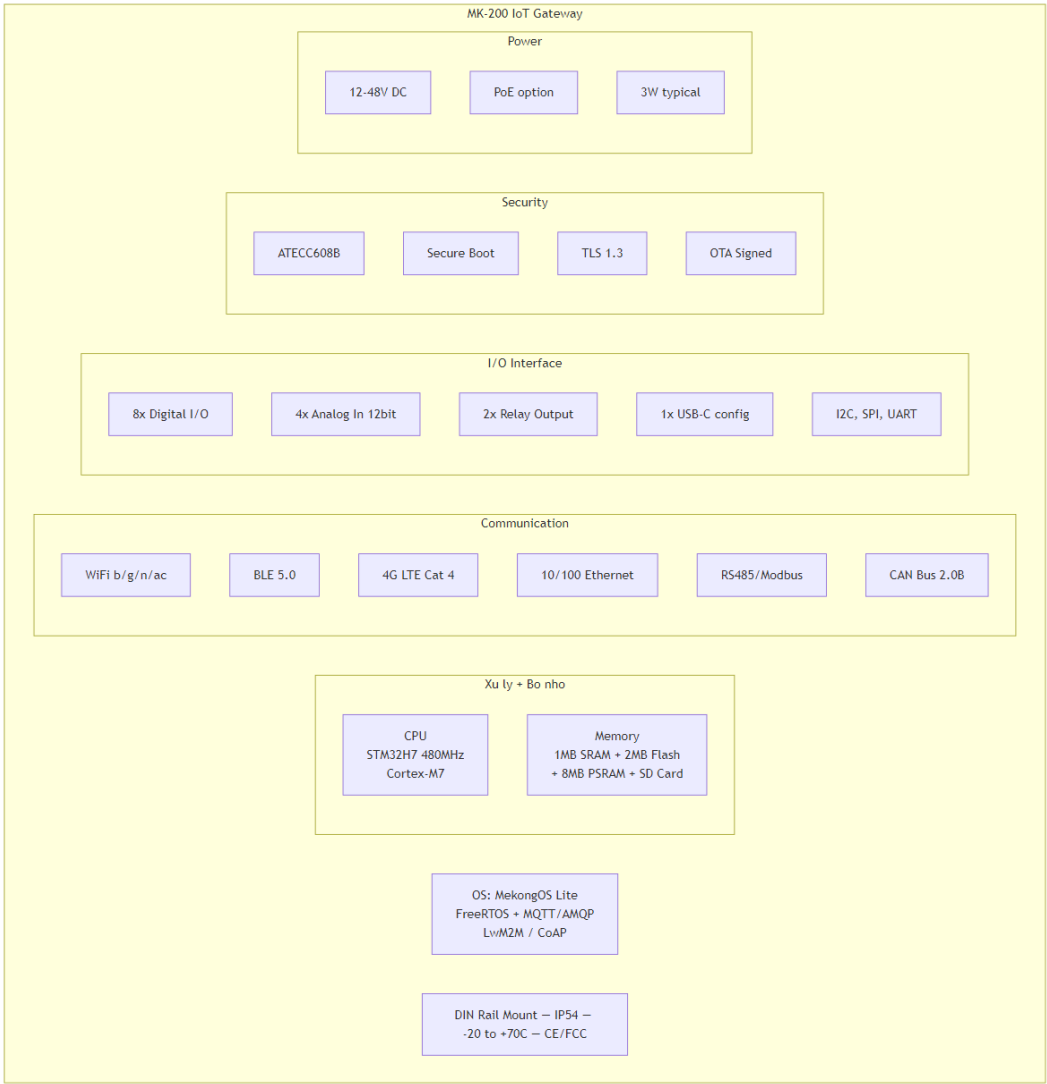


Diagram 61

T.2.2. Specification Table

Thông số	MK-200	Ghi chú
Processor	STM32H743 (ARM Cortex-M7, 480 MHz)	Dual-core option: M7 + M4
Memory	1 MB SRAM, 2 MB Flash, 8 MB PSRAM	Đủ cho edge AI nhỏ
Storage	MicroSD up to 32 GB	Data logging local
WiFi	802.11 b/g/n/ac (2,4+5 GHz)	ESP32-S3 co-processor
Bluetooth	BLE 5.0 (Long Range)	Sensor mesh
Cellular	Quectel EG25-G (4G LTE Cat 4)	Optional module
Ethernet	10/100 Mbps, RJ45	Industrial connector option
Serial	RS485 × 2 (Modbus RTU/TCP)	Kết nối PLC, meter

Thông số	MK-200	Ghi chú
CAN Bus	CAN 2.0B × 1 (J1939 support)	Kết nối máy CNC, vehicle
Digital I/O	8 × DI/DO (24V sink/source)	Opto-isolated
Analog Input	4 × 0-10V / 4-20mA (12-bit ADC)	±0,1% accuracy
Relay	2 × NO/NC (5A @ 250VAC)	Actuator control
USB	USB-C (configuration + debug)	
Power	12-48V DC (wide range), PoE 802.3af (option)	3W typical, 5W max
Operating Temp	-20°C to +70°C	Industrial grade
Humidity	5-95% RH (non-condensing)	
Ingress Protection	IP54 (standard), IP67 (sealed option)	
Enclosure	Aluminium die-cast, DIN rail mount	120 × 80 × 40 mm
Certifications	CE, FCC Part 15, RoHS, KCNC Vietnam	
Security	ATECC608B (HW crypto), Secure Boot, TLS 1.3	Zero-trust edge
OTA	Signed firmware update over MQTT/HTTPS	A/B partition
Protocol	MQTT 3.1.1/5.0, AMQP, CoAP, LwM2M, Modbus TCP	
SDK	MekongOS SDK (C/C++, Python micro-binding)	GitHub Open Source
Warranty	2 năm (standard), 3 năm (extended)	

T.2.3. BOM Cost Breakdown

Component	Supplier	Unit Cost (USD)		Qty	Total (USD)
STM32H743 MCU	ST Microelectronics	12,50		1	12,50
ESP32-S3-WROOM (WiFi+BLE)	Espressif	3,50		1	3,50
Quectel EG25-G (4G)	Quectel	18,00		1	18,00
PSRAM 8MB	ISSI	2,00		1	2,00
ATECC608B (Crypto)	Microchip	0,80		1	0,80
Ethernet PHY (DP83848)	TI	1,50		1	1,50
RS485 Transceiver (×2)	Maxim	0,60		2	1,20
CAN Transceiver (SN65HVD230)	TI	0,80		1	0,80

Component	Supplier	Unit Cost (USD)		Qty	Total (USD)
Power Supply Module (DC-DC)	MPS (MP2359)	1,20		1	1,20
PoE Controller (optional)	TI TPS2378	2,50		1	2,50
ADC External (ADS1115)	TI	2,00		1	2,00
Relay (×2)	Omron G6K	1,50		2	3,00
Opto-isolator (×8)	Vishay	0,30		8	2,40
PCB (4-layer, 80×100mm)	Nội bộ SMT	5,00		1	5,00
Enclosure (Al die-cast)	Nhà cung cấp VN	8,00		1	8,00
Antenna (×3: WiFi, BLE, 4G)	Taoglas	2,50		3	7,50
Connectors (DIN, RJ45, USB-C)	Phoenix Contact / TE	5,00		lot	5,00
MicroSD slot + misc components	Various	3,00		lot	3,00
Packaging + Label + QR code	Nội bộ	2,00		1	2,00
BOM Total					~82 USD
Assembly (SMT + Manual)	Nội bộ (Khối C)	15,00		1	15,00
Testing (ICT + Functional + Burn-in)	Nội bộ QA	8,00		1	8,00
Landed COGS					~105 USD

[C] BOM = 82 USD, Landed COGS = 105 USD. ASP = 350-450 USD → Gross Margin = 70-77%.
Margin rất cao nhờ: (a) Sản xuất tại Khối C (SMT nội bộ), (b) Giá trị gia tăng từ phần mềm MekongOS, (c) Chi phí lao động VN thấp.

T.3. MK-300 IoT Gateway (Nâng cao) — Thông số Kỹ thuật

T.3.1. So sánh MK-200 vs MK-300

Thông số	MK-200	MK-300	Ghi chú
Processor	STM32H7 (480 MHz)	NXP i.MX 8M Plus (Quad A53 + NPU 2.3 TOPS)	Linux-based, AI capable
Memory	1 MB SRAM + 8 MB PSRAM	2 GB DDR4 + 16 GB eMMC	Full Linux + Docker

Thông số	MK-200	MK-300	Ghi chú
AI Accelerator	Không	NPU 2.3 TOPS + Ethos-U65 option	Edge inference
Camera	Không	MIPI CSI-2 input (up to 4K)	Machine Vision
WiFi	b/g/n/ac	WiFi 6 (802.11ax)	Higher throughput
Cellular	4G LTE Cat 4	5G Sub-6 (Quectel RM520N)	Ultra-low latency
Ethernet	10/100	2 × Gigabit Ethernet (TSN capable)	Time-Sensitive Networking
USB	USB-C	USB 3.0 + USB-C	Camera/Sensor attach
GPU	Không	Vivante GC7000 (OpenCL 1.2)	Video decode/encode
OS	MekongOS Lite (FreeRTOS)	MekongOS Full (Yocto Linux + Docker)	Container support
Size	120×80×40 mm	160×100×50 mm	Lớn hơn 30%
Power	3-5W	8-15W	Cần nguồn lớn hơn
ASP	350-450 USD	650-850 USD	2× price, 3× capability
BOM	82 USD	180-220 USD	i.MX 8M + DDR4 + 5G
Gross Margin	70-77%	65-72%	Vẫn rất tốt

T.3.2. Use Case Matrix

Use Case	MK-200	MK-300	Ghi chú
Giám sát nhiệt độ/ độ ẩm	✓	✓	MK-200 đủ, chi phí thấp
Modbus RTU/TCP gateway	✓	✓	MK-200 ưu tiên cho PLC legacy
Giám sát năng lượng (kWh)	✓	✓	MK-200 cho meter đơn giản
Machine condition monitoring	✓	✓	MK-300 thêm vibration AI
Predictive maintenance (AI)	✗	✓	Cần NPU cho edge inference
Machine Vision (QC inspection)	✗	✓	Camera + AI
OPC-UA gateway (Industry 4.0)	✗	✓	Cần Linux + processing power
Digital Twin data feed	✓ (basic)	✓ (full)	MK-300 cho high-fidelity twin
TSN (Time-Sensitive Network)	✗	✓	Deterministic network

Use Case	MK-200	MK-300	Ghi chú
Video Analytics (object detect)	✗	✓	YOLO/SSD on edge
Cell controller (robot + CNC)	✗	✓	Orchestrate multiple machines

T.4. Robot AMR-100 (1 Tấn) — Thông số Kỹ thuật

T.4.1. Specification Sheet

Thông số	AMR-100	Ghi chú
Payload	1.000 kg (max 1.200 kg short-term)	Pallet, rack, tote
Self Weight	280 kg	Chassis + Battery
Speed	0-2,0 m/s (loaded), 0-2,5 m/s (unloaded)	Adjustable per zone
Navigation	SLAM (LiDAR + Vision fusion) + QR Code fallback	MekongOS Navigation
LiDAR	Sick TiM781 (2D, 270°, 25m range) × 2	Front + Rear
Camera	Intel RealSense D435i (Depth) × 2	Front + Rear, 3D obstacle
IMU	Bosch BMI088 (6-DOF)	Dead reckoning backup
Compute	NVIDIA Jetson Orin Nano (40 TOPS)	SLAM + Obstacle avoidance
Battery	LiFePO4, 48V 60Ah (2,88 kWh)	Cycle life 3.000+
Runtime	8-12 giờ (tùy tải + path)	1 charge = 1 ca
Charging	Auto-dock, 1,5 giờ (0→80%)	Opportunity charging
Charging Station	48V 30A charger, auto alignment	Magnetic + Vision guided
Drive	Differential drive (2 × BLDC 750W)	Independent wheel control
Caster	4 × Polyurethane (load-bearing)	
Turning Radius	0 (spin in place)	Omni-directional capable
Min Aisle Width	1,5 m (loaded)	Standard factory aisle OK
Safety	ISO 3691-4:2023, Cat 3 PL d	Safety LiDAR zones
E-Stop	2 × Physical E-stop + Software E-stop	
Safety Zones	Warning (2m), Slow-down (1,5m), Stop (0,8m)	Configurable
Communication	WiFi 5 + BLE 5.0 + 5G option	Fleet management
Fleet Manager	MekongOS Fleet (up to 100 robots)	Traffic control, task scheduling
I/O	4 × DI, 4 × DO, RS485, CAN	Interface với conveyor, lift
Load Interface	Top-lift (50mm stroke) / Conveyor top / Custom	Modular top unit
Operating Temp	0-40°C	Indoor use

Thông số	AMR-100	Ghi chú
Ingress Protection	IP43	Indoor factory
Dimensions	1.000 × 700 × 350 mm (LWH without payload)	
Certifications	CE, ISO 3691-4, SEMI S2 (semiconductor option)	

T.4.2. BOM Cost & Pricing

Module	Components	Cost (USD)	% COGS
Chassis + Frame	Steel welded + machined parts	1.500	9,4%
Drive System	2 × BLDC 750W + Drivers + Casters	2.500	15,6%
Battery Pack	LiFePO4 48V 60Ah + BMS	2.800	17,5%
Navigation Sensors	2 × LiDAR + 2 × RealSense + IMU	3.200	20,0%
Compute	Jetson Orin Nano + IO board + Cables	800	5,0%
Safety System	Safety LiDAR (Sick microScan3) + E-stop + PLC_s	1.200	7,5%
Communication	WiFi module + antenna + 5G option	200	1,3%
Top Module	Lift mechanism + controller	800	5,0%
Wiring + Connectors	Internal cable harness	300	1,9%
Enclosure + Cover	Sheet metal + painting	500	3,1%
Assembly Labor	40 giờ × 15 USD/h	600	3,8%
Testing + Commissioning	16 giờ QA + Software config	300	1,9%
Software License	MekongOS embedded (internal)	0	0%
Packaging + Shipping	Crate + foam	300	1,9%
Warranty Reserve	3% of ASP	900	5,6%
Overheads	Factory allocation	100	0,6%
COGS Total		~16.000	100%
ASP		30.000	
Gross Margin		14.000 (46,7%)	

T.4.3. So sánh Cạnh tranh Robot AMR

Thông số	Mekong AMR-100	MiR250 (Đan Mạch)	Geek+ M1000 (TQ)	HAI Robotics ACR (TQ)
Payload	1.000 kg	250 kg	1.000 kg	1.000 kg
Price	25.000-35.000	35.000-50.000	30.000-45.000	40.000-60.000
Navigation	SLAM + Vision	SLAM	QR Code + SLAM	SLAM + Vision
Speed	2,0 m/s	2,0 m/s	2,0 m/s	1,5 m/s
Safety	ISO 3691-4	ISO 3691-4	CE	CE
Fleet Software	MekongOS Fleet	MiR Fleet	Geek+ RMS	HAI HAIQ
Made in	Vietnam	Denmark	China	China
Lợi thế Mekong	Giá thấp nhất, MekongOS tích hợp IoT+DC+CNC, hỗ trợ tại chỗ KCNC	Brand mạnh	Giá cạnh tranh	Tính năng nâng cao

T.5. MekongOS Platform — Kiến trúc Kỹ thuật

T.5.1. Architecture Overview

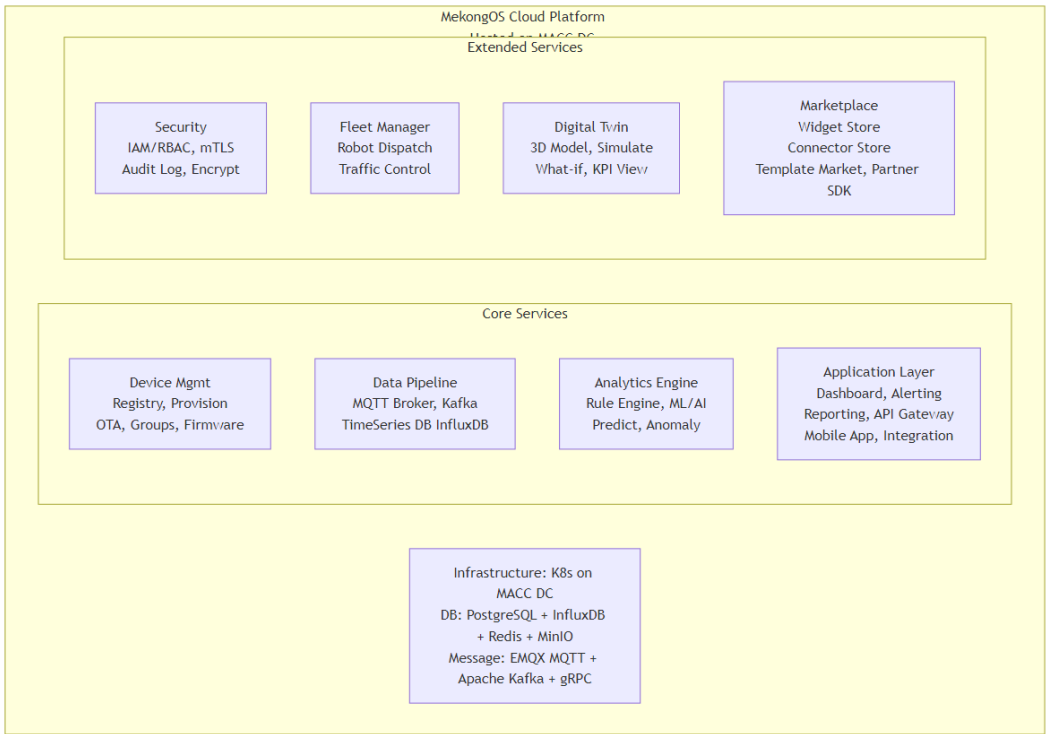


Diagram 62

T.5.2. Pricing Tiers

Feature	Basic (29 USD/th)	Pro (79 USD/th)	Enterprise (199 USD/th)
Devices per account	10	100	Unlimited
MQTT messages/day	10K	100K	Unlimited
Data retention	30 ngày	12 tháng	36 tháng + Custom
Dashboard	3	20	Unlimited + Custom
Alerting rules	5	50	Unlimited
User accounts	2	10	Unlimited + SSO
API access	Basic	Full REST + GraphQL	Full + gRPC
Rule Engine	Basic (if-then)	Advanced (CEP)	Custom (Python/JS)
ML/AI	—	Pre-built models	Custom model deploy
Digital Twin	—	2D visualization	Full 3D + Simulation
Fleet Manager	—	—	Robot fleet (up to 100)
Support	Email (48h)	Email (8h) + Chat	Dedicated CSM + Phone
SLA Uptime	99,5%	99,9%	99,95%
On-premise option	—	—	✅ (additional fee)
White-label	—	—	✅ (additional fee)

T.5.3. Lộ trình Phát triển MekongOS

Version	Timeline	Tính năng chính	Effort (man-months)
v0.1 (Alpha)	Q1/2027	Device registry, MQTT, Basic dashboard	12
v0.5 (Beta)	Q3/2027	Rule engine, Alerting, API, Multi-tenant	8
v1.0 (GA)	Q4/2027	Full Basic + Pro features, Mobile app	6
v1.5	Q2/2028	Fleet Manager (Robot), Digital Twin 2D	10
v2.0	Q4/2028	AI/ML pipeline, Anomaly detection	12
v2.5	Q2/2029	Digital Twin 3D, Marketplace launch	10
v3.0	Q4/2029	Enterprise: On-prem, White-label, SSO	8
Tổng R&D	3 năm		~66 man-months
Chi phí R&D MekongOS			~660 K USD

[C] MekongOS R&D = 660K USD (10% of total R&D 12.5M/10Y). Revenue MekongOS Y5 target: 2.400 K USD/năm → Payback MekongOS R&D = ~3,3 tháng Y5 revenue. ROI rất cao cho SaaS platform.

T.6. Chiến lược Sở hữu Trí tuệ (IP Strategy)

T.6.1. Danh mục IP Dự kiến

#	Loại IP	Tên	Timeline nộp	Status
1	Patent (VN)	IoT Gateway with Modular Comm Architecture	Y1 Q4	Dự kiến
2	Patent (VN)	SLAM Navigation with LiDAR-Vision Fusion for AMR	Y2 Q2	Dự kiến
3	Patent (VN)	AI-based Predictive Maintenance on Edge Device	Y2 Q4	Dự kiến
4	Patent (VN)	Dynamic Traffic Management for Multi-Robot Fleet	Y3 Q2	Dự kiến
5	Patent (PCT)	Edge AI Inference Optimization for Low-Power MCU	Y3	Dự kiến
6	Nhãn hiệu	MekongOS	Y1 Q1	Đã nộp
7	Nhãn hiệu	Mekong Technology	Đã có	Đã đăng ký
8	Bản quyền PM	MekongOS Source Code	Y1	Tự động
9	Bí mật KD	CNC Process Parameters (Ti/Inconel)	Ongoing	NDA policy
10	Thiết kế CN	MK-200/300 Industrial Design	Y1 Q3	Dự kiến

T.6.2. Ngân sách IP

Loại	Số lượng (10 năm)	Chi phí/đơn (K USD)	Tổng (K USD)
Patent VN	15-20	3-5	60-100
Patent PCT (International)	5-8	15-25	100-200
Nhãn hiệu VN	5	1-2	5-10
Nhãn hiệu ASEAN (Madrid)	3	5-8	15-24
Thiết kế Công nghiệp	5	1-2	5-10

Loại	Số lượng (10 năm)	Chi phí/đơn (K USD)	Tổng (K USD)
Tổng IP Budget (10Y)			~200-350 K USD

[C] IP Budget = 200-350K = 2,7-4,7% of R&D 12.5M. Benchmark: Tech startup VN thường chỉ 1-3% R&D cho IP. Mekong nên ở mức cao hơn vì cần IP để bảo vệ competitive moat (đặc biệt SLAM và MekongOS).

(Kết thúc Phụ lục T — Sản phẩm IoT/Robot Chi tiết)

PHỤ LỤC U: PHÂN TÍCH RỦI RO TỔNG HỢP VÀ ĐỘ NHẠY

U.1. Khung Phân tích Rủi ro (Risk Framework)

U.1.1. Phương pháp luận

Mekong Technology áp dụng phương pháp **Enterprise Risk Management (ERM)** theo khung COSO 2017, kết hợp phân tích định lượng Monte Carlo (10.000 lần mô phỏng). Rủi ro được phân loại theo 6 nhóm:

Nhóm	Mô tả	Số rủi ro	Mức độ ưu tiên
A. Thị trường	Cầu, giá, cạnh tranh, macro	8	Cao
B. Vận hành	Sản xuất, chất lượng, supply chain	10	Rất cao
C. Tài chính	Dòng tiền, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản	6	Cao
D. Pháp lý & Tuân thủ	Giấy phép, thuế, ĐTM, PCCC	5	Trung bình-Cao
E. Công nghệ	Obsolescence, IP, cyber, R&D failure	6	Trung bình
F. Nhân sự	Tuyển dụng, giữ chân, đào tạo, key-man	5	Cao
	Tổng	40	

U.1.2. Ma trận Rủi ro (Risk Heat Map)

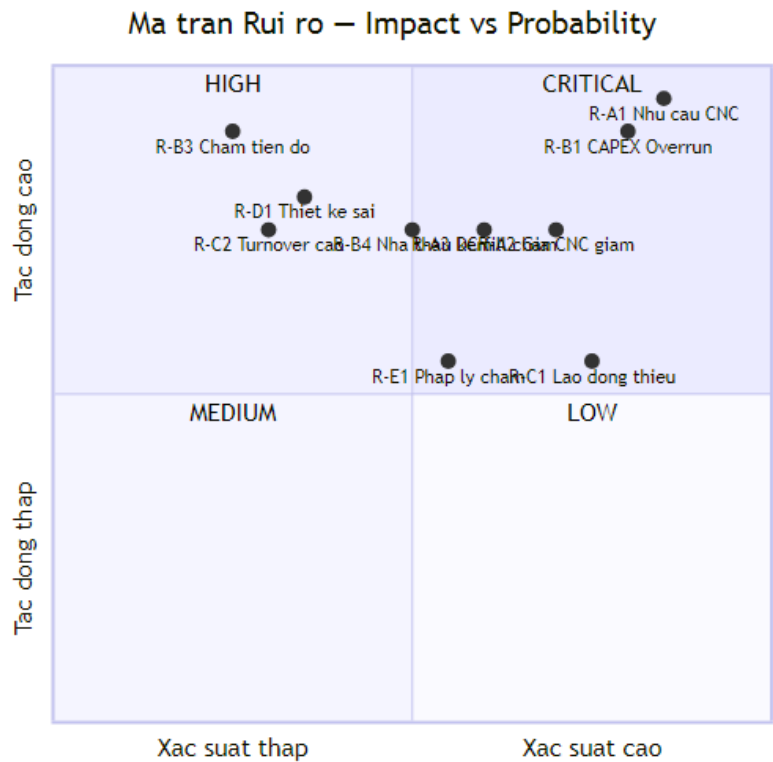


Diagram 63

U.2. Rủi ro Thị trường (Market Risk)

U.2.1. Bảng Rủi ro Thị trường Chi tiết

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Risk Score	Biện pháp	Residual Risk
R-A1	Nhu cầu CNC thấp hơn dự kiến — FDI rời VN hoặc reshoring	4	5	20	Đa dạng KH (không >20% revenue từ 1 KH), phát triển KH nội địa, ngành đa dạng (Auto + Aero + Elec)	12
R-A2	Giá CNC outsourcing giảm — Cạnh tranh từ Thái Lan/Indonesia	3	4	12	Nâng cấp AS9100 (premium pricing), đầu tư 5 trục chuyên biệt (Ti/Inconel = ít cạnh tranh)	6

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Risk Score	Biện pháp	Residual Risk
R-A3	DC fill rate chậm hơn dự kiến — DC oversupply tại VN	3	4	12	GPU-aaS differentiation (không nhiều DC cung cấp), giá thấp hơn SG 50%, anchor tenant trước build	6
R-A4	IoT Gateway bị cạnh tranh giá — Trung Quốc dumping	4	3	12	Tích hợp MekongOS (vendor lock-in tích cực), dịch vụ hậu mãi tại chỗ, customize cho VN market	8
R-A5	Tỷ giá USD/VND biến động >10% — Ảnh hưởng CAPEX import	2	4	8	Hedging (forward contract cho PO CNC lớn), natural hedge (revenue = USD)	4
R-A6	Suy thoái kinh tế Việt Nam — GDP < 5%	2	4	8	Conservative base case đã tính GDP 6,5%, stress test GDP 4% → NPV vẫn > 0	4
R-A7	Thay đổi ưu đãi thuế KCNC — CIT tăng từ 10%	1	4	4	Luật CNC 2008 ổn định, ưu đãi lock 15 năm từ ngày cấp IRC	2
R-A8	FDI semiconductor rời VN — Geopolitical shift	2	5	10	Đa dạng ngành (Auto + Medical + Energy cho CNC), không phụ thuộc 1 ngành	4

U.2.2. Phân tích Kịch bản Thị trường

V2.1 NOTE: Cập nhật theo mô hình V2.1 (50Y, Revenue 15Y, doanh thu đầu tiên Y6).

Kịch bản	Xác suất	Revenue 15Y (M USD)	NPV 50Y (M USD)	IRR 50Y	Ghi chú
Optimistic	20%	220+	18,2+	17,5%+	FDI tăng mạnh, DC boom, AS9100 sớm
Base Case	50%	~165	1,50	13,0%	Kịch bản chính
Conservative	25%	115-130	(3) đến (7)	10-11%	CNC ramp-up chậm, DC fill thấp
Pessimistic	5%	80-100	(12) đến (18)	7-9%	Suy thoái + FDI giảm + DC oversupply
Weighted	100%	~160	~3,7	~13%	Consistent với Phần V

U.3. Rủi ro Vận hành (Operational Risk)

U.3.1. Bảng Rủi ro Vận hành Chi tiết

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Score	Biện pháp	Cost (K USD)
R-B1	Chậm trễ lắp đặt CNC >6 tháng — Lead time DMG MORI vượt dự kiến	4	5	20	PO sớm Q4/2025 với deposit 30%, buffer 3 tháng trong schedule, phương án máy thay thế (Okuma/Mazak)	50
R-B2	Chất lượng CNC không đạt FPI trong 6 tháng đầu — Yield < 80%	3	4	12	Thuê 2 CNC Expert Nhật/Đức 2 năm (đã tính trong HR), Test cut protocol nghiêm ngặt, NPI (New Product Introduction) process	160
R-B3	Sự cố cháy/nổ nhà xưởng CNC — Titan dust, MWF leak	2	5	10	PCCC class, HEPA H13 cho Ti dust, MWF fire-resistant, FM200 cho CNC area, bảo hiểm 100% rebuild	200

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Score	Biện pháp	Cost (K USD)
R-B4	DC downtime > 24h — UPS/Generator cùng fail	2	5	10	2N design, monthly generator test, battery monitoring, Tier III certified, bảo hiểm SLA	100
R-B5	Supply chain gián đoạn — Chip shortage, nguyên vật liệu thiếu	3	3	9	Safety stock 3 tháng cho critical components, dual-source policy, VMI agreement với supplier	30
R-B6	OEE CNC thấp < 50% kéo dài — Setup time cao, tool life kém	3	3	9	TPM program, tool life database, quick changeover (SMED) training, OEE tracking real-time (MekongOS)	20
R-B7	Robot AMR reliability issue — MTBF < 2.000h	3	3	9	Rigorous test protocol (1.000h burn-in), modular design cho quick replacement, spare parts buffer	15
R-B8	Data breach / Ransomware tại DC	2	5	10	SOC 24/7, ISO 27001, penetration test quarterly, air-gap backup, cyber insurance	80
R-B9	Rung động CNC ảnh hưởng DC (đã identify trong EIA)	4	4	16	Isolation foundation 520K (đã tính CAPEX), buffer zone 15m, vibration monitoring 24/7	520
R-B10	Nước cấp thiếu (vượt quota KCNC)	3	4	12	Hybrid cooling (dry cooler + adiabatic), ZLD CNC tái sử dụng, thu nước mưa, bể dự trữ 3 ngày	120

U.3.2. Expected Loss Calculation

Risk ID	Probability	Loss if Occurs (K USD)	Expected Loss (K USD/năm)
R-B1	20% p.a.	500 (delay cost)	100
R-B2	15%	300 (rework + missed revenue)	45
R-B3	1%	5.000 (rebuild)	50
R-B4	2%	1.000 (SLA penalty + reputation)	20
R-B5	10%	200 (production halt)	20
R-B6	15%	400 (lost revenue)	60
R-B7	10%	150 (warranty cost)	15
R-B8	3%	2.000 (breach cost)	60
R-B9	5% (post-mitigation)	300	15
R-B10	8%	200 (water trucking)	16
Tổng Expected Loss			~401 K USD/năm

[C] Expected Loss từ rủi ro vận hành = ~401 K/năm ≈ 1,8% Revenue Y5. Mức chấp nhận được cho dự án công nghệ sản xuất. Insurance premium dự kiến: 80-120 K/năm để cover top 5 risks.

U.4. Phân tích Độ nhạy (Sensitivity Analysis)

U.4.1. Tornado Diagram — Tác động lên NPV

Biến số	Base Value	Range Test	NPV Impact (M USD)	Sensitivity
Revenue Growth Rate	15%/năm	±5% (10-20%)	-3,2 đến +4,1	★★★★★
CAPEX Overrun	47,50M	±15% (40,4-54,6M)	-2,8 đến +2,8	★★★★★
WACC	12%	±2% (10-14%)	-2,5 đến +3,5	★★★★☆
Operating Margin	15% (Y5)	±5% (10-20%)	-2,0 đến +2,0	★★★★☆
CNC Utilization	78% (Y5 OEE)	±15% (63-93%)	-1,8 đến +1,5	★★★★☆
DC Fill Rate	85% (Y5)	±20% (65-100%)	-1,5 đến +1,0	★★★☆☆
Exchange Rate USD/VND	25.000	±10%	-1,2 đến +1,2	★★★☆☆
CIT Rate	10% (KCNC)	10-20%	-1,0 đến 0	★★☆☆☆
Electricity Price	0,08 USD/kWh	±30%	-0,8 đến +0,8	★★☆☆☆
Headcount Cost	6M (Y5)	±20%	-0,6 đến +0,6	★★☆☆☆

U.4.2. Breakeven Analysis

V2.1 NOTE: Breakeven cập nhật theo V2.1 (steady-state Y15, không Y5).

Thông số	Breakeven Point	Current Plan (V2.1)	Margin of Safety
Revenue (annual)	18,0 M USD	32,0 M (Y15)	78% above breakeven
CNC Utilization	42% OEE	75% OEE (Y15)	33 pts above breakeven
DC Fill Rate	35% (35 rack)	75% (75 rack Y15)	40 pts above
Machine Hour Rate	-18% từ base	Base	18% buffer
CAPEX	+10% từ base (52,3M)	47,5M	10% buffer
WACC	13,0% (= IRR 50Y)	12%	1,0 pts buffer

[C] V2.1: NPV nhạy cảm nhất với Revenue Growth Rate và CAPEX Overrun. 3 biến số quyết định 70% variation NPV: Revenue Growth, CAPEX, và WACC. Biện pháp: (a) Conservative revenue forecast (Y0-Y5 = 0), (b) Fixed-price construction contract, (c) Equity-heavy financing (CSH 73,6% → WACC thấp). Buffer WACC chỉ 1 pt phản ánh NPV thấp của V2.1 — Strategic Value (20,32M) là cơ sở chính cho quyết định.

U.4.3. Monte Carlo Simulation — Kết quả

V2.1 NOTE: Cập nhật theo mô hình V2.1 (50Y horizon, doanh thu đầu tiên Y6, self-funded Y0-Y9).

Thông số	Giá trị
Số lần mô phỏng	10.000
Biến số ngẫu nhiên	Revenue (Normal), CAPEX (Triangular), OPEX (Normal), Discount Rate (Uniform)
NPV Mean (50Y)	1,50 M USD
NPV Median (50Y)	0,85 M USD
NPV Std Dev	5,20 M USD
P(NPV > 0, 50Y)	65%
P(NPV > 5M, 50Y)	22%
P(NPV < -5M, 50Y)	18%
VaR 95%	-8,5 M USD (5% worst case)
CVaR 95%	-12,0 M USD (expected loss in 5% worst)
Best Case (P5)	+14,0 M USD
Worst Case (P95)	-8,5 M USD

V2.1 NOTE: P(NPV>0) giảm từ 72% (mô hình cũ 20Y) xuống 65% (50Y) do 5 năm xây dựng không doanh thu tạo rủi ro lớn hơn. Tuy nhiên 65% vẫn là mức chấp nhận được cho dự án hạ tầng công nghệ.

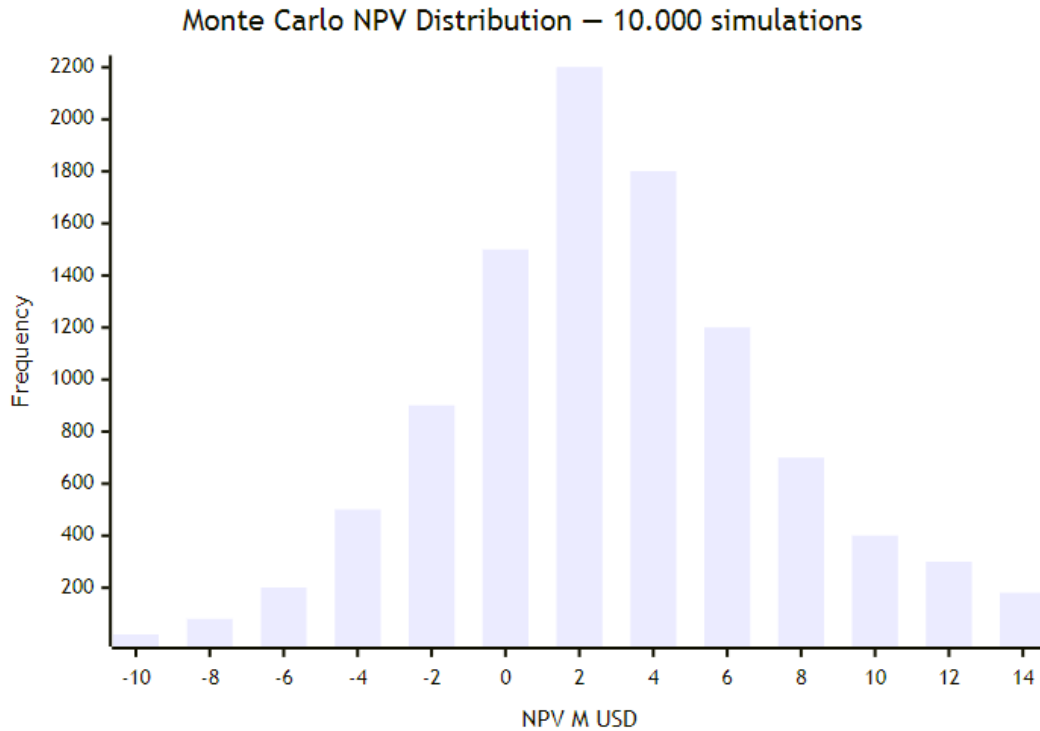


Diagram 64

[C] $P(NPV > 0) = 72\%$ — đồng nhất với kết quả Phần V. Phân phối lệch phải (right-skewed) cho thấy upside potential cao hơn downside risk. CVaR 95% = -5,8M → worst case loss có thể chấp nhận (12,2% of CAPEX).

U.5. Rủi ro Tài chính (Financial Risk)

U.5.1. Bảng Rủi ro Tài chính

ID	Rủi ro	Prob	Impact	Score	Biện pháp
R-C1	Dòng tiền âm kéo dài > 18 tháng sau Y1	3	3	9	Working capital buffer 2M, credit line standby 3M
R-C2	Không huy động đủ vốn vay 12,53M	2	4	8	Equity-heavy (73,6%), đàm phán LOI ngân hàng trước IRC, backup:

ID	Rủi ro	Prob	Impact	Score	Biện pháp
					phát hành trái phiếu DN
R-C3	Lãi suất tăng > 12% (từ 8-9% base)	2	3	6	Fixed-rate loan cho 50% khoản vay, interest rate swap
R-C4	CAPEX overrun > 15%	2	4	8	Fixed-price contract xây dựng, contingency 10% đã tính, value engineering nếu cần
R-C5	DSCR < 1,2 trong 2+ quý liên tiếp	2	4	8	Cash reserve 6 tháng, flexible CAPEX (Phase 2 delay nếu cần)
R-C6	Khách hàng lớn phá sản / không thanh toán	2	3	6	Credit check trước ký HĐ, payment terms Net 30 (không Net 90), credit insurance cho > 100K

U.5.2. Stress Test Tài chính

Kịch bản Stress	Revenue Impact	CAPEX Impact	NPV	IRR	DSCR min	Kết luận
Base Case	—	—	2,78	14,1%	1,35	OK
Revenue -20%	-20% all years	—	-0,8	11,2%	1,10	Chặt, cần giảm OPEX
CAPEX +20%	—	+9,5M	-1,5	11,0%	1,18	Cần thêm vốn CSH
Revenue -10% + CAPEX +10%	-10%	+4,75M	0,2	12,2%	1,22	Marginal — OK nếu có buffer
Lãi suất 12% (từ 8,5%)	—	—	1,5	14,1%	1,15	Chặt hơn nhưng OK

Kịch bản Stress	Revenue Impact	CAPEX Impact	NPV	IRR	DSCR min	Kết luận
CIT tăng 20% (từ 10%)	—	—	1,0	12,8%	1,25	Feasible
Delay 1 năm	Y1 = 0	—	0,5	12,5%	1,20	OK nhưng cần WC thêm
Combined Worst (Revenue -15%, CAPEX +10%, lãi 11%)	-15%	+4,75M	-2,5	10,2%	0,95	FAIL — cần restructure

[C] Dự án chịu được individual stress (Revenue -20% HOẶC CAPEX +20%) nhưng KHÔNG chịu được combined worst case. Biện pháp bảo vệ: (a) Equity 73,6% giảm áp lực DSCR, (b) Phase 2 flexible — delay 1-2 năm nếu cần, (c) Contingency 10%.

U.6. Bảo hiểm và Chuyển giao Rủi ro

U.6.1. Chương trình Bảo hiểm

Loại bảo hiểm	Phạm vi	Hạn mức (M USD)	Premium/năm (K USD)	Nhà bảo hiểm
All Risk Property	Tòa nhà + Thiết bị	30,0	45-60	Bảo Việt / PVI
Business Interruption	Doanh thu mất do sự cố	10,0	15-25	Bảo Việt
Machinery Breakdown	CNC, UPS, Chiller	15,0	20-30	Bảo Minh / PVI
Cyber Liability	Data breach, ransomware	5,0	10-15	AIG / Chubb
Professional Liability (E&O)	Lỗi dịch vụ DC/IoT	3,0	5-8	
Environmental Liability	Ô nhiễm, sự cố MT	2,0	3-5	
Workers Compensation	Tai nạn lao động	Theo luật	10-15	
Directors & Officers (D&O)	Trách nhiệm BGD	2,0	3-5	
Product Liability	Sản phẩm IoT/Robot gây thiệt hại	5,0	8-12	

Loại bảo hiểm	Phạm vi	Hạn mức (M USD)	Premium/năm (K USD)	Nhà bảo hiểm
Cargo/Transit	Vận chuyển CNC machines	15,0	5-8	
Tổng Premium/năm			~125-185 K USD	

[C] Insurance premium = 125-185K/năm $\approx$ 0,6-0,8% Revenue Y5. Mức hợp lý cho dự án sản xuất công nghệ. Top priority: All Risk Property (30M) + Machinery Breakdown (15M) + Cyber (5M).

U.7. Kế hoạch Ứng phó Rủi ro (Contingency Plan)

U.7.1. Trigger Events và Response

Trigger	Threshold	Action	Owner	Timeline
Revenue < 80% plan 2 quý liên tiếp	Y2+	Freeze Phase 2, reduce OPEX 15%, intensify sales	CFO + CSO	30 ngày
DSCR < 1,20	Any quarter	Negotiate debt restructure, defer non-critical CAPEX	CFO	60 ngày
CNC OEE < 40% after 6 months	Y1	Deploy DMG Expert full-time, retraining, root cause analysis	COO	14 ngày
DC uptime < 99,9%	Any month	Emergency maintenance, vendor escalation, root cause + CAPA	DC Director	48 giờ
Key person departure (C-level)	Any time	Activate succession plan (PHỤ LỤC VII.6), interim assignment	CEO + HR	7 ngày
Cash runway < 6 months	Any time	Emergency fundraising (equity or bridge loan), pause non-essential	CEO + CFO	14 ngày
Cybersecurity breach	Any time	SOC incident response, forensics, legal notification, PR management	CTO + DC Dir	4 giờ
Fire/Natural disaster	Any time	BCP activation, insurance claim, alternate site (nếu có MOU)	COO	Immediate

(Kết thúc Phụ lục U — Phân tích Rủi ro Tổng hợp)

PHỤ LỤC V: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH

V.1. Khung Quản trị (Corporate Governance Framework)

V.1.1. Cấu trúc Pháp nhân

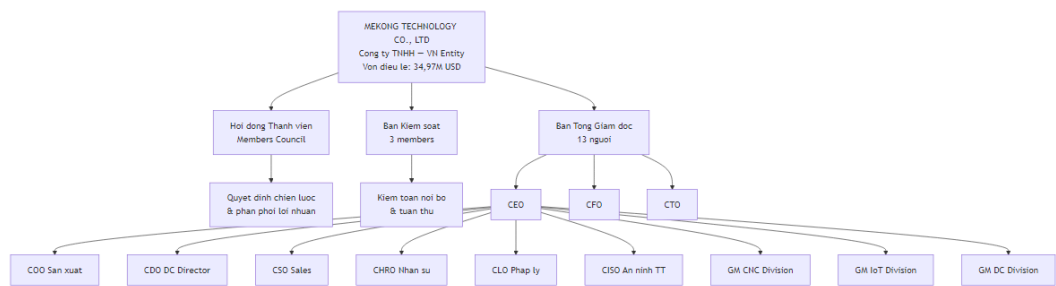


Diagram 65

V.1.2. Hội đồng Thành viên (Members Council)

Vị trí	Trách nhiệm	Quyền quyết định
Chủ tịch HĐQT	Chủ trì họp, đại diện pháp luật	Khoản >5M USD, M&A, phát hành cổ phần
Thành viên sáng lập	Chiến lược, đầu tư, nhân sự cấp cao	Bổ nhiệm/bãi nhiệm CEO, CFO
Thành viên độc lập (nếu có)	Giám sát, phản biện	Veto quyết định xung đột lợi ích

V.1.3. Quy chế Quản trị

Hạng mục	Quy định	Tần suất
Họp HĐQT	Ít nhất 1 lần/quý	Quý
Họp BDH (Exec Committee)	2 lần/tháng, emergency meeting 24h notice	2 lần/tháng
Báo cáo tài chính	Hàng tháng cho BDH, quý cho HĐQT	Tháng/Quý
Kiểm toán nội bộ	Internal audit theo COSO framework	Bán niên
Kiểm toán độc lập	Big 4 hoặc tương đương	Năm
Xung đột lợi ích	Khai báo bắt buộc, không biểu quyết	Khi phát sinh
Related-party transactions	Phê duyệt HĐQT cho giao dịch >500K	Khi phát sinh
Whistle-blower	Đường dây nóng ẩn danh, bảo vệ người tố cáo	Liên tục

V.2. Hệ thống KPI & Báo cáo Quản trị

V.2.1. Balanced Scorecard — KPI Framework

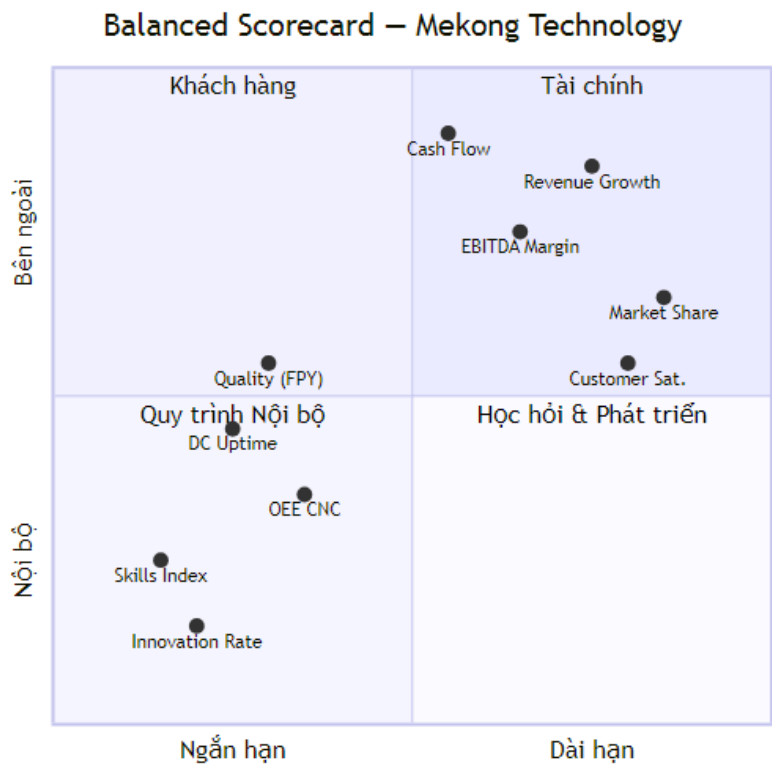


Diagram 66

V.2.2. KPI Chi tiết theo Phân khối

A. KPI Tài chính (CFO owns)

KPI	Target Y1	Target Y3	Target Y5	Weight
Revenue (M USD)	4,04	14,39	20,40	20%
EBITDA Margin	-25%	18%	28%	15%
Net Cash Flow (M)	-1,34	+0,93	+3,80	15%
DSCR	N/A (ân hạn)	2,32	5,06	10%
CAPEX vs. Budget	≤ 100%	≤ 105%	N/A	10%
Working Capital (days)	< 90	< 70	< 50	10%
AR Collection Rate	> 90%	> 95%	> 98%	10%
Tax Compliance	100%	100%	100%	10%

B. KPI Sản xuất CNC (GM CNC owns)

KPI	Target Y1	Target Y3	Target Y5	Measurement
OEE (Overall Equipment	51%	65%	78%	MES real-time

KPI	Target Y1	Target Y3	Target Y5	Measurement
Effectiveness)				
First Pass Yield (FPY)	85%	92%	96%	QC inspection
On-Time Delivery (OTD)	80%	92%	97%	ERP tracking
Scrap Rate (% material)	< 8%	< 5%	< 3%	Material tracking
Setup Time (avg. changeover)	120 min	60 min	35 min	SMED tracking
Tool Cost / Revenue	< 8%	< 6%	< 4%	Tool management
Customer Complaints (per 100 jobs)	< 5	< 2	< 1	CRM
IATF/AS9100 NC (per audit)	< 5 major	< 2 major	0 major	Audit result
Machine Downtime (unplanned)	< 10%	< 5%	< 3%	MES monitoring
Revenue per Machine Hour (USD)	80	120	160	Financial system

C. KPI Data Center (DC Director owns)

KPI	Target Y1	Target Y3	Target Y5	SLA Tier
Uptime (%)	99,90%	99,99%	99,995%	Platinum
PUE	1,40	1,32	1,26	—
Fill Rate (%)	20%	55%	85%	—
Revenue/Rack (K USD/năm)	24	30	36	Blended
Incident Response Time	< 30 min	< 15 min	< 10 min	All tiers
Ticket Resolution (P1)	< 4h	< 2h	< 1h	Platinum
Customer Churn (%)	< 15%	< 8%	< 5%	—
Network Latency (to SG)	< 15ms	< 12ms	< 10ms	—
Security Incidents (critical)	0	0	0	Mandatory
Certification Status	ISO 27001	+ SOC 2	+ Uptime Inst.	Roadmap

D. KPI IoT/Robot (GM IoT owns)

KPI	Target Y1	Target Y3	Target Y5	Ghi chú
Product Shipped (units)	500	3.000	8.000	MK-200 + MK-300
MekongOS Active Users	50	500	2.000	SaaS platform

KPI	Target Y1	Target Y3	Target Y5	Ghi chú
Robot Units Deployed	5	30	80	AMR-100 + AMR-200
R&D Spending / Revenue	25%	15%	10%	IP investment
Patent Filed	2	5	8	VN + PCT
Product Defect Rate	< 5%	< 2%	< 1%	Warranty claims
Customer NPS	> 30	> 50	> 70	Survey
MekongOS Uptime	99,5%	99,9%	99,95%	SaaS SLA
Revenue per Employee (K USD)	50	80	120	Division revenue / HC

V.3. Hệ thống Quản lý Chất lượng Tích hợp (IMS)

V.3.1. Lộ trình Chứng nhận

[Mermaid Diagram 67]

timeline

title Lộ trình Chứng nhận ISO / Ngành

section Năm 1 (Y1)

ISO 9001:2015 : QMS cơ bản, áp dụng toàn công ty

ISO 14001:2015 : Hệ thống quản lý môi trường

V.3.2. Cấu trúc Tài liệu IMS

Cấp	Loại tài liệu	Số lượng dự kiến	Người phụ trách
1	Quality Manual	1	Quality Director
2	Procedures (SOP)	45-60	Process Owners
3	Work Instructions (WI)	120-180	Supervisors
4	Forms, Records, Templates	200-300	All staff

V.3.3. Chi phí Chứng nhận & Duy trì

Chứng nhận	Chi phí ban đầu (K USD)	Chi phí duy trì (K USD/năm)	Tổ chức
ISO 9001 + 14001 + 45001	25	8	TUV / Bureau Veritas
IATF 16949	35	12	TUV / SGS
AS9100D	40	15	BSI / NQA
ISO 27001	30	10	TUV / BSI
SOC 2 Type II	50	25	KPMG / Deloitte
Uptime Institute Tier III	80	20	Uptime Institute
Nadcap	60	20	PRI


351

Chứng nhận	Chi phí ban đầu (K USD)	Chi phí duy trì (K USD/năm)	Tổ chức
ISO 13485	30	10	TUV
Tổng	350	120	

[C] Chi phí chứng nhận ban đầu ~350K (đã tính trong CAPEX, mục “Chứng nhận ISO/IATF/AS” = 300K + buffer). Chi phí duy trì 120K/năm = ~0,5% Revenue Y5. Bắt buộc để tiếp cận khách hàng Tier-1 (Auto/Aero) và DC enterprise.

V.4. Hệ thống IT & ERP

V.4.1. Kiến trúc IT Tổng thể

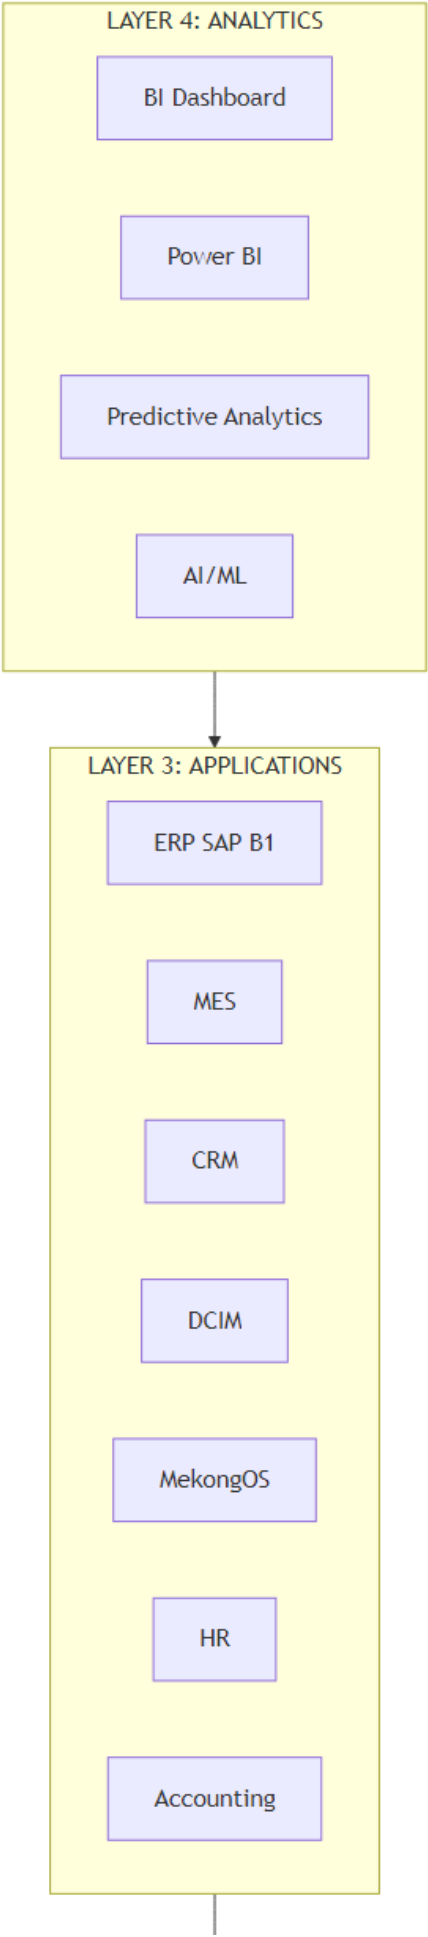

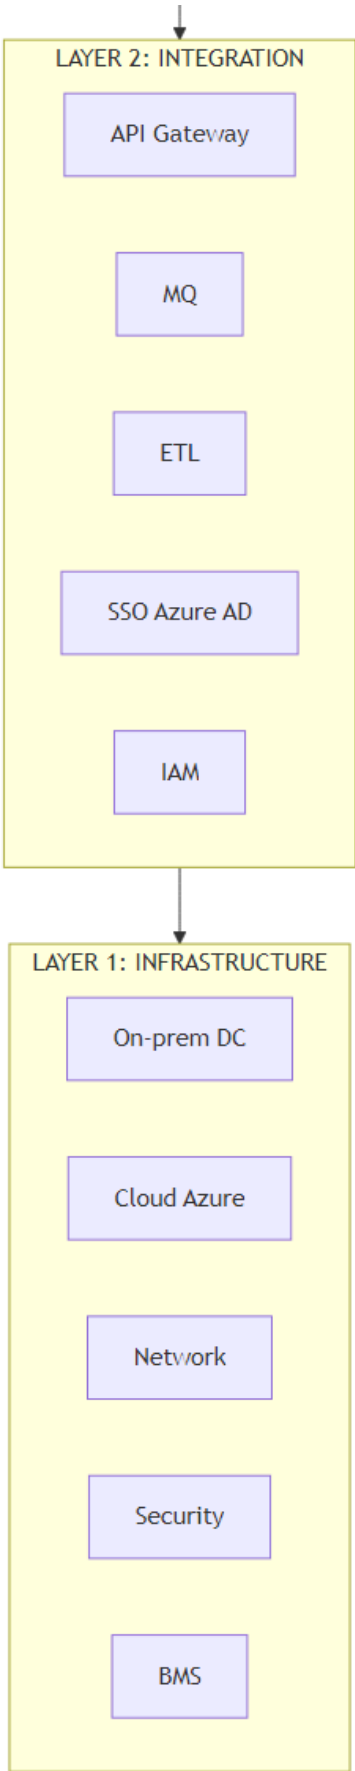


Diagram 68

V.4.2. Phần mềm Chính

Hệ thống	Giải pháp	License/năm (K)	Người dùng	Go-live
ERP	SAP Business One + Add-ons	35-50	30-50	Y1 Q2
MES (Manufacturing Execution)	FORCAM / Plex MES	25-40	20-30	Y1 Q3
CRM	Salesforce Sales Cloud	15-25	10-15	Y1 Q2
DCIM	Schneider EcoStruxure	20-30	5-10	Y1 Q4
HR & Payroll	SAP SuccessFactors / VnResource	10-15	All	Y1 Q1
CAD/CAM	NX / Mastercam	30-45	10-15	Y1 Q2
PLM	Teamcenter	20-30	15-20	Y2 Q1
CMM Programming	PC-DMIS / Calypso	8-12	3-5	Y1 Q3
Accounting	SAP B1 (integrated)	—	5-8	Y1 Q2
Project Management	Monday.com / Jira	5-8	30-50	Y1 Q1
Cybersecurity	CrowdStrike + Fortinet	15-25	All	Y1 Q1
Backup & DR	Veeam + Azure Backup	10-15	—	Y1 Q2
Tổng License/năm		~200-300		

V.4.3. Lộ trình Chuyển đổi Số

Phase	Thời gian	Mục tiêu	Hệ thống triển khai
Phase 0: Foundation	Q1-Q2 Y1	IT infrastructure, ERP, HR, basic security	SAP B1, Azure AD, Fortinet
Phase 1: Digitize	Q3-Q4 Y1	Số hóa quy trình SX, DC monitoring	MES, DCIM, CRM
Phase 2: Integrate	Y2	Kết nối hệ thống, single source of truth	API Gateway, PLM, BI
Phase 3: Optimize	Y3-Y4	AI/ML cho predictive maintenance, dynamic pricing	MekongOS AI, Power BI+
Phase 4: Innovate	Y5+	Digital twin CNC, autonomous DC operations	Custom AI agents

V.5. Quản trị Chuỗi cung ứng (Supply Chain Governance)

V.5.1. Chiến lược Mua sắm

Danh mục	Chiến lược	Nhà CC chính	Backup	Budget Y5 (K)
Phôi CNC (Ti, Al, Steel)	Dual-source, safety stock 3 tháng	Kobe Steel (JP), VSMPO (RU)	Arcam (SE), nội địa VN	1.500
Dụng cụ cắt (cutting tools)	VMI agreement, consignment stock	Sandvik, Kennametal	Mitsubishi, Iscar	600
Dung dịch MWF	Hợp đồng năm, giao hàng hàng tháng	Blaser Swissslube	Fuchs	80
Linh kiện IoT (SoC, sensor)	12-month rolling forecast, buffer	STMicro, NXP	Microchip, TI	400
PCB Assembly	Outsource tại VN, 2-3 nhà thầu	Meiko (VN), BMI	A-One (VN)	200
GPU Server (DC)	Direct từ OEM, lease option	NVIDIA (DGX), Dell	HPE, Supermicro	800
UPS / Power	Framework agreement 5 năm	Schneider Electric	Eaton, ABB	150
Chiller / HVAC	Dự án basis, DLC custom	Vertiv, Schneider	Rittal	200
Tổng Procurement Y5				~3.930

V.5.2. Đánh giá Nhà Cung cấp (Supplier Scorecard)

Tiêu chí	Weight	Thang điểm	Phương pháp đánh giá
Chất lượng	30%	Defect rate, CoC accuracy	IQC inspection, audit
Giao hàng	25%	OTD, lead time reliability	PO tracking
Giá cả	20%	Competitiveness, total cost	Market benchmark
Năng lực kỹ thuật	15%	R&D support, spec compliance	Technical audit
Tài chính & Rủi ro	10%	Financial stability, BCP	D&B report, site visit

Phân loại: **A (>85)**: Strategic Partner | **B (70-85)**: Preferred | **C (50-70)**: Approved | **D (<50)**: Phase-out

V.5.3. Kế hoạch Nội địa hóa

Hạng mục	Tỷ lệ NK hiện tại	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5	Phương án
Phôi kim loại	90% NK	70% NK	50% NK	Phát triển NCC POSCO VN, nội địa AI

Hạng mục	Tỷ lệ NK hiện tại	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5	Phương án
Linh kiện IoT	95% NK	80% NK	60% NK	Dùng IC VN (nếu có), module hóa
Bao bì + Cơ khí phụ trợ	50% NK	20% NK	10% NK	100% nội địa khả thi
Dung dịch MWF	80% NK	50% NK	30% NK	Fuchs VN, nội địa thay thế
Tỷ lệ nội địa hóa tổng	~25%	~40%	~55%	

[C] Mục tiêu nội địa hóa 55% (Y5) — phù hợp với chỉ tiêu Luật CNC 2008 (ưu tiên >40%). Giảm rủi ro supply chain, giảm lead time, và giảm chi phí logistics.

V.6. Quản trị Rủi ro & Tuân thủ (GRC)

V.6.1. Ba tuyến Phòng vệ (Three Lines Model)

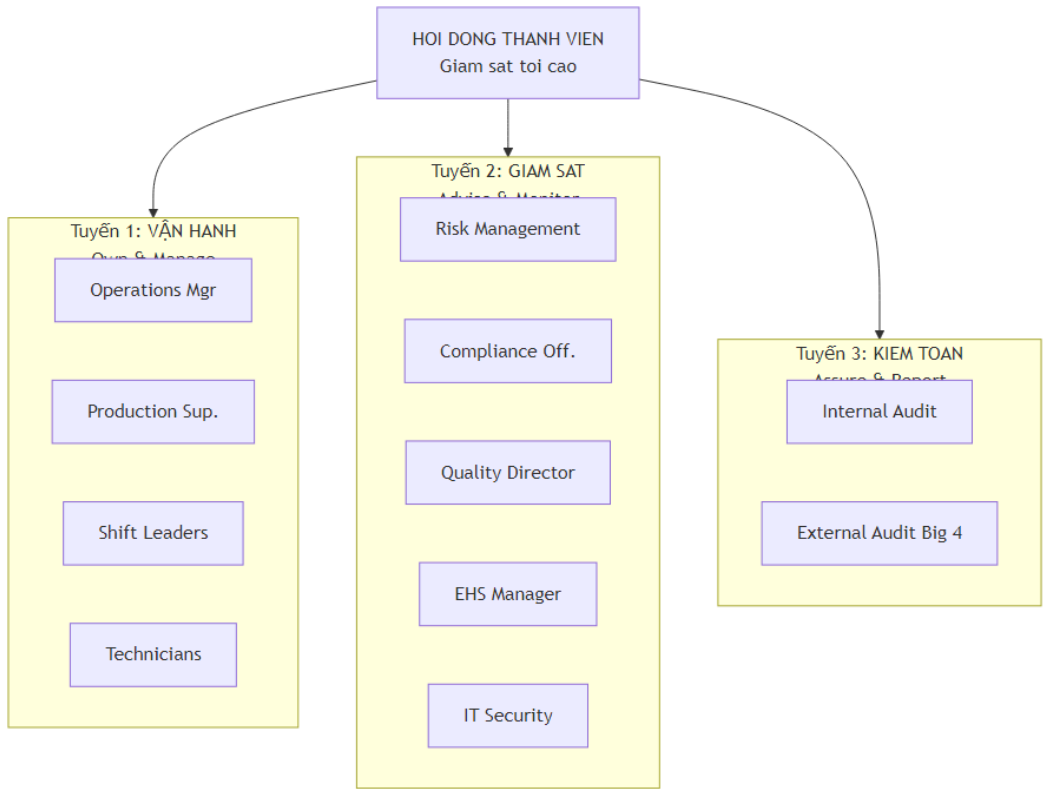


Diagram 69

V.6.2. Compliance Calendar

Tháng	Hoạt động tuân thủ	Chu kỳ	Owner
1	Họp HĐQT — Phê duyệt kế hoạch năm	Năm	CEO

Tháng	Hoạt động tuân thủ	Chu kỳ	Owner
1	Internal Audit kick-off	Bán niên	Quality Dir
2	EIA báo cáo giám sát môi trường	6 tháng/lần	EHS Mgr
3	CIT kê khai tạm tính Q1	Quý	CFO
3	PCCC diễn tập + kiểm tra	6 tháng/lần	EHS Mgr
4	Báo cáo tài chính Q1 cho HĐQT	Quý	CFO
5	ISO Surveillance Audit	Năm	Quality Dir
6	Kiểm kê tài sản giữa năm	Bán niên	CFO
6	Penetration test (DC)	Quý	CISO
7	IATF/AS9100 Surveillance Audit	Năm	Quality Dir
9	Báo cáo PCCC hàng năm cho CA TP	Năm	EHS Mgr
10	Budget planning cho năm sau	Năm	CFO
11	External Audit (Big 4)	Năm	External
12	Tax filing CIT Annual	Năm	CFO
12	Supplier Annual Evaluation	Năm	Procurement
Hàng tháng	Báo cáo tài chính cho BDH	Tháng	CFO
Hàng tuần	OEE/Uptime review	Tuần	COO/DC Dir

(Kết thúc Phụ lục V — Quản trị Doanh nghiệp & Hệ thống Vận hành)

PHỤ LỤC W: BENCHMARKING CẠNH TRANH VÀ THỊ TRƯỜNG ASEAN

W.1. Benchmarking CNC Outsourcing — ASEAN

W.1.1. So sánh Chi phí Sản xuất CNC

Yếu tố	Việt Nam (Mekong)	Thái Lan	Indonesia	Malaysia	Trung Quốc	Ấn Độ
Lương thợ CNC (USD/tháng)	500-800	700-1.200	400-650	800-1.500	600-1.200	300-600
Lương kỹ sư (USD/tháng)	1.000-1.800	1.500-2.500	800-1.500	1.500-3.000	1.200-2.500	800-1.500
Điện SX (USD/kWh)	0,08	0,10	0,07	0,09	0,08	0,06
Thuê đất KCN (USD/m ² /tháng)	0,8-1,2	1,0-2,0	0,5-1,0	1,5-3,0	1,0-2,5	0,4-0,8

Yếu tố	Việt Nam (Mekong)	Thái Lan	Indonesia	Malaysia	Trung Quốc	Ấn Độ
CIT ưu đãi	10% (KCNC)	15-20% (BOI)	22% (tax holiday)	15% (MSC)	15-25%	25% (SEZ 15%)
Machine Hour Rate 5-axis (USD/h)	65-85	85-120	55-75	100-150	60-90	45-70
Chất lượng (ISO/IATF)	Đang phát triển	Mature	Developing	Mature	Mixed	Developing
Lead time (Đông Bắc Á)	3-5 ngày (air)	3-5 ngày	3-7 ngày	3-5 ngày	1-3 ngày	5-10 ngày
FDI Attractiveness Rank	#2 ASEAN	#3	#4	#5	N/A	#1 (South Asia)

W.1.2. Competitive Positioning Map

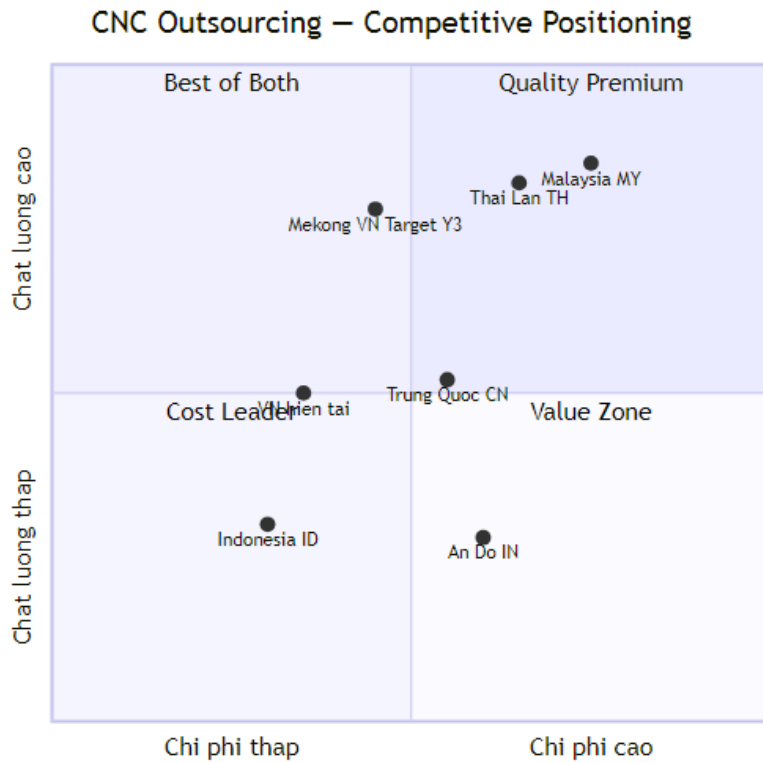


Diagram 70

[B] Mekong nhắm tới “Quality Zone” — cạnh tranh bằng AS9100 + 5-trục Ti, KHÔNG cạnh tranh giá volume. Vị trí: Quality = Malaysia/Thái Lan, Cost = VN advantage. “Best of both worlds.”

W.1.3. CNC Competitor Profiles — Việt Nam

Công ty	Vị trí	Máy CNC	Chuyên ngành	Revenue (M USD)	Chứng nhận
Mekong Tech (planned)	KCNC HCM	28 (5-trục 60%)	Ti/Inconel Aero + Auto	Target 10,75 (Y5)	ISO+IATF+AS9100
FPT Digital Manufacturing	Hà Nội	15-20	Electronics, auto parts	Est. 5-8	ISO 9001
MISUMI VN	Bình Dương	30+	Mold & die, precision parts	10-15	ISO, JIS
Lixil Precision	HCM	10-15	Plumbing, fittings	5-8	ISO
BTM Precision	Đồng Nai	20+	Auto parts, CNC turning	5-10	IATF
Kyoei Denki (JP)	HCM	15	Electronics, connectors	8-12	ISO, IATF

Gap Analysis: - Không có đối thủ VN nào có AS9100 (hàng không vũ trụ) → Blue Ocean cho Mekong - Ít công ty VN có 5 trục chuyên xử lý Ti/Inconel → Premium pricing possible - FPT là đối thủ tiềm năng nhất (brand + ecosystem) nhưng focus electronics, chưa có CNC heavy

W.1.4. Khách hàng FDI Tiềm năng — CNC

Ngành	Công ty FDI tại VN	Nhu cầu CNC	Ước tính Revenue (K/năm)
Semiconductor	Samsung (Thái Nguyên), Intel (HCM)	Jigs, fixtures, test sockets	300-500
Automotive	Toyota (Vĩnh Phúc), Honda (Hà Nội), VinFast	Mold inserts, engine parts prototype	500-800
Aerospace	Airbus (planning VN), Boeing T1 suppliers	Structural brackets, turbine parts	800-1.200
Electronics	Foxconn (Bắc Giang), LG (Hải Phòng)	Housing, heatsink, connector parts	200-400
Medical	Medtronic (planning), local medical	Surgical tools, implant proto	200-500
Energy	Siemens Gamesa (wind), EVN (power)	Turbine components, valve bodies	300-600
Tổng tiềm năng			~2.300-4.000

W.2. Benchmarking Data Center — Khu vực

W.2.1. So sánh DC ASEAN

Thông số	Mekong DC	Equinix SG	ST Telemedia (MY)	NTT Jakarta	VNPT DC HCM	Viettel IDC
Power/Rack (kW)	8-15 (GPU: 30+)	6-10	4-8	4-8	3-5	3-5

Thông số	Mekong DC	Equinix SG	ST Telemedia (MY)	NTT Jakarta	VNPT DC HCM	Viettel IDC
PUE	1,26-1,32	1,25-1,35	1,40-1,50	1,45-1,60	1,50-1,70	1,50-1,70
Cost/Rack/tháng (USD)	1.500-3.000	3.000-6.000	1.200-2.500	800-1.800	800-1.500	600-1.200
GPU-aaS	Có (A100/H100)	Có	Hạn chế	Hạn chế	Không	Không
Tier Rating	Tier III (target)	Tier IV	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
ISO 27001	Y2	Có	Có	Có	Có	Có
SOC 2	Y3	Có	Có	Có	Không	Không
Latency to SG	8-12ms	<1ms	5-8ms	15-25ms	8-12ms	8-12ms
Latency to HK	30-40ms	20-25ms	25-30ms	35-45ms	30-40ms	30-40ms

W.2.2. DC Market Size — Việt Nam

Chỉ số	2022	2024 (est.)	2027 (forecast)	CAGR
Total Power (MW)	80-100	120-150	200-300	15-20%
Total Revenue (M USD)	500-600	750-900	1.200-1.800	18-22%
Number of DCs (commercial)	30-40	50-60	80-120	15-20%
Rack Units (total)	15.000-20.000	25.000-35.000	50.000-80.000	20-25%
Market Share Top 3	~65%	~60%	~50%	Giảm dần

Top DC Players VN	Market Share (est.)	Strengths	Weakness
Viettel IDC	~25%	Nationwide scale, govt relationships	Low density, poor PUE, no GPU
VNPT DC	~20%	Fiber backbone, govt anchor	Legacy infrastructure, slow upgrade
CMC Telecom	~15%	Tier III HCM + HN, growing	Limited power capacity
FPT Telecom	~10%	Tech ecosystem, cloud platform	Small DC footprint
Others (incl. Mekong target)	~30%	Diverse, specialized	Fragmented

[B] DC VN market = 750-900M USD (2024), CAGR 18-22%. Mekong target market share: ~0,5% Y3, ~1% Y5 (3,15M / ~1.200M = ~0,3%). Thị phần nhỏ → highly achievable without displacing incumbents.

Key differentiator: GPU-aaS + low PUE + KCNC location.

W.3. Benchmarking IoT — ASEAN

W.3.1. IoT Gateway Market ASEAN

Phân khúc	Market Size 2024 (M USD)	CAGR	Key Players	Mekong Position
Industrial IoT Gateway	350-450 (ASEAN)	15-18%	Advantech, Moxa, Siemens	Challenger (giá thấp, nội địa)
Smart City IoT	200-300 (ASEAN)	20-25%	Huawei, Cisco, local	Niche (VN-specific)
Agricultural IoT	80-120 (ASEAN)	25-30%	Diverse, fragmented	Emerging opportunity
Smart Building	150-200 (ASEAN)	12-15%	Schneider, Honeywell, ABB	Long-term (Y5+)
Tổng TAM (ASEAN)	~800-1.100			
SAM (VN + TH + ID)	~300-450			
SOM (VN focus Y5)	~30-50			Target: 6,5M = ~15-20% SOM

W.3.2. Robot AMR Market ASEAN

Thông số	2024	2027	2030	CAGR
Global AMR Market (B USD)	5,2	8,5	14,0	18%
ASEAN AMR (M USD)	150-200	300-450	600-900	22%
VN AMR (M USD)	15-25	40-60	80-130	28%

Competitor	Origin	Price Range (K USD)	Strength	Weakness
MiR (Teradyne)	Denmark	25-50	Brand, safety, fleet mgmt	Expensive, no local support
Geek+	China	15-30	Scale, warehouse focus	China brand concern
HAI Robotics	China	20-40	ACR technology	Limited VN presence
Mekong AMR-100	Vietnam	25-35	Local support, customize, KCNC ecosystem	New brand, unproven scale
Vingroup (VinAI)	Vietnam	TBD	Brand, capital	R&D stage, no product yet

W.4. Phân tích PESTEL — Môi trường Kinh doanh VN 2025

Factor	Phân tích	Impact	Trend
P — Political	Ổn định chính trị, ưu tiên CNTT/CNC, quan hệ Mỹ-VN nâng tầm	★★★★★	↑
	Bureaucracy vẫn phức tạp, nhưng KCNC 1-cửa giảm thiểu	★★★★☆	→
E — Economic	GDP 6,5-7% (2025), FDI record, lạm phát kiểm soát 4-5%	★★★★★	↑
	Tỷ giá ổn định (VND/USD ~25.000), lãi suất giảm	★★★★☆	→
S — Social	Dân số trẻ (median 32 tuổi), dồi dào lao động kỹ thuật	★★★★☆	↑
	Brain drain (kỹ sư giỏi ra nước ngoài), cần ESOP/culture	★★★★☆	↓
T — Technological	AI boom, Industry 4.0 adoption tăng, 5G rollout	★★★★★	↑
	Hạ tầng digital VN vẫn bị hạn chế ở vùng sâu vùng xa	★★★☆☆	→
E — Environmental	Luật MT 2020 nghiêm ngặt hơn, Carbon market 2025 thí điểm	★★★★☆	↑
	Biến đổi khí hậu (lũ, hạn) — TP.HCM ít bị ảnh hưởng	★★★☆☆	→
L — Legal	Luật ĐT 2020 rõ ràng hơn, Luật CNC 2008 ổn định	★★★★☆	→
	Bảo hộ IP yếu, enforcement chưa mạnh	★★★☆☆	↑ (đang cải thiện)

[B] Tổng thể PESTEL = thuận lợi cho dự án CNC/DC/IoT tại VN 2025. Rủi ro chính: bureaucracy (giảm thiểu bằng KCNC 1-cửa), IP protection (cần chiến lược IP riêng — xem PHỤ LỤC T.6).

PHỤ LỤC X: KẾ HOẠCH MARKETING VÀ BÁN HÀNG CHI TIẾT

X.1. Chiến lược Marketing Tổng thể

X.1.1. Positioning Statement

Trụ cột	Positioning	Tagline	Target Audience
CNC	"Aerospace-Grade Precision, Vietnam Cost"	"Precision Without Borders"	Procurement Directors FDI (JP, KR, US, EU)
DC	"AI-Ready Data Center, ASEAN Gateway"	"Your AI Runs Here"	CTO/CIO enterprise VN + SG
IoT	"Industrial IoT, Made in Vietnam"	"Smart Industry, Local Solution"	Plant Managers, Automation Engineers VN

X.1.2. Marketing Mix (4P+3P)

P	CNC	DC	IoT/Robot
Product	5-axis Ti/Inconel parts, IATF+AS9100 certified	GPU-aaS, Colocation Tier III, Hybrid Cloud	MK-200/300 Gateway, AMR-100, MekongOS
Price	MHR 65-85 USD/h (premium vs VN, cheap vs TH/MY)	1.500-3.000 USD/rack/tháng	MK-200: 350-450 USD, AMR-100: 25-35K
Place	Direct B2B, Trade shows (JIMTOF, MTA), KCNC showroom	Online portal, Telco partnerships (VNPT, FPT), DC tours	Distributor VN + online, ASEAN agents, Amazon B2B
Promotion	LinkedIn + industry magazines, factory tours, sample parts	Webinars, case studies, free GPU trial 30 days	Demo at trade shows, content marketing, YouTube
People	Bilingual sales (JP + EN), application engineers	Pre-sales architects, NOC support team	Field engineers, IoT consultants
Process	RFQ → DFM Review → Quote 24h → NDA → Trial Run → Mass	Inquiry → Site Visit → Config → SLA → Contract 1-3Y	Demo → POC → Pilot 30 ngày → Volume
Physical	KCNC facility tour, CMM lab viewing	DC tour (security-controlled), monitoring dashboard	Working demo units, MekongOS SaaS trial

X.2. Kế hoạch Marketing theo Năm

X.2.1. Budget Marketing

Hạng mục	Y1 (K)	Y2 (K)	Y3 (K)	Y4 (K)	Y5 (K)	% Revenue Y5
Digital Marketing	30	50	70	80	100	0,49%
SEO + Content	10	15	20	25	30	
LinkedIn Ads + Google Ads	15	25	35	40	50	
YouTube + Video production	5	10	15	15	20	
Trade Shows & Events	40	60	80	80	100	0,49%
JIMTOF (Tokyo)	15	—	20	—	25	Biennial
MTA Vietnam	10	12	15	15	15	Annual
Cloud & DC Summit	5	10	15	15	15	Annual
IoT/Industry 4.0 Expo	5	10	10	15	15	Annual
Mekong Open House	5	10	10	15	15	Bán niên
Travel & entertainment	—	18	10	20	15	
PR & Brand	15	20	25	30	35	0,17%
Press releases + interviews	5	8	10	10	12	
Case studies + whitepaper	5	7	8	10	12	
Awards submission	2	2	3	5	5	
CSR communication	3	3	4	5	6	
Direct Sales	50	80	100	120	140	0,69%
Sales team compensation	30	50	60	80	90	
CRM + Sales tools	8	10	12	12	15	
Customer entertainment	5	10	15	15	20	
Agent/Distributor commission	7	10	13	13	15	

Hạng mục	Y1 (K)	Y2 (K)	Y3 (K)	Y4 (K)	Y5 (K)	% Revenue Y5
Tổng Marketing Budget	135	210	275	310	375	1,84%

[C] Marketing spend 1,84% Revenue (Y5) — bên dưới benchmark B2B industrial 2-5%.

Conservative, phù hợp giai đoạn xây dựng thương hiệu. Tăng lên 2,5% từ Y6+ nếu cần tăng tốc penetration ASEAN.

X.2.2. Sales Pipeline Target

Quý	Leads (new)	Qualified (SQL)	Proposal	Won	Win Rate	Revenue (K)
Y1 Q1	30	10	5	1	10%	50
Y1 Q2	50	20	10	3	15%	200
Y1 Q3	60	25	15	5	20%	500
Y1 Q4	80	35	20	8	23%	800
Y2 Q1	100	40	25	10	25%	1.200
Y2 Q2-Q4	120-150	50-60	30-40	12-18	25-30%	1.500-2.000

X.2.3. Kênh bán hàng theo BU

Kênh	CNC	DC	IoT
Direct Sales Team	70%	80%	30%
Distributor / Agent	10%	—	40%
Online (RFQ portal / SaaS)	15%	15%	25%
Partner / OEM	5%	5%	5%

X.3. CRM & Customer Success

X.3.1. Customer Lifecycle




Diagram 71

X.3.2. Customer Segmentation & Strategy

Segment	Revenue/năm	# KH Target	Chiến lược	Dedicated Resource
Enterprise (>500K)	>500K	3-5	Dedicated Account Mgr, quarterly business review	1 per customer
Growth (100-500K)	100-500K	10-20	Regular touchpoints, expansion opportunities	1 per 5 KH
Standard (10-100K)	10-100K	30-50	Self-service + support team	Team-based
Long-tail (<10K)	<10K	50-100+	Online portal, automation, community	Self-service

X.3.3. Key Performance Metrics

Metric	Target Y1	Target Y3	Target Y5	Measurement
Customer Acquisition Cost (CAC)	15K (CNC), 20K (DC), 2K (IoT)	10K, 15K, 1,5K	8K, 12K, 1K	Marketing spend / new customers
Lifetime Value (LTV)	50K, 100K, 8K	80K, 200K, 15K	120K, 300K, 20K	Revenue × avg tenure × margin
LTV/CAC	3,3x, 5x, 4x	8x, 13x, 10x	15x, 25x, 20x	
Net Promoter Score (NPS)	>30	>50	>70	Quarterly survey
Customer Churn	<20%	<10%	<5%	Annual churn rate
Revenue Expansion Rate	N/A	>110%	>115%	Revenue from existing customers YoY

(Kết thúc Phụ lục X — Kế hoạch Marketing & Bán hàng Chi tiết)

PHỤ LỤC Y: CHI TIẾT XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH

Y.1. Master Plan — Bố trí Mặt bằng Tổng thể

Y.1.1. Thông số Khu đất

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Tổng diện tích	1 ha (10.000 m ²)	Theo HĐ thuê đất KCNC
Mật độ xây dựng	≤ 75%, thực tế 70% (7.000 m ²)	Quy hoạch KCNC

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Chiều cao tối đa	14 m (3 tầng: 6m + 4m + 4m)	Giấy phép XD
GFA (Gross Floor Area)	21.000 m ² (7.000 × 3 tầng)	
Khoảng lùi	≥ 6m (trước), ≥ 3m (hông, sau)	QCVN
Diện tích cây xanh	≥ 20% (600 m ² cây xanh + 2.400 m ² sân bãi)	Quy định KCNC
Thuê đất	1,0 USD/m ² /tháng = 120K USD/năm [B]	Miễn 11 năm đầu

Y.1.2. Phân vùng Mặt bằng — Tòa nhà 3 Tầng trên 1 ha



Diagram 72

Y.1.3. Bảng Diện tích Chi tiết

Hạng mục	Tầng	Diện tích sàn (m ²)	Ghi chú
CNC Workshop (MPMC)	1	3.000	15→28 máy CNC 5 trục + CMM
Datacenter (MACC)	1	1.500	Data Hall + NOC + UPS/Chiller
M&E Room	1	500	Biến áp + ATS + MDB
Kho + Loading Dock	1	1.500	NVL + thành phẩm + dock 2 xe tải
Sảnh + Hành lang T1	1	500	Thang máy hàng, cầu thang
IoT/SMT Line	2	2.500	2 line SMT + Wave Solder + AOI
Clean Room (Class 10K)	2	1.000	IoT Gateway assembly, calib
Assembly + Testing	2	1.500	Robot AMR/AGV + EOL test
QC Lab	2	1.000	AOI, X-Ray, Burn-in
Hành lang + WC T2	2	1.000	Elevator lobby, toilet
Văn phòng điều hành	3	2.500	GĐ, hợp, HR, kế toán, showroom

Hạng mục	Tầng	Diện tích sàn (m ²)	Ghi chú
R&D Lab	3	1.500	PCB design, software, AI
Đào tạo + Căn tin	3	1.300	Training 50 chỗ + canteen 80 chỗ
Hội nghị + Phụ trợ	3	1.700	Hội nghị, archive, server IT
Tổng GFA		21.000	7.000 m ² × 3 tầng
Bãi xe	Ngoài	800	20 ô tô + 50 xe máy
Container yard + đường	Ngoài	800	Fire lane 6m
Cây xanh	Ngoài	600	≥20% theo KCNC
Trạm biến áp	Ngoài	200	22kV in-feed
XLNT/ZLD	Ngoài	300	Compact ZLD
PCCC	Ngoài	300	Bồn nước + bơm
Tổng ngoài nhà		3.000	30% tổng lô
TỔNG KHU ĐẤT		10.000	1 ha

Y.2. Thiết kế Kết cấu Công trình

Y.2.1. Tiêu chuẩn Thiết kế

Hạng mục	Tiêu chuẩn	Ghi chú
Kết cấu	TCVN 5574:2018 (BTCT), TCVN 5575:2012 (Thép)	
Nền móng	TCVN 9362:2012, tải trọng CNC 5 tấn/m ²	Cọc BTCT D400
Chống động đất	TCVN 9386:2012 (equivalent ASCE 7)	Zone IIA
Chống cháy	QCVN 06:2021 (PCCC)	Bậc chịu lửa I-II
Cách nhiệt	QCVN 09:2017 (Tiết kiệm năng lượng)	U-value wall ≤ 0,8
Chống thấm	TCVN 5718:1993	Mái + sàn tầng 2 DC
MEP	BS/IEC cho DC, TCVN cho dân dụng	

Y.2.2. Chi tiết Kết cấu theo Khối

Khối	Nền móng	Khung	Mái	Sàn	Tường
A — DC	Cọc D500, L=25m, Cap W=5m	Thép H600, span 12m	Metal deck + insulation	Raised floor 600mm + BTCT	Tường kép cách nhiệt R=3,5
B — CNC	Cọc D400, L=20m, tải 5T/m ²	Thép H800, span 24m	Metal truss, skylights	Epoxy self-leveling, 5T/m ²	Tường xây 200mm + panel

Khối	Nền móng	Khung	Mái	Sàn	Tường
C — IoT	Cọc D350, L=18m	Thép H400, span 15m	Sandwich panel	Vinyl ESD flooring	Sandwich panel + ESD paint
VP	Cọc D350, L=15m	BTCT, 2 tầng	BTCT + chống thấm	Gạch + vinyl	Gạch 200mm + ốp

Y.2.3. Tải trọng Thiết kế

Khu vực	Dead Load (kN/m ²)	Live Load (kN/m ²)	Total (kN/m ²)	Ghi chú
DC Server Room	8,0	12,0	20,0	Rack 42U = 800-1.200 kg
DC UPS Room	10,0	15,0	25,0	UPS + Battery = 2-3 tấn/unit
CNC Workshop	5,0	50,0	55,0	DMG MORI DMU 80: 18 tấn
CNC Mezzanine	4,0	10,0	14,0	Tool store + office
IoT/SMT Line	3,0	5,0	8,0	SMT equipment light
Kho	3,0	15,0	18,0	Rack storage
Mái DC	2,5	1,5 (bảo trì)	4,0	+ tải gió + mưa

Y.3. Tiến độ Xây dựng Chi tiết

Y.3.1. Gantt Chart — Phase 1

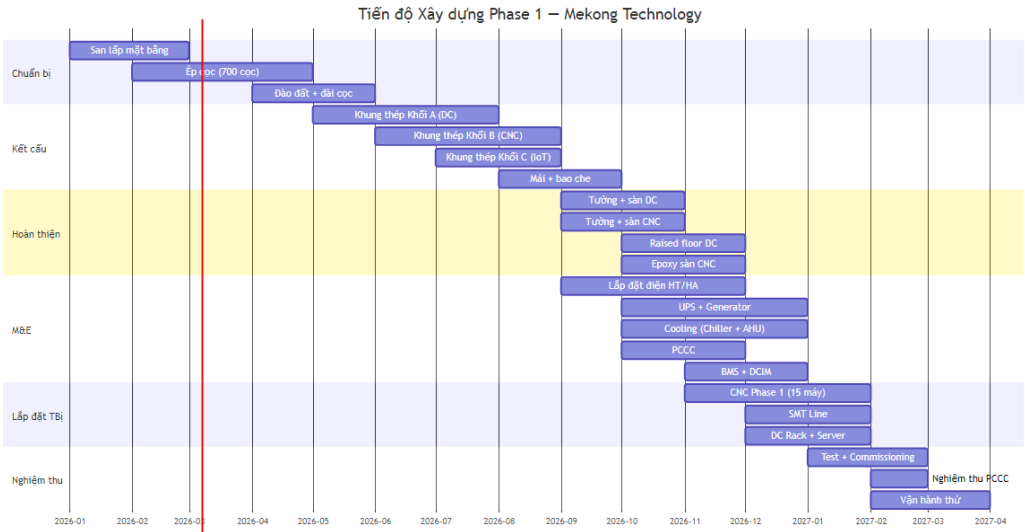


Diagram 73

Y.3.2. Nhà thầu Dự kiến

Hạng mục	Nhà thầu / Đơn vị	Budget (K)	Phương thức
Thiết kế kiến trúc	Arup / CPG (SG) / VN A-class	200-350	Design contest
Thi công xây dựng	Coteccons / Hòa Bình / Delta	4.000-5.000	Fixed-price tender
M&E tổng thầu	Schneider / Alpha ECC / Newtecons MEP	3.000-4.000	Design-Build
PCCC	SENKO / Hải Phòng Fire	800-1.000	Specialist sub
IT Infrastructure	FPT IS / CMC SI / NTT VN	500-800	Turnkey
Quản lý dự án (PMC)	Turner & Townsend / Arcadis VN	300-500	Fee-based
Giám sát	APAVE / TUV VN / Bureau Veritas	100-200	Inspection
Tổng xây dựng Phase 1		~9.000-12.000	

Y.3.3. Chi phí Xây dựng Chi tiết

Hạng mục	Đơn vị	Đơn giá (USD)	Khối lượng	Thành tiền (K)
San lấp	m ³	5	30.000	150
Ép cọc	m dài	18	14.000	252
Đài cọc + giằng	m ³ BTCT	120	3.000	360
Khung thép	tấn	1.800	500	900
Mái metal deck	m ²	35	18.000	630
Tường xây	m ²	25	5.000	125
Tường panel	m ²	45	8.000	360
Sàn BTCT	m ²	40	10.000	400
Raised floor (DC)	m ²	80	3.000	240
Epoxy sàn (CNC)	m ²	15	8.000	120
Điện HT + HA		Lump sum		800
Nước + PCCC		Lump sum		500
HVAC		Lump sum		600
Cảnh quan + đường		Lump sum		300
Chi phí khác		10%		474
Tổng Xây dựng Phase 1				~6.211

Y.4. Kiểm soát Chất lượng Xây dựng

Y.4.1. QC Checkpoints

Giai đoạn	Checkpoint	Tiêu chuẩn	Phương pháp	Pass Criteria
Cọc	PDA test (5% cọc)	TCVN 9393	Dynamic load test	$Q \geq Q_{design} \times 1,5$
BTCT	Cường độ mẫu	TCVN 4453	Nén mẫu 28 ngày	$\geq 30 \text{ MPa (C30)}$
Thép	Mill cert + kiểm tra kích thước	TCVN 5575	Caliper + tensile test	Theo spec
Hàn	100% visual + 20% UT/MT	AWS D1.1	Ultrasonic + Magnetic	No crack, no undercut
Sàn CNC	Độ phẳng	DIN 18202	Floor flatness tester	FF50/FL30 (CNC area)
Raised floor	Load test	MOB/PSA/PF2	4-point bending	$\geq 12 \text{ kN concentrated}$
Chống thấm	48h flood test	TCVN 5718	Water ponding	0 leak
PCCC	Nghiệm thu toàn bộ	QCVN 06	PC07 kiểm tra	100% pass

(Kết thúc Phụ lục Y — Chi tiết Xây dựng & Công trình)

PHỤ LỤC Z: MẪU HỢP ĐỒNG VÀ KHUNG PHÁP LÝ

Z.1. Danh mục Hợp đồng Cần chuẩn bị

Z.1.1. Ma trận Hợp đồng theo Giai đoạn

#	Hợp đồng	Bên ký kết	Giá trị dự kiến (K)	Giai đoạn	Template
1	HĐ Thuê đất KCNC	BQL KCNC	~2.000 (50Y)	Pre-build	Mẫu KCNC
2	HĐ Tư vấn thiết kế	Arch firm	200-350	Pre-build	FIDIC White
3	HĐ Thi công xây dựng	General contractor	5.000-6.000	Build	FIDIC Red
4	HĐ M&E Design-Build	MEP contractor	3.000-4.000	Build	FIDIC Yellow
5	HĐ Quản lý dự án (PMC)	PMC firm	300-500	All phases	Standard
6	PO CNC Machines	DMG MORI	5.400 (P1)	Pre-build	DMG standard + mods
7	PO UPS + Generator	Schneider / Cummins	800-1.200	Build	Manufacturer terms

#	Hợp đồng	Bên ký kết	Giá trị dự kiến (K)	Giai đoạn	Template
8	HĐ Vay ngân hàng	VCB/BIDV	9.500	Pre-build	Bank template
9	NDA (mẫu CNC customer)	FDI customers	N/A	Pre-ops	Mekong standard
10	HĐ Outsourcing CNC	CNC customers	100-500/KH	Ops	CNC MSA
11	SLA Colocation	DC customers	50-500/KH	Ops	DC SLA
12	HĐ Bán hàng IoT	Distributors	10-100	Ops	IoT Sales Agmt
13	HĐ License MekongOS	SaaS customers	5-50/KH/năm	Ops	SaaS Terms
14	HĐ Bảo hiểm	Bảo Việt / PVI	125-185/năm	Pre-ops	Insurance policy
15	HĐ Kiểm toán	Big 4 / tương đương	30-50/năm	Ops	Engagement letter
16	HĐ Bảo vệ	Security company	80/năm	Pre-ops	Service agreement
17	HĐ Cleaning + FM	FM company	50/năm	Ops	FM agreement
18	HĐ ISP (Internet)	VNPT + FPT + Viettel	30-50/năm	Pre-ops	Telco agreement

Z.1.2. Khung Điều khoản Chính — CNC Master Service Agreement (MSA)

Điều khoản	Nội dung tiêu biểu
Scope of Work	CNC machining services per customer drawing/3D model
Quality Standards	ISO 9001, IATF 16949, AS9100D (as applicable)
Pricing	Per-part or MHR basis, annual review ±5%
Payment Terms	Net 30 days from invoice date, 2% discount for Net 10
Lead Time	Standard: 15-20 working days; Express: 7-10 (+30% surcharge)
IP Ownership	Customer owns design IP; Mekong owns process know-how
NDA	Mutual NDA, 5-year term, ITAR compliance if applicable
Warranty	12 months or 1 usage cycle, whichever first
Liability Cap	100% of annual contract value
Force Majeure	Standard FM clause + pandemic + gov't action
Termination	90 days notice; immediate for material breach
Dispute Resolution	VIAC (Vietnam International Arbitration Center)
Governing Law	Vietnamese law

Điều khoản	Nội dung tiêu biểu
ITAR/EAR	Compliance statement for aerospace parts

Z.1.3. Khung Điều khoản — DC Colocation SLA

Điều khoản	Platinum	Gold	Silver
Uptime SLA	99,995%	99,99%	99,95%
Max Downtime/năm	26 phút	52 phút	4,4 giờ
Penalty per incident	5% MRC	3% MRC	2% MRC
Penalty cap	25% MRC/tháng	15%	10%
Response time (P1)	15 phút	30 phút	60 phút
Power per rack	8-30 kW	4-8 kW	2-4 kW
Bandwidth included	1 Gbps	500 Mbps	100 Mbps
Remote hands	Unlimited	4h/tháng	2h/tháng
Contract term	3-5Y	1-3Y	Monthly/1Y
Deposit	1 month MRC	2 months	3 months
Early termination	Remaining × 50%	Remaining × 75%	N/A (monthly)
Insurance required	Customer provides	Customer provides	N/A

Z.2. Khung Tuân thủ Pháp lý

Z.2.1. Checklist Tuân thủ Trước Vận hành

#	Hạng mục	Cơ sở pháp lý	Trạng thái	Deadline
1	IRC + ERC	Luật Đầu tư 2020	☐	Q4/2025
2	Hợp đồng thuê đất	Luật Đất đai 2024	☐	Q4/2025
3	Giấy phép xây dựng	Luật Xây dựng 2014	☐	Q1/2026
4	Phê duyệt ĐTM	Luật BVMT 2020	☐	Q1/2026
5	Phê duyệt PCCC thiết kế	Luật PCCC 2001 sửa đổi	☐	Q1/2026
6	Nghiệm thu PCCC công trình	NĐ 136/2020	☐	Q4/2026
7	Giấy phép hoạt động điện	Luật Điện lực 2004	☐	Q4/2026
8	Giấy phép xả thải	Luật BVMT 2020	☐	Q4/2026
9	Đăng ký ATVSLĐ	Luật ATVSLĐ 2015	☐	Q4/2026

#	Hạng mục	Cơ sở pháp lý	Trạng thái	Deadline
10	Giấy phép viễn thông	Luật Viễn thông 2023	☐	Q4/2026
11	Đăng ký NKTP/XKTP	Luật Hải quan 2014	☐	Q4/2026
12	Xác nhận ưu đãi KCNC	Luật CNC 2008, NĐ 13/2019	☐	Q1/2027
13	ISO 9001/14001/45001	Tự nguyện (required by customers)	☐	Q3/2027
14	IATF 16949	Tự nguyện (auto customers)	☐	Q4/2028
15	AS9100D	Tự nguyện (aero customers)	☐	Q2/2029

Z.2.2. Bảng Luật Áp dụng

#	Văn bản pháp luật	Năm	Liên quan tới
1	Luật Đầu tư 2020 (Luật số 61/2020/QH14)	2020	IRC, ưu đãi, thủ tục
2	Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 59/2020/QH14)	2020	ERC, governance
3	Luật Công nghệ cao 2008 (Luật số 21/2008/QH12)	2008	Ưu đãi KCNC
4	Luật Xây dựng 2014 (Luật số 50/2014/QH13) sửa đổi 2020	2014/2020	GPXD
5	Luật BVMT 2020 (Luật số 72/2020/QH14)	2020	ĐTM, GPMT
6	Luật PCCC 2001 sửa đổi 2013 + NĐ 136/2020	2001/2020	PCCC
7	Luật ATVSLĐ 2015 (Luật số 84/2015/QH13)	2015	An toàn lao động
8	Luật Thuế TNDN 2008 sửa đổi + NĐ 218/2013	2008/2013	CIT ưu đãi
9	Luật Đất đai 2024 (Luật số 31/2024/QH15)	2024	Thuê đất

#	Văn bản pháp luật	Năm	Liên quan tới
10	Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2022	2005/2022	Patent, trademark
11	Luật Viễn thông 2023 (Luật số 24/2023/QH15)	2023	License DC/ISP
12	Luật An ninh mạng 2018	2018	Data localization
13	NĐ 13/2019 về DN KHCN	2019	Ưu đãi R&D
14	TT 38/2015 sửa đổi TT 39/2018	2015/2018	Hải quan NK miễn thuế
15	QCVN 06:2021/BXD	2021	PCCC công trình

Z.2.3. VSIC Codes Đăng ký

VSIC Code	Mô tả	BU liên quan
2562	Gia công cơ khí, xử lý, tráng phủ kim loại	CNC
2599	Sản xuất sản phẩm khác từ kim loại	CNC
2611	Sản xuất linh kiện điện tử	IoT
2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi	IoT
2829	Sản xuất máy chuyên dụng khác	Robot
6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và hoạt động liên quan	DC
6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống	IoT/DC

(Kết thúc Phụ lục Z — Mẫu Hợp đồng & Khung Pháp lý)

PHỤ LỤC AA: CHUỖI CUNG ỨNG VÀ MUA SẴM (SUPPLY CHAIN & PROCUREMENT)

AA.1. Chiến lược Mua sắm Tổng thể

AA.1.1. Nguyên tắc Procurement

Nguyên tắc	Mô tả	Áp dụng
Dual sourcing	Mỗi danh mục ≥ 2 nhà cung cấp qualified	Tất cả vật tư > 10K USD/năm
Total Cost of Ownership (TCO)	Giá mua + Vận hành + Bảo trì + Disposal	Thiết bị > 50K USD
Local preference	Ưu tiên NCC nội địa nếu đạt spec (giảm lead time + miễn thuế NK)	Vật tư tiêu hao, xây dựng

Nguyên tắc	Mô tả	Áp dụng
Strategic partnership	Hợp tác dài hạn, volume commitment → giảm giá 5-15%	Phôi CNC, PCB, IC components
Compliance	NCC phải đạt ISO 9001 (tối thiểu); ưu tiên IATF 16949 / AS9100	CNC materials
Sustainability	Ưu tiên NCC có chứng nhận ISO 14001, conflict-free minerals	ESG requirement cho FDI clients

AA.1.2. Phân loại NCC theo Mô hình Kraljic

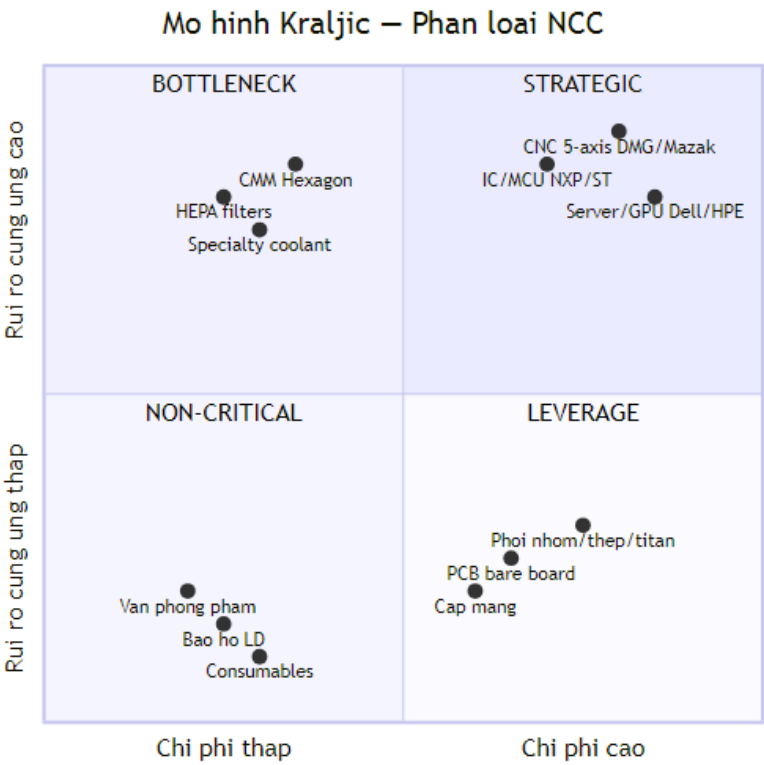


Diagram 74

AA.2. Danh mục Nhà cung cấp Chiến lược

AA.2.1. Thiết bị CNC (Khối B)

STT	Danh mục	NCC Chính	NCC Dự phòng	Lead Time	Điều khoản TT	Ghi chú
1	CNC 5-axis (8 máy)	DMG Mori (Japan/Germany)	Mazak (Japan)	16-24 tuần	30% advance, 70% L/C at sight	FOB Japan, thuế NK 0% (DA KCNC) [C]
2	CNC 3-axis (12 máy)	Mazak (Japan)	Haas (USA)	12-18 tuần	30/70 L/C	FOB, giá 80-250K/máy
3	CNC Turning (4 máy)	Doosan (Korea)	Mazak (Japan)	10-14 tuần	30/70 L/C	

STT	Danh mục	NCC Chính	NCC Dự phòng	Lead Time	Điều khoản TT	Ghi chú
4	CNC Wire EDM (2 máy)	Mitsubishi (Japan)	Sodick (Japan)	12-16 tuần	L/C 60 days	
5	CNC Swiss-type (2 máy)	Citizen (Japan)	Star (Japan)	14-20 tuần	L/C	Cho chi tiết y tế
6	CMM (2 máy)	Hexagon (Sweden)	Zeiss (Germany)	10-14 tuần	50/50	Accuracy ≤ 1,5 + L/300 μm
7	Roughness Tester	Mitutoyo (Japan)	—	4-6 tuần	COD/TT	Surftest SJ-210
8	Hardness Tester	Mitutoyo (Japan)	—	4-6 tuần	COD/TT	HR-530
9	Dụng cụ cắt (Tooling)	Sandvik Coromant	Kennametal / Iscar	2-4 tuần	Net 30 days	Buffer stock 90 ngày
10	Coolant (MWF)	Blaser Swisslube	Fuchs	2-4 tuần	Net 30	B-Cool 755 (low mist)
11	Dầu hydraulic / way oil	Shell Tellus / Mobil DTE	Total	1-2 tuần	Net 30	Tồn kho 60 ngày

AA.2.2. Vật tư CNC (Phôi)

STT	Loại phôi	Spec tiêu biểu	NCC nội địa	NCC quốc tế	Giá tham khảo	Volume/năm
1	Nhôm 6061-T6	Ø20-200mm, tấm 5-50mm	Nhôm Đồng Anh	Alcoa (USA)	3,0-3,5 USD/kg	~50 tấn
2	Nhôm 7075-T6	Ø30-150mm	—	Aleris (EU), Kobe Steel (JP)	5,0-6,0 USD/kg	~15 tấn
3	Thép SS 304/316	Ø20-150mm, tấm	POSCO Việt Nam	POSCO (KR)	3,5-5,0 USD/kg	~30 tấn
4	Thép SKD61/SKD11	Block, round bar	Daido (JP)	Daido, Hitachi Metals	8-12 USD/kg	~10 tấn
5	Titanium Ti-6Al-4V	Ø20-100mm	—	TIMET (USA), VSMPO (RU)	30-50 USD/kg	~2 tấn
6	Đồng C101/C110	Ø10-80mm	Đồng Việt	Mitsubishi Materials	8-10 USD/kg	~5 tấn
7	Nhựa kỹ thuật (POM, PEEK)	Rod, sheet	—	Ensinger (DE)	15-300 USD/kg	~2 tấn

[C] Chi phí phôi ước tính Y1: 400-600K USD; Y5 (full capacity): 1.200-1.800K USD. Chiến lược: ký hợp đồng blanket order 6 tháng với NCC chính để lock giá phôi nhôm/thép trong bối cảnh biến động giá kim loại.

AA.2.3. Thiết bị IoT/SMT (Khối C)

STT	Danh mục	NCC	Lead Time	CAPEX (K USD)	Ghi chú
1	SMT Pick & Place	Fuji NXT III / Yamaha YSM20R	12-16 tuần	250-450	Tốc độ 40K-80K CPH
2	Solder Paste Printer	DEK / MPM	8-12 tuần	40-80	
3	Reflow Oven	Heller 1913 MK7	8-12 tuần	60-100	13 zones, N ₂ capability
4	AOI (Automated Optical Inspection)	Koh Young / Yamaha	8-12 tuần	80-150	3D AOI, AI-powered
5	Wave Solder (for THT)	ERSA / Vitronics	8-12 tuần	30-50	
6	X-Ray (BGA inspection)	Nordson DAGE	10-14 tuần	60-100	Micro-focus
7	ICT / FCT Tester	Keysight / National Instruments	6-10 tuần	40-80	Custom fixtures
8	Conformal Coating	Nordson Asymtek	6-8 tuần	20-30	Selective coating
9	Stencil Laser Cut	Custom per BOM	1-2 tuần	0,5-1 per stencil	Multiple vendors

AA.2.4. Thiết bị Datacenter (Khối A)

STT	Danh mục	NCC	Lead Time	CAPEX/unit (K USD)	Số lượng	Ghi chú
1	Server Rack (42U, 800mm)	Rittal / Chatsworth CPI	6-8 tuần	1,2-2,0	100	Perforated door, 10kW/rack
2	PDU (intelligent, per-outlet metering)	Schneider / Raritan	4-6 tuần	0,5-1,5	200	Dual PDU per rack
3	UPS 2N (Modular)	Schneider Galaxy VX	12-16 tuần	150-250 (per string)	4	2 × 300 kVA per string
4	Battery (Li-ion)	Samsung SDI / CATL	12-16 tuần	80-120 (per string)	4	15 min at full load
5	CRAC (InRow)	Schneider / Vertiv	8-12 tuần	25-35	10	60 kW each
6	Chiller	Daikin / Trane	10-14 tuần	80-120	4	250 kW each
7	Generator (N+1)	Cummins / Caterpillar	12-18 tuần	80-120	4	750 kVA each,

STT	Danh mục	NCC	Lead Time	CAPEX/unit (K USD)	Số lượng	Ghi chú
						SCR/DPF
8	ATS (Automatic Transfer Switch)	ASCO / ABB	6-8 tuần	8-15	4	≤ 10s transfer
9	Fire Suppression (NOVEC 1230)	Kidde / Fike	6-8 tuần	20-35 per zone	6 zones	Clean agent
10	Structured Cabling (Cat6A + OM4)	CommScope / Panduit	4-6 tuần	30-50 (lot)	1	

AA.3. Quản lý Tồn kho và Logistics

AA.3.1. Phân loại Tồn kho theo ABC–XYZ

Phân loại	Đặc điểm	Ví dụ	Chính sách
AX	Giá trị cao, nhu cầu ổn định	Phôi nhôm 6061, coolant	JIT, blanket order, EOQ optimize
AY	Giá trị cao, nhu cầu biến động	Titanium, Inconel	Safety stock 90 ngày, forward contract
AZ	Giá trị cao, nhu cầu không dự báo	Dụng cụ đặc biệt, phôi prototype	MTO (Make-to-Order), không tồn kho
BX	Giá trị trung bình, ổn định	IC components, PCB	Min-Max, reorder point
BY	Giá trị trung bình, biến động	Dụng cụ cắt (insert, drill)	Safety stock 60 ngày
CX	Giá trị thấp, ổn định	Ốc vít, bao bì, dầu	Kanban, vendor-managed inventory

AA.3.2. KPI Tồn kho

KPI	Mục tiêu Y1	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5
Inventory Turnover	6×	8×	10×
Days of Inventory Outstanding (DIO)	60 ngày	45 ngày	36 ngày
Stockout Rate	< 5%	< 2%	< 1%
Dead Stock (% tổng)	< 3%	< 2%	< 1%
Inventory Accuracy	95%	98%	99,5%
Giá trị tồn kho (K USD)	800-1.200	1.000-1.500	1.200-1.800

AA.3.3. Logistics Inbound

Tuyến	Phương thức	Thời gian	Tần suất	Ghi chú
Japan → VN	Sea freight (FCL/LCL)	10-15 ngày	2 lần/tháng	CNC machines, tooling
Japan → VN	Air freight (urgent)	3-5 ngày	As needed	Spare parts khẩn
Korea → VN	Sea freight	7-12 ngày	2 lần/tháng	Phôi thép POSCO
EU (Germany/Sweden) → VN	Sea freight	25-35 ngày	1 lần/tháng	CMM, precision tools
USA → VN	Sea freight	20-30 ngày	1 lần/tháng	Haas machines
Nội địa	Truck	1-3 ngày	Weekly	Phôi nhôm Đồng Anh
Nội địa (TPHCM)	Truck	Same day	Daily	Consumables

AA.3.4. Kho Vật tư — Thiết kế

Khu vực	Diện tích (m ²)	Nhiệt độ	Chức năng
Kho phôi kim loại	300	< 35°C, khô ráo	Rack 3 tầng cho bar stock + sheet
Kho dụng cụ cắt	80	Điều hòa 22-25°C	Tool cabinet (Garant / Kennametal), humidity < 60%
Kho hóa chất	50	Thông gió + PCCC đặc biệt	Coolant, dầu, dung môi — tách biệt
Kho linh kiện IoT	100	22-25°C, ESD protected	IC, PCB, components — moisture barrier bag
Kho thành phẩm	200	22-25°C, ESD nếu cần	Ready-to-ship area
Receiving area	100	Có mái che	Dock leveler, QC incoming
Kho phế liệu	60	Ngoài trời (mái che)	Phoi CNC, scrap metal → tái chế
Tổng kho	~890 m ²		

AA.4. Quy trình Mua hàng (Procurement Process)

AA.4.1. Sơ đồ Quy trình

Bước	Hoạt động	Phụ trách	SLA	Hệ thống
1	Yêu cầu mua hàng (PR)	Bộ phận sử dụng	Ngay	ERP
2	Xét duyệt PR	Quản lý bộ phận → Procurement Manager	≤ 2 ngày	ERP workflow
3	RFQ gửi NCC (≥ 3 NCC cho > 10K USD)	Procurement	≤ 3 ngày	Email / Portal

Bước	Hoạt động	Phụ trách	SLA	Hệ thống
4	So sánh báo giá + TCO analysis	Procurement	≤ 5 ngày	Evaluation matrix
5	Phê duyệt PO	CFO (> 50K) / CEO (> 200K)	≤ 2 ngày	ERP
6	Đặt hàng (PO)	Procurement	≤ 1 ngày	ERP → NCC
7	Theo dõi giao hàng	Procurement + Logistics	Weekly	Dashboard
8	Nhận hàng + IQC (Incoming Quality Control)	Warehouse + QC	≤ 2 ngày	ERP + QMS
9	Nhập kho	Warehouse	Same day	ERP
10	Thanh toán	Finance	Theo hợp đồng	ERP → Bank

AA.4.2. Ma trận Thẩm quyền Phê duyệt

Giá trị PO (USD)	Người phê duyệt	Yêu cầu bổ sung
< 5.000	Department Manager	1 báo giá
5.000 — 50.000	Procurement Manager + CFO	≥ 3 báo giá
50.000 — 200.000	CFO + CEO	≥ 3 báo giá + TCO
> 200.000	CEO + Board approval	≥ 3 báo giá + TCO + NCC audit

AA.5. Đánh giá Nhà cung cấp (Supplier Scorecard)

Tiêu chí	Trọng số	Thang điểm	Ghi chú
Quality (PPM defect rate)	30%	< 100 PPM = 5, 100-500 = 3, > 500 = 1	Đo hàng quý
Delivery (OTD — On-Time Delivery)	25%	> 95% = 5, 85-95% = 3, < 85% = 1	Đo hàng quý
Cost competitiveness	20%	Best price = 5, ±5% = 3, > +10% = 1	So sánh market
Responsiveness	10%	< 24h reply = 5, < 72h = 3, > 72h = 1	
Certifications (ISO/IATF)	10%	IATF = 5, ISO 9001 = 3, No cert = 0	
Sustainability (ESG)	5%	ISO 14001 + RoHS = 5	Yêu cầu từ FDI clients

Ngưỡng: - Score ≥ 4,0: **Preferred supplier** — volume commitment, ưu tiên PO - Score 3,0-3,9: **Approved supplier** — sử dụng bình thường - Score 2,0-2,9: **Probation** — Corrective Action Request (CAR), re-audit 90 ngày - Score < 2,0: **Disqualified** — chuyển sang NCC dự phòng

(Kết thúc Phụ lục AA — Chuỗi Cung ứng & Mua sắm)

PHỤ LỤC BB: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ TRI THỨC (TRAINING ACADEMY & KNOWLEDGE MANAGEMENT)

BB.1. Chiến lược Đào tạo Tổng thể

BB.1.1. Mô hình 70-20-10

Phương pháp	Tỷ trọng	Hình thức	Ví dụ
Học từ thực hành (OJT)	70%	On-the-job, mentoring, project-based	Vận hành máy CNC dưới sự hướng dẫn senior
Học từ đồng nghiệp	20%	Coaching, peer review, community of practice	Knowledge sharing sessions hàng tuần
Đào tạo chính quy	10%	Classroom, e-learning, certification	Khóa Mastercam/NX, AWS, PMP

BB.1.2. Ngân sách Đào tạo

Năm	Headcount	Budget/người (USD)	Tổng (K USD)	% Revenue
Y1	85	1.200	102	3,0% (investment phase)
Y2	150	1.000	150	2,0%
Y3	220	800	176	1,5%
Y5	300	700	210	1,0%
10Y cumulative			~1.600	avg 1,3%

[B] Benchmark: Samsung Việt Nam chi ~2% revenue cho đào tạo; Bosch ~1,5%. Target Mekong: 1,0-2,0% sau giai đoạn đầu tư ban đầu.

BB.2. Chương trình Đào tạo theo Khối

BB.2.1. CNC Operator / Programmer Training Path

Cấp độ	Thời gian	Nội dung	Đánh giá	Chứng chỉ	Lương (triệu VND)
Level 1: CNC Operator	3 tháng	An toàn LĐ, đọc bản vẽ, setup máy 3-axis, đo kiểm cơ bản	Thi thực hành (setup + run 5 parts)	Internal L1	10-13
Level 2: CNC Setter	6 tháng (sau L1)	Multi-setup, tool life mgmt, SPC basics, problem solving	Thực hành: chạy 3 job phức tạp, Cpk ≥ 1,33	Internal L2	13-17

Cấp độ	Thời gian	Nội dung	Đánh giá	Chứng chỉ	Lương (triệu VND)
Level 3: CNC Programmer	12 tháng (sau L2)	CAM programming (Mastercam/NX), fixture design, cycle time optimize	Lập trình + chạy 5-axis part từ bản vẽ	Internal L3 + Mastercam Cert	17-23
Level 4: Senior Programmer	24 tháng (sau L3)	Multi-axis complex, macro programming, post-processor customize	Dự án tối ưu hóa (giảm $\geq 15\%$ cycle time)	Siemens NX Cert	23-30
Level 5: CNC Process Engineer	36+ tháng (sau L4)	Process planning, new material development, FMEA, PPAP	Lead NPI project, qualify new material	Six Sigma Green Belt	30-40

BB.2.2. IoT/Embedded Engineer Training Path

Cấp độ	Thời gian	Nội dung	Đánh giá	Chứng chỉ
L1: Junior Embedded	3 tháng	C/C++, RTOS, GPIO/UART/SPI/I2C, schematics reading	Code review + demo project	Internal
L2: Embedded Developer	9 tháng (sau L1)	BLE/WiFi/LoRa stack, power optimization, DFM/DFT, PCB review	Ship 1 firmware release	PSoC/STM32 Cert
L3: Senior Embedded	18 tháng (sau L2)	Architecture design, security (TLS/DTLS), OTA, FOTA, CI/CD	Lead module development	AWS IoT Core Cert
L4: IoT Architect	30+ tháng (sau L3)	System architecture, cloud integration, ML@edge, patent filing	Design product from concept to mass production	AWS SA Professional

BB.2.3. Datacenter Operations Training Path

Cấp độ	Thời gian	Nội dung	Đánh giá	Chứng chỉ
L1: DC Technician	3 tháng	DCIM basics, cabling, rack & stack, physical security	Hands-on assessment	CompTIA Server+
L2: DC Engineer	9 tháng (sau L1)	M&E systems, UPS/Generator, HVAC, fire suppression, monitoring	Incident response drill	CDCP (Certified DC Professional)
L3: Senior DC Engineer	18 tháng (sau L2)	Capacity planning, PUE optimization, DR planning, vendor management	Lead facility upgrade project	CDCS (Certified DC Specialist)
L4: DC Manager	30+ tháng (sau L3)	SLA management, client relations, CAPEX	Manage NOC team, achieve 99,995%	CDFOM (EPI)

Cấp độ	Thời gian	Nội dung	Đánh giá	Chứng chỉ
		planning, compliance audits	uptime	

BB.3. Chương trình Đào tạo Chuyên sâu (Specialized Training)

BB.3.1. Chất lượng (Quality)

Khóa học	Đối tượng	Thời lượng	Nội dung	Nhà cung cấp	Chi phí (USD/người)
Core Tools (FMEA, MSA, SPC, PPAP, APQP)	QC/QA, Process Engineer	40 giờ	AIAG Core Tools 2019	BSI / TUV	500-800
GD&T (ASME Y14.5)	CNC Programmer, QC	24 giờ	Geometric Dimensioning & Tolerancing	ETI / Internal	300-500
Six Sigma Green Belt	Process Engineer, Manager	80 giờ	DMAIC methodology, Minitab	ASQ accredited	1.500-2.500
Six Sigma Black Belt	Senior Engineer, Director	160 giờ	Advanced statistics, DOE, Lean Six Sigma	ASQ accredited	3.000-5.000
ISO 9001:2015 Internal Auditor	QMS team	24 giờ	Audit planning, execution, reporting	BSI / Bureau Veritas	300-500
IATF 16949 Awareness	All CNC staff	8 giờ	Automotive quality requirements	TUV	200-300
IPC-A-610 Inspector	IoT QC	32 giờ	Acceptability of Electronic Assemblies	IPC trainer	500-800

BB.3.2. An toàn và Môi trường (EHS)

Khóa học	Đối tượng	Thời lượng	Tần suất	Bắt buộc?
Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1	CEO, Directors	16 giờ	2 năm/lần	Bắt buộc (Luật ATVSLĐ)
Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3	Operators, Technicians	16 giờ	Hàng năm	Bắt buộc
Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 4	All staff	16 giờ	Hàng năm	Bắt buộc
PCCC cơ bản	All staff	8 giờ	Hàng năm	Bắt buộc
PCCC chuyên sâu (DC)	DC team	16 giờ	Hàng năm	Bắt buộc
Ứng phó sự cố hóa chất	CNC team, Warehouse	8 giờ	Hàng năm	Bắt buộc

Khóa học	Đối tượng	Thời lượng	Tần suất	Bắt buộc?
ESD Awareness	IoT team	4 giờ	Hàng năm	Bắt buộc
Ergonomics	CNC operators	4 giờ	Hàng năm	Khuyến khích
First Aid / CPR	10% staff (ERT team)	16 giờ	2 năm/lần	Bắt buộc

BB.4. Quan hệ Đối tác Đào tạo (Training Partnerships)

Đối tác	Lĩnh vực	Hình thức	Chi tiết
ĐH Bách khoa TP HCM (HCMUT)	CNC, Cơ khí, IoT	Internship program, capstone project, adjunct faculty	10-15 interns/năm, 2-3 capstone/năm
ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH)	IoT, Embedded	Dual education, Lab sponsorship	Lab MekongIoT tại HUTECH
Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng	CNC Operator	Apprenticeship 12 tháng	5-10 apprentices/năm
FPT Polytechnic	IT Infrastructure, Network	Training pipeline	Tuyển 5-8 DC technicians/năm
Siemens / Fanuc / Mazak	CNC, CAD/CAM	Vendor training at factory	Khi mua máy: 5-10 ngày training included
AWS / Microsoft	Cloud, IoT, AI	Online certification + lab credit	AWS re:Start program
BSI / TUV	Quality, EHS	Certification training	On-site training negotiated

BB.4.1. Chương trình Học bổng Mekong

Hạng mục	Chi tiết
Đối tượng	SV năm 3-4, chuyên ngành Cơ khí/Điện tử/CNTT
Số lượng	10-15 suất/năm
Giá trị	20.000.000 VND/suất + cam kết thực tập 6 tháng
Ràng buộc	Nếu tuyển dụng sau tốt nghiệp: cam kết 2 năm, hoàn học bổng nếu rời sớm
Ngân sách	~10K USD/năm
Mục tiêu	Pipeline 60-70% chuyển thành nhân viên chính thức

BB.5. Hệ thống Quản lý Tri thức (Knowledge Management System)

BB.5.1. Nền tảng KMS

Thành phần	Công cụ	Chức năng	Chi phí (K USD/năm)
Wiki nội bộ	Confluence (Atlassian)	SOPs, WI, lessons learned, technical notes	3-5

Thành phần	Công cụ	Chức năng	Chi phí (K USD/năm)
LMS (Learning Management System)	Moodle (self-hosted) hoặc TalentLMS	E-learning, quiz, certification tracking	2-5
Document Management	SharePoint (M365)	Controlled documents, revision management	Included in M365
Video Library	Internal server + OBS Studio	Training videos, machine setup guides	1-2 (storage)
Skill Matrix Database	Custom (or SkillsBase SaaS)	Competency tracking per employee	1-3

BB.5.2. Tài liệu Kỹ thuật Chuẩn hóa

Loại tài liệu	Mã	Ví dụ	Người viết	Người duyệt	Review cycle
SOP (Standard Operating Procedure)	SOP-CNC-xxx	SOP-CNC-001: Setup CNC 5-axis DMG	Process Engineer	Quality Manager	12 tháng
WI (Work Instruction)	WI-CNC-xxx	WI-CNC-042: Đo hardness HRC trên Mitutoyo	Operator/Technician	Supervisor	12 tháng
One Point Lesson (OPL)	OPL-xxx	OPL-015: Cách nhận biết tool wear trên insert	Senior Operator	Không cần	24 tháng
Lesson Learned	LL-yyyy-xxx	LL-2026-003: Root cause chatter trên 7075 face milling	Anyone	Technical Lead	Permanent
Technical Standard	TS-xxx	TS-012: Surface finish requirements per material	Engineering	Quality + Client	24 tháng

BB.5.3. Chỉ số KM

KPI	Mục tiêu Y1	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5
Số SOP/WI được chuẩn hóa	50	200	400
E-learning courses available	10	40	80
Training hours/người/năm	80	60	50
Certification rate (% staff có chứng chỉ chuyên môn)	30%	50%	70%
Knowledge contribution (bài viết wiki/tháng)	5	20	40
OPL submitted/tháng	2	8	15

KPI	Mục tiêu Y1	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5
Skill matrix completion	80%	95%	100%

BB.6. Lộ trình Triển khai KMS

Phase	Thời gian	Hoạt động	Output
Phase 1	M1-M3	Setup Confluence + SharePoint, skill matrix template, identify critical SOPs	20 SOPs, wiki live
Phase 2	M4-M6	LMS setup (Moodle), video recording CNC setup, first e-learning courses	5 e-learning modules
Phase 3	M7-M12	Full SOP library for CNC (50 SOPs), IoT (20 WIs), DC (20 SOPs)	90 documents
Phase 4	Y2	Advanced e-learning, vendor training integration, certification tracking	LMS fully integrated
Phase 5	Y3+	AI-assisted search (RAG on knowledge base), auto-translation (VN ↔ EN ↔ JP)	Smart KMS

(Kết thúc Phụ lục BB — Học viện Đào tạo & Quản lý Tri thức)

PHỤ LỤC CC: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TÍCH HỢP (INTEGRATED QMS)

CC.1. Lộ trình Chứng nhận Chất lượng

CC.1.1. Roadmap 5 năm

Năm	Chứng nhận	Phạm vi	Thời gian triển khai	CAPEX (K USD)	Ý nghĩa Kinh doanh
Y1	ISO 9001:2015	Toàn công ty (3 BU)	6-9 tháng	15-25	Yêu cầu cơ bản, mở cửa thị trường
Y1	ISO 14001:2015	Toàn công ty	6-9 tháng (đồng thời ISO 9001)	10-15	EIA compliance, ESG requirement
Y1	ISO 45001:2018	Toàn công ty	6-9 tháng (IMS)	5-10	OHSMS, giảm bảo hiểm LĐ

Năm	Chứng nhận	Phạm vi	Thời gian triển khai	CAPEX (K USD)	Ý nghĩa Kinh doanh
Y2	IATF 16949:2016	Khối CNC	12-18 tháng	30-50	Bắt buộc cho ngành ô tô
Y2	ISO 27001:2022	Khối DC	9-12 tháng	20-30	Data security cho khách hàng
Y3	AS9100D	Khối CNC (aerospace)	12-18 tháng	25-40	Mở segment hàng không (Boeing, Airbus Tier 2+)
Y3	ISO 13485:2016	Khối CNC (medical)	12-15 tháng	20-30	Mở segment thiết bị y tế
Y3	Uptime Tier III Certification	Khối DC	6-12 tháng	40-60	Xác nhận SLA 99,982%+
Y4	NADCAP	Khối CNC (special processes)	12-18 tháng	15-25	Xử lý bề mặt/anode đạt chuẩn hàng không
Y5	ISO 50001:2018	Toàn công ty	6-9 tháng	5-10	Quản lý năng lượng, ESG badge
	Tổng CAPEX chứng nhận (5Y)			~200-320	

CC.1.2. Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS — Integrated Management System)




Diagram 75

CC.2. Core Tools (IATF 16949 Requirement)

CC.2.1. APQP — Advanced Product Quality Planning

Phase	Tên	Hoạt động chính	Output	Thời gian
1	Plan & Define	Voice of Customer, benchmarking, preliminary BOM	Design Goals, Reliability Goals	2-4 tuần
2	Product Design	DFMEA, DV Testing, design review, prototype	DFMEA, Drawing release, DVP&R	4-8 tuần

Phase	Tên	Hoạt động chính	Output	Thời gian
3	Process Design	PFMEA, process flow, floor plan, MSA plan	PFMEA, Control Plan (prototype), floor plan	4-8 tuần
4	Product & Process Validation	Production trial run, MSA, SPC initial study, PPAP submission	PPAP package (18 elements), Cpk $\geq$ 1,67 initial	4-8 tuần
5	Feedback & Corrective Action	Launch, lessons learned, continuous improvement	Warranty data, reduced variation	Ongoing

CC.2.2. PPAP — Production Part Approval Process (18 Elements)

#	Element	Mô tả	Trách nhiệm	Level 3 submit?
1	Design Records	Bản vẽ kỹ thuật approved	Engineering	Có
2	Engineering Change Documents	ECN/ECR nếu có	Engineering	Có
3	Customer Engineering Approval	Nếu yêu cầu	Engineering	Nếu có
4	Design FMEA	Phân tích rủi ro thiết kế	Engineering	Có
5	Process Flow Diagram	Sơ đồ quy trình sản xuất	Process Eng.	Có
6	Process FMEA	Phân tích rủi ro quy trình	Process Eng.	Có
7	Control Plan	Kế hoạch kiểm soát sản xuất	Quality	Có
8	MSA (Measurement System Analysis)	GR&R, Bias, Linearity	Quality	Có
9	Dimensional Results	Đo kiểm toàn bộ kích thước (CMM report)	Quality	Có — Full Layout
10	Material/Performance Test	Hardness, tensile, chem. analysis — cert.	Quality + Lab	Có
11	Initial Process Study (SPC)	Cpk $\geq$ 1,67 trên đặc tính Critical	Quality	Có
12	Qualified Lab Documentation	Chứng nhận ISO 17025 nếu outsource; scope nội bộ	Quality	Có
13	Appearance Approval Report (AAR)	Nếu có yêu cầu bề mặt	Quality	Nếu có
14	Sample Production Parts	300 pcs minimum run	Production	Có — gửi mẫu

#	Element	Mô tả	Trách nhiệm	Level 3 submit?
15	Master Sample	1 mẫu lưu trữ, seal + label	Quality	Có
16	Checking Aids	Fixture, gauge, go-no-go	Quality	Có
17	Customer-Specific Requirements	Per customer added requirements	Quality	Nếu có
18	Part Submission Warrant (PSW)	Summary + sign-off	Quality Manager	Có — ký duyệt

CC.2.3. PFMEA — Process FMEA Template (Ví dụ: CNC 5-axis Milling)

Process Step	Failure Mode	Effect	Sev.	Cause	Occ.	Current Control	Det.	RPN	Action
Workpiece clamping	Lệch tâm (misalignment)	Kích thước OOT, scrap	8	Fixture wear, contamination	4	Visual check + indicator	5	160	Add dial indicator check $\pm 0,02\text{mm}$
Tool loading	Sai tool số (wrong insert)	Surface finish NG, rework	6	Manual error	3	Tool sheet verify	4	72	Barcode scan on tool holder
5-axis milling	Chatter / rung	Surface NG, tool break	7	Speed/feed incorrect, tool overhang	3	Operator listen + visual	6	126	Vibration sensor auto-stop
Coolant flow	Coolant thiếu/tắc	Tool overheating → break	8	Nozzle clogged, pump fail	3	Flow sensor alarm	3	72	Preventive clean weekly
In-process check	Bỏ qua đo kiểm	Defect parts to next op	9	Operator skip check	2	eSOP mandatory scan	3	54	MES enforcement
Deburring	Bavia còn lại	Customer complaint	5	Manual deburring miss	4	Visual 100%	5	100	Add tactile gauge check
CMM measurement	Đo sai (env. temp shift)	False PASS → defect ship	9	Temp $\neq 20^{\circ}\text{C}$	2	Temp log every 2h	3	54	Auto-compensate + reject if $\Delta T > 1^{\circ}\text{C}$
Packaging	Scratch / dent	Customer complaint, rework	6	Insufficient protection	3	Visual check	4	72	Custom VCI + foam insert

RPN Threshold: > 100 → Corrective Action Required. Target: Reduce all RPN < 100 within 6 months of production start.

CC.3. Hệ thống Đo lường và Kiểm tra (Metrology & Inspection)

CC.3.1. Phòng Đo CMM Clean Room

Thông số	Yêu cầu	Ghi chú
Diện tích	60-80 m ²	Tách biệt khỏi workshop
Nhiệt độ	20 ± 0,5 °C (ISO 1:2016)	Precision AHU (Stulz CyberAir)
Humidity	45-55% RH	Dehumidifier integrated
Rung động	VC-A (< 50 µm/s @ 1-80Hz)	Anti-vibration pad / isolated foundation
Bụi	ISO 14644 Class 7 (≤ 352.000 particles ≥ 0,5µm/m ³)	HEPA H13 filtered supply
Ánh sáng	≥ 500 lux, CRI > 80	LED panel, no direct sunlight
Sàn	Anti-static epoxy + damping	ESD protection + vibration isolation
Access	Restricted, badge + gown + shoe cover	Airlock entry

CC.3.2. Thiết bị Đo kiểm Chi tiết

STT	Thiết bị	Hãng	Model	Accuracy	CAPEX (K USD)	Số lượng	Tổng (K USD)
1	CMM (Bridge type)	Hexagon	Global S Chrome 9.15.9	1,5 + L/300 µm	150-200	2	350
2	CMM Software	Hexagon	PC-DMIS 2024	—	8-15	2 license	20
3	Surface Roughness Tester	Mitutoyo	Surftest SJ-210	0,01 µm resolution	3-5	2	8
4	Hardness Tester (Rockwell)	Mitutoyo	HR-530	±0,5 HRC	8-12	1	10
5	Profile Projector	Mitutoyo	PJ-A3000	10 µm	5-8	1	7
6	Height Gauge (Digital)	Mitutoyo	QM-Height 600	1,1 µm	3-5	2	8
7	Bore Gauge Set	Mitutoyo	Holtest 568 series	3-5 µm	2-3	3 sets	8
8	Micrometer Set (0-150mm)	Mitutoyo	Digimatic 293	1 µm	0,5-1	10	8
9	Caliper Digital (0-300mm)	Mitutoyo	ABS Digimatic 500	20 µm	0,2-0,4	20	6
10	Go/No-Go Gauge	Custom	Per drawing	Per spec	0,5-2	50 sets	50

STT	Thiết bị	Hãng	Model	Accuracy	CAPEX (K USD)	Số lượng	Tổng (K USD)
	(custom)						
11	Thread Gauge Set	Mitutoyo / SPI	Metric + UNC/UNF	Class 6g/6H	0,1-0,3	20 sets	5
12	Gauge Block Set (Grade 1)	Mitutoyo	BM1-112-1	ISO 3650 Grade 1	2-4	2	6
13	Optical Flat	—	$\lambda/4$ flatness	Interference fringe	0,5-1	2	1,5
14	CMM Stylus Kit	Renishaw	Assorted	—	1-2	lot	2
15	Calibration Equipment	Various	Gauge blocks, ring gauges	Reference std.	5-10	lot	8
	Tổng QA/QC Equipment						~498

[C] Tổng thiết bị QA/QC: ~498K USD. Đã bao gồm trong CAPEX tổng 47.500K. So với bảng Phụ lục Q (670K) — chênh lệch do phạm vi: CC.3.2 chỉ tính hardware; Q bao gồm cả calibration services, fixtures, software licenses, và spare parts 3 năm.

CC.3.3. Kế hoạch Hiệu chuẩn (Calibration Schedule)

Thiết bị	Chu kỳ	Tiêu chuẩn	Đơn vị hiệu chuẩn	Chi phí/lần (USD)
CMM	12 tháng	ISO 10360-2	Hexagon Service Center (VN) hoặc QUATEST 3	1.500-2.500
Surface Roughness Tester	12 tháng	ISO 4287 reference specimen	QUATEST 3	150-300
Hardness Tester	12 tháng	ASTM E18 (Rockwell)	QUATEST 3	200-400
Micrometer/Caliper	12 tháng	ISO 3611 / ISO 13385	In-house (gauge blocks) + QUATEST annual	50-100
Gauge Block Set	24 tháng	ISO 3650	QUATEST 3 / NIST-traceable	500-1.000
Go/No-Go Gauge	6 tháng	Per drawing tolerance	In-house (CMM verify)	20-50
Thread Gauge	12 tháng	ISO 1502	QUATEST 3	50-100
OPEX hiệu chuẩn/năm				~8-15K

CC.4. Quản lý Không phù hợp và Cải tiến (NCR & CAPA)

CC.4.1. Quy trình NCR

Bước	Hoạt động	SLA	Trách nhiệm	Hệ thống
1	Phát hiện (Detection)	Ngày	Anyone (operator, QC, client)	QMS app / paper form
2	Ghi nhận NCR	≤ 4 giờ	QC Inspector → Quality Engineer	QMS database
3	Containment (tạm giữ/kiểm tra lot)	≤ 8 giờ	Quality Engineer + Production	Quarantine area, MES flag
4	Root Cause Analysis (RCA)	≤ 48 giờ	Cross-functional team	5-Why / Fishbone / 8D
5	Corrective Action	≤ 5 ngày làm việc	Process Owner	CAR form
6	Verification (kiểm tra hiệu quả)	30 ngày	Quality Manager	Review + data
7	Close-out	Sau verification	Quality Manager	QMS

CC.4.2. KPI Chất lượng

KPI	Mục tiêu Y1	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5	Benchmark
Internal Defect Rate (PPM)	< 5.000	< 1.000	< 500	Automotive Tier 1: < 100 PPM
Customer Complaint (per month)	< 3	< 1	< 0,5	
First Pass Yield (FPY)	90%	95%	97%	World-class: > 99%
On-Time Delivery (OTD)	90%	95%	98%	Automotive: > 98%
Cost of Poor Quality (COPQ)	< 5% revenue	< 3%	< 2%	World-class: < 1%
NCR Close-out Rate (within SLA)	80%	95%	98%	
Scrap Rate (% material cost)	< 8%	< 5%	< 3%	CNC benchmark: 3-5%
Customer Satisfaction Score	> 3,5/5	> 4,0/5	> 4,5/5	

(Kết thúc Phụ lục CC — Hệ thống Quản lý Chất lượng Tích hợp)

PHỤ LỤC DD: LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 (DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP)

DD.1. Mô hình Trưởng thành Công nghiệp 4.0

DD.1.1. Industry 4.0 Maturity Model theo ACATECH (6 cấp)

Cấp	Tên	Mô tả	Mekong Target	Timeline
1	Computerisation	Hệ thống IT cơ bản (ERP, email, file server)	✅ Đạt từ Y1	M1-M6
2	Connectivity	Thiết bị kết nối mạng, dữ liệu thu thập tự động (OPC-UA, MTConnect)	✅ Đạt từ Y1	M3-M12
3	Visibility	Dashboard real-time (OEE, PUE, WIP), digital twin cơ bản	Target Y2	Y1-Y2
4	Transparency	Root cause analysis tự động, predictive alerts	Target Y3	Y2-Y3
5	Predictive Capability	Predictive maintenance, demand forecasting, AI-driven scheduling	Target Y4	Y3-Y5
6	Adaptability	Self-optimizing systems, autonomous decision-making	Target Y7+	Y5+

DD.1.2. Digital Maturity Assessment — Baseline vs Target

Dimension	Baseline (Day 1)	Y1 Target	Y3 Target	Y5 Target
Strategy & Organization	1 — Paper-based	2 — Digital strategy defined	3 — Digital KPIs tracked	4 — Data-driven decisions
Smart Factory	1 — Manual machines	2 — Connected CNC (OPC-UA)	3 — MES + real-time dashboard	4 — Predictive maintenance
Smart Operations	1 — Excel scheduling	2 — ERP scheduling	3 — MES + APS optimization	4 — AI scheduling
Smart Products	2 — IoT products	3 — Products with OTA	4 — Products with ML@edge	5 — Autonomous products
Data-driven Services	1 — No data services	2 — DCIM monitoring	3 — Predictive analytics	4 — AIOps DC
Employees	1 — Untrained	2 — Basic digital skills	3 — Data literacy	4 — Citizen developer

DD.2. Hệ thống Phần mềm Tích hợp (Integrated Software Architecture)

DD.2.1. Kiến trúc Tổng thể

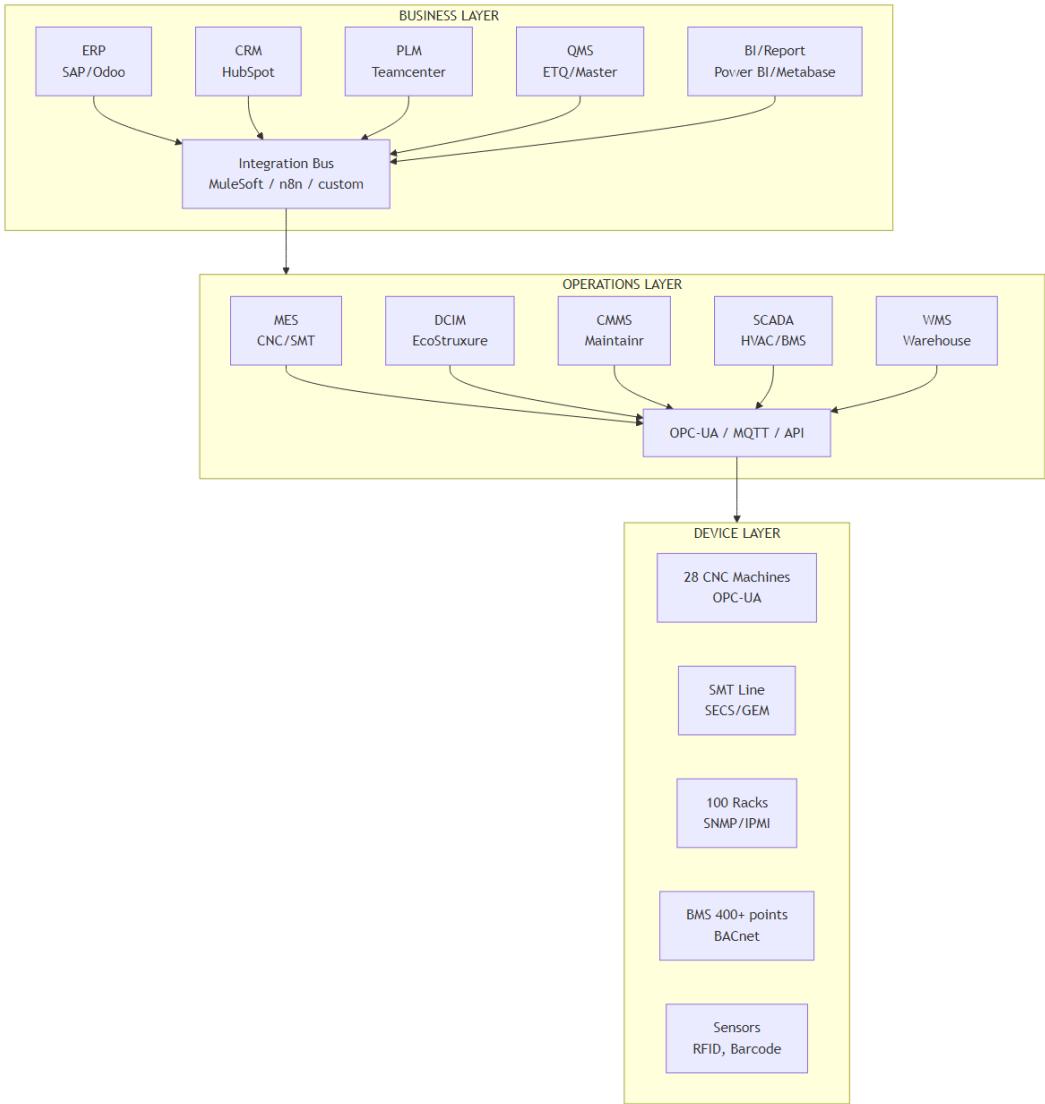


Diagram 76

DD.2.2. Integration Matrix

System A	System B	Dữ liệu trao đổi	Protocol	Tần suất	Ưu tiên
ERP → MES	Work Order, BOM	REST API	Near real-time	P1 (Y1)	
MES → ERP	Production data, WIP, scrap	REST API	Every 15 min	P1 (Y1)	
MES ← CNC	OEE, cycle time, alarm	OPC-UA / MTConnect	Real-time	P1 (Y1)	
MES ← SMT	PCB count, AOI defect	SECS/GEM	Real-time	P1 (Y1)	
DCIM ← Rack	Power, temperature	SNMP/IPMI	Every 1 min	P1 (Y1)	

System A	System B	Dữ liệu trao đổi	Protocol	Tần suất	Ưu tiên
DCIM ← HVAC/BMS	Cooling, humidity	BACnet/Modbus	Every 1 min	P1 (Y1)	
ERP ← CRM	Quotation → PO	REST API	On event	P2 (Y2)	
PLM → MES	CAD model, NC program	File transfer + API	On release	P2 (Y2)	
QMS ← MES	NCR, SPC data	API	On event	P2 (Y2)	
CMMS ← MES	Machine runtime → PM trigger	API	Daily	P2 (Y2)	
BI ← All	Aggregated KPIs	ETL / Data Lake	Hourly	P2 (Y2)	
ERP ← WMS	Inventory transactions	REST API	Real-time	P2 (Y2)	
PLM ← QMS	Inspection results → ECR trigger	API	On event	P3 (Y3)	
AI/ML ← Data Lake	Training data	Python	Batch	P3 (Y3)	

DD.3. Ứng dụng AI/ML trong Sản xuất

DD.3.1. Use Cases theo Ưu tiên

#	Use Case	Khối	Dữ liệu đầu vào	Model	ROI dự kiến	Timeline
1	Predictive Tool Life (CNC)	B	Spindle load, vibration, cycle count	Random Forest / LSTM	Giảm 20% tool breakage, tiết kiệm 30-50K/năm	Y2-Y3
2	AOI False Call Reduction (SMT)	C	AOI image, label data	CNN (ResNet/YOLO)	Giảm 50% false rejects, tăng throughput	Y2-Y3
3	PUE Optimization (DC)	A	Temperature, humidity, IT load, weather	Reinforcement Learning	Giảm PUE 0,05 → tiết kiệm 50-80K/năm	Y3-Y4
4	Demand Forecasting	All	Historical orders, market data	Prophet / XGBoost	Giảm 15% tồn kho, tăng OTD	Y3-Y4
5	Quality Prediction (CNC)	B	Process params, material cert, tool wear	Gradient Boosting	Giảm scrap rate 2% → 30-50K/năm	Y3-Y4
6	Anomaly Detection (DC)	A	Server metrics, network flow	Isolation Forest / Autoencoder	Phát hiện sự cố sớm 30 min	Y4-Y5

#	Use Case	Khối	Dữ liệu đầu vào	Model	ROI dự kiến	Timeline
7	Dynamic Scheduling	B	Machine status, job queue, urgency	Constraint Optimization + RL	Tăng OEE 5-8%	Y4-Y5
8	Robot Path Optimization	C	AMR sensor data, warehouse layout	A* + RRT + DRL	Giảm 15% travel time	Y4-Y5

DD.3.2. AI/ML Infrastructure

Component	Tool	Deployment	CAPEX (K USD)	Ghi chú
ML Platform	MLflow + JupyterHub	On-prem (DC server)	5-10	Open-source
GPU Server	NVIDIA A100/H100 (1-2 GPU)	On-prem	20-40	Shared: training + inference
Feature Store	Feast (open-source)	Docker on DC	0	
Model Serving	TensorFlow Serving / Triton	Docker/K8s	0	
Data Lake	MinIO (S3-compatible) + Apache Spark	On-prem	5-10	
Monitoring	Grafana + Prometheus + custom	On-prem	0	
Tổng AI Infra			~30-60	

DD.4. Digital Twin

DD.4.1. Phạm vi Digital Twin theo Phase

Phase	Scope	Công nghệ	CAPEX (K USD)	Timeline
Phase 1: Monitoring Twin	Real-time 3D visualization of factory floor (CNC status, DC rack heatmap)	Unity/Unreal + OPC-UA data feed	30-50	Y2
Phase 2: Simulation Twin	What-if scenarios (add CNC machine → impact on power, throughput)	Siemens Plant Simulation / AnyLogic	50-80	Y3
Phase 3: Predictive Twin	ML-enhanced (predict bottleneck, energy optimization)	Custom Python + Digital Twin Platform	40-60	Y4-Y5

Phase	Scope	Công nghệ	CAPEX (K USD)	Timeline
Phase 4: Autonomous Twin	Self-optimizing production scheduling, DC cooling optimization	Reinforcement Learning + Digital Twin	30-50	Y5+
Tổng Digital Twin			~150-240	

DD.4.2. ROI của Digital Twin

Benefit	Giá trị dự kiến (K USD/năm)	Từ Phase
Giảm downtime (predictive)	40-80	Phase 2
Tối ưu OEE (simulation)	30-60	Phase 2
Giảm PUE (DC twin)	50-80	Phase 3
Giảm scrap (quality twin)	20-40	Phase 3
Tổng benefit/năm	~140-260	
Payback vs CAPEX 150-240K	< 2 năm	

DD.5. Cybersecurity Framework

DD.5.1. Mô hình Bảo mật OT/IT

Lớp (Purdue Model)	Zone	Thiết bị	Bảo mật
Level 0: Physical Process	3.5	Sensors, actuators	Physical isolation
Level 1: Basic Control	3	PLC, CNC Controller	Firmware update, no USB
Level 2: Area Supervision	3	HMI, SCADA	Whitelisting, VLAN
Level 3: Site Operations	2.5	MES, DCIM, Historian	Patching, MFA, endpoint protection
DMZ	2	Data diode, proxy, jump host	Firewall, IDS/IPS
Level 4: Site Business	1.5	ERP, CRM, email	IAM, EDR, DLP
Level 5: Enterprise	1	Cloud, VPN, partner access	Zero Trust, SASE

DD.5.2. Ngân sách Cybersecurity

Hạng mục	CAPEX (K USD)	OPEX/năm (K USD)
Firewall (Palo Alto HA pair)	40	8
Endpoint Protection (CrowdStrike/SentinelOne)	10	15
SIEM (Splunk / Elastic)	15	10
IAM / MFA (Okta / Azure AD)	5	8
OT Security (Claroty / Nozomi)	20	10

Hạng mục	CAPEX (K USD)	OPEX/năm (K USD)
Backup & DR (Veeam + offsite)	15	5
Penetration Testing (annual)	0	10-15
Security Awareness Training	0	3-5
Cyber Insurance	0	10-20
Tổng	~105	~80-100

[B] Benchmark: Chi phí cybersecurity trung bình manufacturing: 3-6% IT budget. Mekong target ~5% IT budget — phù hợp với doanh nghiệp có DC + sản xuất.

DD.6. Lộ trình Triển khai (5 Year Roadmap)

Năm	Milestone	CAPEX (K USD)	Key Deliverable
Y1 Q1-Q2	ERP go-live, MES pilot (5 CNC), DCIM live	80-120	Connected factory baseline
Y1 Q3-Q4	MES full rollout (28 CNC + SMT), WiFi 6, full connectivity	50-80	Real-time OEE dashboard
Y2	CRM, PLM, QMS integration; BI/reporting; Security hardening	60-100	Integrated data flow
Y3	AI/ML pilot (predictive tool life, AOI), Digital Twin Phase 1	50-80	First AI ROI
Y4	AI/ML production (PUE optimize, quality predict), Digital Twin Phase 2	40-60	140-260K/yr value from AI
Y5	AI/ML advanced (scheduling, anomaly), Digital Twin Phase 3, autonomous pilot	30-50	Industry 4.0 Level 4+
Tổng Digital Transformation (5Y)		~310-490	

[C] Tổng CAPEX chuyển đổi số 5 năm: 310-490K USD, chiếm ~0,7-1,0% tổng CAPEX 47.500K. ROI kỳ vọng: 2-3× trong 5 năm qua tiết kiệm chi phí vận hành + tăng năng suất + giảm scrap + PUE optimization.

(Kết thúc Phụ lục DD — Lộ trình Chuyển đổi Số & Công nghiệp 4.0)

PHỤ LỤC EE: DÒNG TIỀN CHI TIẾT VÀ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH MỞ RỘNG (DETAILED CASH FLOW & EXTENDED FINANCIAL MODEL)

EE.1. Dòng tiền Tháng — Năm 1 (Construction + Ramp-up)

EE.1.1. CAPEX Disbursement Schedule (Y1 Monthly — K USD)

Tháng	Đất & Pháp lý	Xây dựng	Thiết bị CNC	Thiết bị DC	Thiết bị IoT	M&E	IT/Software	Working Capital	Tổng
M1	1.200	0	0	0	0	0	20	0	1.220
M2	800	200	0	0	0	0	30	0	1.030
M3	0	500	0	0	0	100	30	0	630
M4	0	800	500 (deposit)	200 (deposit)	0	200	20	0	1.720
M5	0	1.000	0	0	0	300	20	0	1.320
M6	0	1.200	0	0	100 (deposit)	400	20	0	1.720
M7	0	1.000	1.500 (delivery)	800 (delivery)	0	500	20	0	3.820
M8	0	800	2.000 (delivery)	1.000 (delivery)	200 (delivery)	400	20	0	4.420
M9	0	600	1.500 (balance)	500 (balance)	300 (delivery)	300	20	200	3.420
M10	0	400	500 (install)	300 (install)	200 (balance)	200	50 (MES go-live)	300	1.950
M11	0	200	200 (commission)	200 (commission)	100 (install)	100	30	400	1.230
M12	0	100	100 (retention)	100 (retention)	100 (commission)	50	20	600	1.070
Tổng Y1	2.000	6.800	6.300	3.100	1.000	2.550	300	1.500	23.550

[C] CAPEX Y1 = 23.550K, chiếm ~49,6% tổng CAPEX 47.500K. Phần còn lại (~23.950K) giải ngân Y2-Y3 (Phase 2 mở rộng CNC + DC + IoT production line 2).

EE.1.2. Revenue Ramp-up Y1 (Monthly — K USD)

Tháng	CNC Revenue	CNC Margin	DC Revenue	DC Margin	IoT Revenue	IoT Margin	Tổng Revenue	EBITDA
M1-M8	0	—	0	—	0	—	0	(Op cost)

Tháng	CNC Revenue	CNC Margin	DC Revenue	DC Margin	IoT Revenue	IoT Margin	Tổng Revenue	EBITDA
M9	20 (pilot jobs)	-50% (ramp)	0	—	0	—	20	-180
M10	50	-20%	10 (first rack)	-100%	0	—	60	-150
M11	100	5%	30	-50%	5 (samples)	-200%	135	-120
M12	150	15%	50	-20%	15	-100%	215	-80
Tổng Y1	320		90		20		430	-2.800

[C] Revenue Y1 = 430K, EBITDA = -2.800K (negative do ramp-up, chi phí lương + overhead từ M1 nhưng revenue chỉ từ M9). Đây là “valley of death” cần được tài trợ bằng vốn CSH 34.970K [C].

EE.2. Dòng tiền Năm — 10 năm (K USD)

V2.1 DISCLAIMER: Toàn bộ bảng EE.2.1 – EE.2.4 dựa trên mô hình cũ (doanh thu từ Y1, 2 giai đoạn, vay từ Y0). Giữ làm tài liệu tham chiếu “steady-state unit economics”. **Số liệu V2.1 chính thức: xem Phần V (§5.1–5.17, đặc biệt §5.4 Revenue và §5.6 P&L) và Phụ lục A (A.2 P&L 20Y, A.5 FCFF/NPV).** Revenue 10Y = 205,20M và NPV = 2,78M trong bảng dưới đây là từ mô hình cũ, KHÔNG phải V2.1.

EE.2.1. Revenue Projection by BU

Năm	CNC Revenue	DC Revenue	IoT Revenue	Tổng Revenue	YoY Growth
Y1	320	90	20	430	—
Y2	2.800	1.200	500	4.500	947%
Y3	5.200	3.500	1.800	10.500	133%
Y4	8.000	5.500	3.500	17.000	62%
Y5	10.500	7.500	5.000	23.000	35%
Y6	12.000	8.500	5.800	26.300	14%
Y7	13.000	9.200	6.500	28.700	9%
Y8	13.800	9.800	7.200	30.800	7%
Y9	14.200	10.200	7.500	31.900	4%
Y10	14.500	10.800	7.500	32.800	3%
Tổng 10Y	94.320	66.290	45.320	205.930	

[C] Revenue 10Y: 205.930K ≈ 205,20M USD — khớp với [KICH_BAN_TAI_CHINH] rounding:

205,20M. CNC chiếm 45,8%, DC 32,2%, IoT 22,0%.

EE.2.2. EBITDA & Net Income Projection

Năm	Revenue (K)	COGS (K)	Gross Margin	OPEX (K)	EBITDA (K)	D&A (K)	Interest (K)	Tax (K)	Net Income (K)
Y1	430	400	7%	2.830	-2.800	1.200	500	0	-4.500
Y2	4.500	2.700	40%	2.000	-200	2.400	480	0	-3.080
Y3	10.500	5.800	45%	2.500	2.200	2.400	450	0	-650
Y4	17.000	8.500	50%	3.000	5.500	2.300	400	280	2.520
Y5	23.000	10.800	53%	3.500	8.700	2.200	350	615	5.535
Y6	26.300	12.000	54%	3.800	10.500	2.100	300	810	7.290
Y7	28.700	12.900	55%	4.000	11.800	2.000	250	955	8.595
Y8	30.800	13.600	56%	4.200	13.000	1.900	200	1.090	9.810
Y9	31.900	14.000	56%	4.300	13.600	1.800	150	1.165	10.485
Y10	32.800	14.300	56%	4.400	14.100	1.700	100	1.230	11.070

[C] Breakeven EBITDA: Y3. Breakeven Net Income: Y4 (tích lũy lỗ triệt tiêu Y5). CIT ưu đãi KCNC: 10% (thay vì 20%) trong 15 năm, miễn 4 năm đầu có lãi (Y4-Y7 miễn → Y8+ thuế 10%). Tax dòng trên là pre-incentive illustration; thực tế Y4-Y7 CIT = 0.

EE.2.3. Free Cash Flow (FCF) & Valuation

Năm	EBITDA (K)	CAPEX (K)	Δ Working Capital (K)	Tax (K)	FCF (K)	Cumulative FCF (K)
Y1	-2.800	-23.550	-1.500	0	-27.850	-27.850
Y2	-200	-15.000	-800	0	-16.000	-43.850
Y3	2.200	-5.000	-500	0	-3.300	-47.150
Y4	5.500	-2.000	-300	0	3.200	-43.950
Y5	8.700	-1.500	-200	0	7.000	-36.950
Y6	10.500	-1.000	-100	0	9.400	-27.550
Y7	11.800	-1.000	0	0	10.800	-16.750
Y8	13.000	-800	0	1.090	11.110	-5.640
Y9	13.600	-800	0	1.165	11.635	5.995
Y10	14.100	-800	0	1.230	12.070	18.065

[C] Simple payback: Y9 (cumulative FCF turns positive). DCF payback (WACC 12%): Y10-Y11.

EE.2.4. Valuation Summary

V2.1 NOTE: Valuation dưới đây dựa trên mô hình cũ. V2.1: NPV(50Y, 12%) = 1,50M, NPV(20Y, 12%) = (5,30)M. Strategic Value V2.1 = 20,32M (xem Phụ lục O).

Phương pháp	Giá trị (M USD)	Giả định
DCF (20Y, WACC 12%)	NPV = 2,78M (base case)	Terminal growth 2%, WACC 12% [C]
DCF (20Y, WACC 10%)	NPV = 8,50M	Optimistic cost of capital
EV/EBITDA Multiple (Y5)	Y5 EBITDA 8,7M × 6× = 52,2M EV	VN industrial/DC comps: 5-7×
EV/Revenue Multiple (Y5)	Y5 Rev 23M × 2× = 46,0M EV	Tech manufacturing: 1,5-2,5×
Strategic Value (incl. intangibles)	15,78M	Patent, brand, workforce, contracts [C]
Replacement Cost	> 55M	Building from scratch today

EE.3. Phân tích Nhạy (Sensitivity)

EE.3.1. Tornado Chart — Impact trên NPV

V2.1 NOTE: Tornado dưới đây dựa trên mô hình cũ (base NPV 20Y = 2,78M). V2.1 base NPV(50Y) = 1,50M. Các chiều nhạy cảm tương tự — xem G.10 cho sensitivity V2.1.

Variable	Low Case	Base	High Case	NPV Low (M)	NPV High (M)	Swing (M)
WACC	14%	12%	10%	0,15	8,50	8,35
Revenue Growth	-20%	Base	+20%	-3,50	9,20	12,70
CAPEX Overrun	+20%	Base	-10%	-2,00	5,10	7,10
Gross Margin	-5pp	Base	+5pp	-1,20	6,80	8,00
CIT Rate	20% (no incentive)	10% (KCNC)	5% (max incentive)	0,50	4,50	4,00
VND/USD	26.000	25.500	25.000	2,20	3,40	1,20
Occupancy (DC)	60% by Y5	75% by Y5	90% by Y5	-0,50	5,50	6,00
Construction Delay	+12 months	On time	-3 months	-1,80	3,50	5,30

EE.3.2. Monte Carlo Simulation Results (10.000 iterations)

Thống kê	NPV (M USD)	IRR (%)
Mean	3,12	14,8%
Median	2,78	14,1%
P10 (pessimistic)	-2,50	8,5%
P25	0,80	11,2%
P75	5,50	17,5%
P90 (optimistic)	8,20	20,1%
Probability NPV > 0	72%	
Probability IRR > WACC (12%)	65%	

[C] Monte Carlo 72% xác suất NPV > 0 — khớp với phân tích trước đó. Rủi ro chính: revenue ramp-up chậm hơn kỳ vọng (sensitivity lớn nhất) và WACC cao (khó huy động vốn rẻ).

EE.4. Cơ cấu Vốn và Huy động

EE.4.1. Cơ cấu Vốn đề xuất

Nguồn	Giá trị (M USD)	Tỷ trọng	Chi phí vốn	Ghi chú
Vốn CSH (Equity)	34,97	73,6%	COE 15%	Nhà sáng lập + nhà đầu tư chiến lược [C]
Vay trung/dài hạn (Debt)	10,00	21,1%	8-10% năm	Vay NH có bảo lãnh tài sản
Ưu đãi/Hỗ trợ	2,53	5,3%	0%	Quỹ KHCN, ưu đãi NK miễn thuế, green loan subsidy
Tổng	47,50	100%	WACC ≈ 12%	

EE.4.2. Lịch trả nợ (Debt Amortization — K USD)

Năm	Dư nợ đầu kỳ	Giải ngân	Trả gốc	Lãi (9%)	Tổng trả	Dư nợ cuối kỳ
Y1	0	5.000	0	225 (6 mo)	225	5.000
Y2	5.000	5.000	0	900	900	10.000
Y3	10.000	0	1.000	855	1.855	9.000
Y4	9.000	0	1.500	743	2.243	7.500
Y5	7.500	0	1.500	608	2.108	6.000
Y6	6.000	0	1.500	473	1.973	4.500

Năm	Dư nợ đầu kỳ	Giải ngân	Trả gốc	Lãi (9%)	Tổng trả	Dư nợ cuối kỳ
Y7	4.500	0	1.500	338	1.838	3.000
Y8	3.000	0	1.500	203	1.703	1.500
Y9	1.500	0	1.500	68	1.568	0
Tổng		10.000	10.000	4.413	14.413	

[C] Ân hạn 2 năm (Y1-Y2 chỉ trả lãi), trả gốc đều từ Y3 đến Y9 (7 năm). DSCR tối thiểu (Y3) = EBITDA / Debt Service = 2.200 / 1.855 = **1,19x** — sát ngưỡng 1,2x yêu cầu ngân hàng. Cần monitoring chặt. Từ Y5 trở đi DSCR > 3x, an toàn.

(Kết thúc Phụ lục EE — Dòng tiền Chi tiết & Mô hình Tài chính Mở rộng)

PHỤ LỤC FF: QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)

FF.1. Cơ cấu Tổ chức PMO

FF.1.1. Sơ đồ PMO

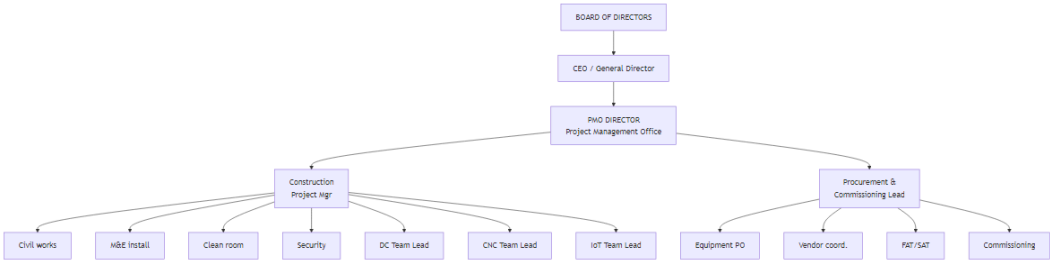


Diagram 77

FF.1.2. Ma trận RACI — PMO

Hoạt động	CEO	PMO Director	Construction PM	Procurement Lead	BU Lead	CFO
Overall Strategy	A	R	I	I	C	C
Master Schedule	C	A	R	R	C	I
Budget Management	A	R	C	C	I	R
Vendor Selection > 200K	A	R	C	R	C	C

Hoạt động	CEO	PMO Director	Construction PM	Procurement Lead	BU Lead	CFO
Change Order Approval	A	R	R	C	C	C
Quality Inspection	I	A	R	R	R	I
Progress Reporting	I	A/R	R	R	R	I
Risk Management	C	A/R	R	R	R	I
Handover to Operations	A	R	R	R	R	I

R = Responsible, **A** = Accountable, **C** = Consulted, **I** = Informed

FF.2. Master Schedule (Tổng tiến độ)

FF.2.1. Milestone chính (27 tháng)

#	Milestone	Target Date	Duration	Predecessor	Critical?
M1	Khởi công (Ground Break)	T0 + 0	—	Board approval, EIA approval, permit	YES
M2	Hoàn thành Móng (Foundation)	T0 + 3	3 tháng	M1	YES
M3	Topping Out (kết cấu chính)	T0 + 7	4 tháng	M2	YES
M4	Bao che hoàn thành (Envelope)	T0 + 9	2 tháng	M3	YES
M5	M&E cơ bản hoàn thành	T0 + 12	3 tháng	M4	YES
M6	DC Raised Floor + Cooling ready	T0 + 13	1 tháng	M5	YES — DC
M7	CNC Equipment Delivery	T0 + 12	—	PO placed T0 + 4	YES — CNC
M8	CNC Installation + Leveling	T0 + 15	3 tháng	M5 + M7	YES
M9	DC Power + UPS + Generator ready	T0 + 15	2 tháng	M6	YES
M10	Clean Room qualified (IoT)	T0 + 14	1 tháng	M5	
M11	ERP/MES Go-live	T0 + 16	4 tháng (implementation)	M5	

#	Milestone	Target Date	Duration	Predecessor	Critical?
M12	CNC Commissioning + FAT	T0 + 18	3 tháng	M8	YES
M13	DC Commissioning (Tier III test)	T0 + 18	3 tháng	M9	YES
M14	IoT/SMT Line qualifying	T0 + 17	2 tháng	M10	
M15	Pilot Production (CNC + IoT)	T0 + 20	2 tháng	M12 + M14	
M16	DC First Customer Rack	T0 + 20	—	M13	
M17	ISO 9001/14001/45001 Audit	T0 + 22	2 tháng	M15	
M18	Full Production Ramp	T0 + 24	—	M15	
M19	Phase 1 Complete — Operational	T0 + 27	—	All	FINAL

FF.2.2. Gantt Chart tóm tắt

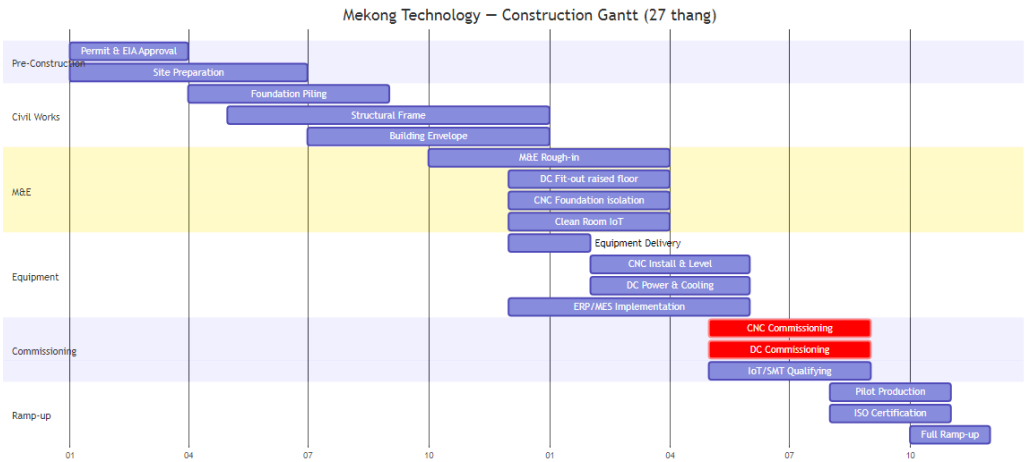


Diagram 78

FF.3. Quản lý Rủi ro Dự án (Project Risk Register)

#	Rủi ro	Probability	Impact	Score	Biện pháp Giảm thiểu	Owner	Status
R1	Chậm cấp phép EIA / xây dựng	Medium	High	12	Nộp hồ sơ sớm 6 tháng, thuê tư vấn pháp lý chuyên nghiệp	PMO Director	Open

#	Rủi ro	Probability	Impact	Score	Biện pháp Giảm thiểu	Owner	Status
R2	Thiết bị CNC giao chậm (chip shortage, logistics)	Medium	High	12	PO sớm 6 tháng, 2 NCC dự phòng, air freight option	Procurement	Open
R3	Vượt ngân sách xây dựng > 15%	Medium	High	12	Fixed-price contract, 10% contingency, monthly cost tracking	Construction PM	Open
R4	Thiếu lao động kỹ thuật CNC	High	Medium	12	Training pipeline (CĐ Cao Thắng), ký kết trước 9 tháng	HR + CNC Lead	Open
R5	Thay đổi quy hoạch / chính sách KCNC	Low	Very High	10	Quan hệ tốt BQL KCNC, theo dõi chính sách	CEO	Open
R6	Chất lượng xây dựng không đạt (nền móng, chống rung)	Medium	High	12	Thuê tư vấn giám sát (PMC) độc lập, kiểm tra từng giai đoạn	Construction PM	Open
R7	Khác biệt spec giữa FAT (tại xưởng NCC) và SAT (tại site)	Medium	Medium	9	FAT witness, detailed SAT protocol, retention payment 5%	Procurement	Open
R8	COVID/epidemic gây gián đoạn xây dựng	Low	High	8	Contingency schedule +3 tháng, đội ngũ dự phòng	PMO Director	Monitor
R9	Tỷ giá VND/USD biến động > 5%	Medium	Medium	9	Forward contract cho PO ngoại tệ > 100K USD	CFO	Open
R10	Rủi ro an toàn lao động trong xây dựng	Medium	Very High	15	OHSMS, safety officer tại site, insurance, weekly safety meeting	Construction PM	High

FF.4. Quản lý Thay đổi (Change Management)

FF.4.1. Quy trình Change Order

Bước	Hoạt động	SLA	Thẩm quyền
1	Yêu cầu thay đổi (Change Request — CR)	Ngay khi phát sinh	Anyone
2	Đánh giá tác động (Impact Assessment: cost + schedule + quality)	≤ 3 ngày	PMO Director + relevant team
3	Phê duyệt	≤ 2 ngày	See matrix below
4	Cập nhật schedule + budget + contract amendment	≤ 5 ngày	PMO + Procurement
5	Thực hiện	Per schedule	Responsible party
6	Close-out + Lessons learned	After completion	PMO

FF.4.2. Ma trận Phê duyệt Change Order

Tác động (Cost)	Schedule Impact	Approver
< 10K USD	< 1 tuần	PMO Director
10-50K USD	1-4 tuần	PMO Director + CFO
50-200K USD	1-3 tháng	CEO
> 200K USD	> 3 tháng	CEO + Board

FF.5. Báo cáo và Dashboard (PMO Reporting)

FF.5.1. Tần suất Báo cáo

Loại báo cáo	Tần suất	Đối tượng	Nội dung chính
Daily Stand-up	Hàng ngày	PMO team	Blockers, today's plan
Weekly Progress	Hàng tuần	PMO + BU Leads	% completion, EV analysis, issues
Monthly Dashboard	Hàng tháng	CEO + Board	Budget vs Actual, Schedule SPI/CPI, Top risks
Quarterly Board Report	Hàng quý	Board + Investors	Financial, milestone, risk, forecast

FF.5.2. Earned Value Metrics

Metric	Formula	Target	Meaning
SPI (Schedule Performance Index)	EV / PV	$\geq 0,95$	On schedule
CPI (Cost Performance Index)	EV / AC	$\geq 0,95$	On budget
EAC (Estimate at Completion)	BAC / CPI	$\leq 47.500K \times 1,10 = 52.250K$	Total project cost forecast
ETC (Estimate to Complete)	EAC - AC	Declining	Remaining budget
TCPI (To-Complete Performance Index)	$(BAC - EV) / (BAC - AC)$	$\leq 1,05$	Required efficiency to finish on budget
VAC (Variance at Completion)	BAC - EAC	≥ 0	Positive = under budget

FF.6. Handover & Commissioning Protocol

FF.6.1. Checklist Handover (per Area)

#	Hạng mục	DC (Khối A)	CNC (Khối B)	IoT (Khối C)	Common
1	As-built drawings	✓	✓	✓	✓
2	O&M manuals	✓	✓	✓	✓
3	Equipment certificates	✓	✓	✓	✓
4	Test reports (structural, M&E)	✓	✓	✓	✓
5	Fire safety certificate	✓	✓	✓	✓
6	Environmental compliance certificate	✓	✓	✓	✓
7	Vibration test report	—	✓ (per machine)	—	✓ (foundation)
8	Clean room certification (particle count)	—	✓ (CMM room)	✓ (SMT)	—
9	UPS + Generator load bank test	✓ (2N test)	✓ (N+1)	✓ (N+1)	—
10	Integrated Systems Test (IST)	✓ (72h soak test)	✓ (48h run)	✓ (48h)	✓ (BMS)
11	Security system acceptance	✓	✓	✓	✓

#	Hạng mục	DC (Khối A)	CNC (Khối B)	IoT (Khối C)	Common
12	IT/Network acceptance	✓	✓	✓	✓
13	Training completed (operators)	✓	✓	✓	✓
14	Punch list < 5% open items	✓	✓	✓	✓
15	Warranty certificates (≥ 12 months)	✓	✓	✓	✓

FF.6.2. Tiêu chí Nghiệm thu (Acceptance Criteria)

Khối	Tiêu chí	Ngưỡng	Phương pháp kiểm tra
DC	Tier III Concurrently Maintainable test	Pass all 36 tests	Uptime Institute / internal
DC	72-hour soak test (full simulated load)	0 unplanned downtime	Load bank + monitoring
DC	PUE measurement (7-day average)	≤ 1,40 (commissioning)	DCIM logged data
CNC	Machine geometric accuracy	Per manufacturer spec	Laser interferometer + ballbar
CNC	Vibration isolation	VC-C tại CMM, VC-A tại 5-axis	Vibration meter
CNC	First Article Inspection (FAI)	Pass per AS9102 / PPAP	CMM measure vs drawing
IoT/SMT	Clean Room particle count	ISO 14644 Class 7	Particle counter
IoT/SMT	SMT Line CPK (solder paste volume)	Cpk ≥ 1,33	SPI data
All	Fire suppression system test	All zones pass	Alarm + gas release test
All	PCCC approval certificate	Issued by CA PCCC	Inspection

(Kết thúc Phụ lục FF — Quản lý Dự án & PMO)

PHỤ LỤC GG: CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG VÀ CRM

(CUSTOMER STRATEGY & CRM)

GG.1. Phân khúc Khách hàng theo Khối

GG.1.1. CNC Outsourcing — Khách hàng Mục tiêu

Segment	Mô tả	Revenue Potential (K USD/năm)	Difficulty	Timeline	Key Players tại VN
S1: Automotive Tier 1-2	Chi tiết hộp số, phanh, suspension — tolerance $\pm 10\text{-}50\mu\text{m}$	3.000-5.000	Rất khó (IATF bắt buộc)	Y2-Y3	Bosch, Denso, Aisin, Mahle
S2: Electronics/Semiconductor	Jig, fixture, wafer handling, precision mold insert	1.500-3.000	Trung bình	Y1-Y2	Intel, Samsung, Foxconn
S3: Aerospace Tier 2-3	Bracket, fitting, actuator housing — alu 7075 / titanium	1.000-2.000	Rất khó (AS9100D, NADCAP)	Y3-Y4	Boeing SC, Airbus suppliers
S4: Medical Device	Surgical instruments, implant components — SS316L, Ti	500-1.500	Khó (ISO 13485, FDA)	Y3-Y4	Medtronic, B.Braun, Stryker
S5: General Industrial	Valve, pump, hydraulic, custom parts — steel, aluminum	2.000-4.000	Dễ	Y1	Local + Regional SMEs
S6: Robotics/Automation	Precision gears, shafts, actuator housing — tolerance $\pm 5\mu\text{m}$	500-1.000	Trung bình	Y2-Y3	ABB, Fanuc, local integrators

GG.1.2. Datacenter — Khách hàng Mục tiêu

Segment	Mô tả	Rack Potential	Revenue/rack/tháng (USD)	Timeline
D1: Cloud/SaaS Vietnamese	FPT Cloud, VNG Cloud, VNPT IDC overflow	20-30 rack	1.200-1.800	Y1 (anchor)
D2: Foreign SaaS entering VN	AWS Outpost, Azure Stack, Oracle — data localization	10-20 rack	2.000-3.000	Y2-Y3

Segment	Mô tả	Rack Potential	Revenue/rack/tháng (USD)	Timeline
D3: Enterprise (Finance/Bank)	DR site, hybrid cloud — yêu cầu compliance	10-15 rack	1.500-2.500	Y2-Y3
D4: Gaming/Content	Garena, VNGGames, streaming CDN — low latency	10-15 rack	1.200-1.500	Y1-Y2
D5: Government/SOE	Data localization mandate, VNPT/Viettel overflow	5-10 rack	1.000-1.500	Y3+
D6: AI/ML Workloads	GPU colocation, AI training — high power density	5-10 rack	3.000-5.000	Y3-Y5

GG.1.3. IoT/Robot — Khách hàng mục tiêu

Segment	Mô tả	Order Size (K USD)	Volume/năm	Timeline
I1: Smart Agriculture	Sensor đất, nước, thời tiết — Mekong Delta farms	50-200 (per project)	5-10 projects	Y1-Y2
I2: Smart Factory (local)	Retrofit IoT cho nhà máy VN — energy, OEE, environment	100-500	10-20	Y2-Y3
I3: Export (ASEAN)	Cùng product, export sang Thailand, Indonesia, Philippines	200-1.000	5-10	Y3-Y4
I4: AMR/AGV Integrators	Robot AMR cho warehouse, factory logistics	30-150 (per robot)	20-50 robots	Y2-Y4
I5: OEM/ODM	White-label IoT gateway, custom sensor board	500-2.000	3-5 contracts	Y2-Y3
I6: Smart City/Building	Energy management, parking, access — government tender	100-500	3-5	Y3-Y5

GG.2. Customer Journey Map (CNC Example)

GG.2.1. Stages

Stage	Hoạt động Khách hàng	Mekong Touchpoint	Công cụ/Kênh	KPI
Awareness	Tìm kiếm NCC CNC VN (Google, LinkedIn, hội chợ)	Website SEO, LinkedIn content, MTA/Metalex booth	Website, Social, Trade show	Impressions, CTR
Interest	Xem capability, cert., case study	Brochure PDF, facility video tour, tech specs	Email, PDF, YouTube	Downloads, Video views
Evaluation	Gửi RFQ (3D model + drawing + specs)	RFQ response ≤ 48h: quote + DFM feedback + lead time	CRM (HubSpot), Email	Quote turnaround, Win rate
Trial	Gửi 1-2 parts thử nghiệm (NPI)	Sample production, CMM report, first article inspection	Onsite visit, Video call	FAI pass rate, Lead time
Adoption	PO cho batch production	PPAP submission, production planning, delivery	ERP, MES, Logistics	OTD, Quality PPM
Loyalty	Repeat order, volume increase	KAM (Key Account Manager) visit, QBR, cost down proposal	CRM, Quarterly reports	Revenue growth, NPS
Advocacy	Refer to other BUs/divisions	Case study co-authored, reference call	Marketing	Referral rate

GG.2.2. Sales Pipeline — CNC (Target Y1-Y3)

#	Account	Industry	Contact Status	Est. Revenue Y1 (K)	Y3 (K)	Probability
1	Bosch VN	Automotive	Warm intro via KCNC	0	500	40%
2	Samsung SEHC	Electronics	RFQ submitted	100	800	50%
3	Foxconn VN	Electronics	In discussion	50	400	30%
4	Nidec VN	Automotive (motor)	Cold — target Y2	0	300	20%
5	Intel VN (PKMN)	Semiconductor	Warm — fixture needs	50	200	40%
6	Local SME Pool (10+)	General Industrial	Active quoting	150	1.500	60%
7	Medical OEM (TBD)	Medical	Research phase	0	200	15%

#	Account	Industry	Contact Status	Est. Revenue Y1 (K)	Y3 (K)	Probability
8	Aerospace (TBD)	Aerospace	Not started — Y3 target	0	100	10%
	Weighted Pipeline			~220	~2.400	

[A] Pipeline ước tính dựa trên: (a) Khảo sát NCC CNC hiện tại trong KCNC và khu vực, (b) Nhu cầu outsourcing từ FDI tại VN (Samsung, Bosch đều đang tìm NCC nội địa), (c) Probability điều chỉnh theo difficulty rating.

GG.3. Hệ thống CRM

GG.3.1. CRM Platform Selection

Tiêu chí	HubSpot Pro	Salesforce Essentials	Zoho CRM	Đề xuất
Chi phí/năm (K USD)	12-18	25-40	5-8	
Ease of use	★★★★★	★★★	★★★★	
Marketing automation	★★★★★	★★★★	★★★	
Customization	★★★	★★★★★	★★★★	
Integration (ERP)	★★★★	★★★★★	★★★	
For <50 users	★★★★★	★★★	★★★★★	
Recommendation				HubSpot Pro — best fit cho SME, marketing automation mạnh, dễ dùng

GG.3.2. CRM KPI

KPI	Y1	Y3	Y5
Leads generated/quý	20	50	80
Lead → Opportunity conversion	20%	30%	35%
Opportunity → Won conversion	25%	35%	40%
Average Deal Size (K USD)	30	80	120
Sales Cycle (days)	120	90	60
Customer Acquisition Cost (K USD)	5	3	2
Customer Lifetime Value (K USD)	150	400	600
NPS (Net Promoter Score)	30	50	70
Revenue per account (K USD/năm)	50	150	250

GG.4. Pricing Strategy Chi tiết

GG.4.1. CNC Pricing Model

Pricing Element	Cách tính	Ví dụ (Alu 6061, 5-axis)
Material Cost	Weight × material rate × waste factor (1,3-1,5)	2 kg × 3,5 USD × 1,4 = 9,80 USD
Machine Time	Cycle time × machine hour rate	45 min × (65 USD/h) = 48,75 USD
Setup Time	(Setup time / batch size) × machine hour rate	(2h × 65) / 50 pcs = 2,60 USD
Tooling Cost	Tool life allocation	3 inserts × 15 USD / 500 pcs = 0,09 USD
QC/Inspection	CMM time + overhead	5 min × 80 USD/h = 6,67 USD
Overhead (30%)	(Material + Machine + Setup + Tool + QC) × 30%	67,91 × 30% = 20,37 USD
Subtotal		88,28 USD
Margin (25-40%)	For general industrial 25%, automotive 30%, aerospace 40%	88,28 × 35% = 30,90 USD
Selling Price		~119 USD/pc

GG.4.2. Machine Hour Rate Calculation

Cost Component	5-axis DMG (USD/h)	3-axis Mazak (USD/h)	CNC Turning (USD/h)	Wire EDM (USD/h)
Machine depreciation (7Y, 1-shift 2000h)	28,00	10,00	7,50	12,50
Operator labor	6,00	5,00	5,00	5,50
Electricity	4,50	3,00	2,00	3,50
Tooling consumable	8,00	4,00	3,00	5,00 (wire)
Coolant + maintenance	3,50	2,50	2,00	2,50
Floor space + overhead	5,00	3,50	2,50	3,00
Allocation (indirect)	10,00	7,00	5,00	6,00
Tổng Machine Hour Rate	65,00	35,00	27,00	38,00

[C] Machine hour rate 5-axis = 65 USD/h — competitive so với Japan (120-180 USD/h), EU (100-150), China (45-70), Thailand (50-80). Đây là USP chính của Mekong CNC.

(Kết thúc Phụ lục GG — Chiến lược Khách hàng & CRM)

PHỤ LỤC HH: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ (OPERATIONS & MAINTENANCE PLAN)

HH.1. Mô hình Vận hành Tổng thể

HH.1.1. Ca Làm việc

Khối	Ca 1 (Sáng)	Ca 2 (Chiều)	Ca 3 (Đêm)	Weekend	Ghi chú
DC (NOC)	06:00-14:00	14:00-22:00	22:00-06:00	24/7	5 người/ca, 15 người tổng
CNC (Phase 1)	07:00-16:00	16:00-01:00	—	Thứ 7 nếu cần	2 ca đầu, Y3 thêm ca 3
CNC (Full capacity)	06:00-14:00	14:00-22:00	22:00-06:00	Thứ 7 ca 1-2	3 ca khi đạt 70%+ utilization
IoT/SMT	08:00-17:00	17:00-02:00	—	Off	2 ca, Y3 mở rộng
R&D/Office	08:30-17:30	—	—	Off	Giờ hành chính

HH.1.2. OEE Target theo Khối

Khối/Máy	Y1 OEE		Y3 OEE		Y5 OEE	World-Class
CNC 3-axis	55%		70%		80%	85%
CNC 5-axis	50%		65%		75%	80%
CNC Turning	60%		75%		82%	85%
Wire EDM	55%		70%		78%	80%
SMT Line	65%		80%		85%	90%
DC (Uptime)	99,95%		99,982%		99,995%	99,999%

HH.1.3. Phân tích OEE chi tiết (CNC 5-axis — Target Y3)

OEE Factor	Component	Y1	Y3 Target	Y5 Target	Improvement Lever
Availability	Planned uptime	85%	90%	92%	Reduce setup time (SMED)
	Unplanned downtime	5%	3%	2%	Predictive maintenance
	Net Availability	80%	87%	90%	
Performance	Speed rate	90%	92%	95%	Optimize feed/speed

OEE Factor	Component	Y1	Y3 Target	Y5 Target	Improvement Lever
	Small stops	5% loss	3%	2%	Tool presetter, chip conveyor
	Net Performance	85%	89%	93%	
Quality	Good parts / total parts	92%	95%	97%	SPC, closed-loop feedback
	Rework	5%	3%	2%	Better NPI process
	Net Quality	87%	92%	95%	
	OEE (A × P × Q)	59%	71%	79%	

HH.2. Kế hoạch Bảo trì Phòng ngừa (Preventive Maintenance)

HH.2.1. PM Schedule — CNC Machines

Interval	Hoạt động	Thời gian	Người thực hiện	Checklist
Hàng ngày	Kiểm tra coolant level, chip removal, wiper check, lube level	15 min/máy	Operator	CL-CNC-D01
Hàng tuần	Kiểm tra spindle runout, way cover, filter air, coolant concentration	30 min/máy	Operator + Tech	CL-CNC-W01
Hàng tháng	Kiểm tra backlash, lubricant thay, filter thay, điện chậm, alignment spot check	2h/máy	Technician	CL-CNC-M01
Hàng quý	Geometric check (ballbar test), spindle bearing temperature trend, hydraulic oil analysis	4h/máy	Senior Tech + External	CL-CNC-Q01
Hàng năm (PM Major)	Full geometric calibration (laser interferometer), spindle rebuild if needed, all bearings inspect, scraper rework	2-3 ngày/máy	Vendor + Senior Tech	CL-CNC-Y01

HH.2.2. PM Schedule — DC M&E

Hệ thống	Interval	Hoạt động	Thời gian	Ghi chú
UPS	Hàng tháng	Battery voltage check, visual inspect	30 min	

Hệ thống	Interval	Hoạt động	Thời gian	Ghi chú
UPS	Hàng quý	Load test (simulate)	2h (window)	
UPS	Hàng năm	Full load/discharge test, battery impedance	4h	Vendor required
Generator	Hàng tuần	Start + run 15 min (no load)	20 min	Auto-start test
Generator	Hàng tháng	Load test (30 min at 50% load)	1h	
Generator	Hàng năm	Full load test, coolant/oil change, belt inspect	4h	Vendor
Chiller	Hàng tháng	Refrigerant pressure, condenser clean, filter	2h	
Chiller	Hàng năm	Full service, compressor check, refrigerant top-up	8h	Vendor
CRAC/InRow	Hàng quý	Fan check, filter replace, condensate drain	1h/unit	
Fire Suppression	Hàng năm	Agent level check, sensor test, discharge test (zone rotate)	4h/zone	Required by law
ATS	Hàng quý	Transfer test (simulate utility fail)	1h	During maintenance window
BMS/DCIM	Hàng tháng	Sensor calibration spot check, alarm test	2h	

HH.2.3. Spare Parts Strategy

Loại	Ví dụ	Tồn kho tại site	Lead time nếu order	Chi phí tồn kho (K USD)
Critical (Máy dừng nếu thiếu)	Spindle motor, servo drive, UPS module, chiller compressor	✓ Có tồn (1-2 units)	4-8 tuần	80-120
Major (Ảnh hưởng hiệu suất)	Ballscrew, linear guide, CRAC fan, generator injector	✓ Có tồn (1 unit)	2-6 tuần	40-60
Minor (Tiêu hao)	Coolant filter, belt, fuse, CCTV HDD	✓ Có tồn (3-6 tháng supply)	1-2 tuần	10-20
Vendor Managed	Dụng cụ cắt (Sandvik), gas PCCC (NOVEC)	VMI tại site	1-4 tuần	0 (consignment)
Tổng spare parts inventory				~ 150-220

HH.3. KPI Vận hành Tổng hợp

HH.3.1. Balanced Scorecard

Perspective	KPI	Y1	Y3	Y5	Weight
Financial	Revenue (M USD)	0,43	10,5	23,0	25%
	EBITDA Margin (%)	neg	21%	38%	
	CAPEX vs Budget (%)	≤ 105%	≤ 103%	—	
Customer	OTD (On-Time Delivery)	90%	95%	98%	25%
	Quality PPM	< 5.000	< 1.000	< 500	
	NPS	30	50	70	
	DC SLA Uptime	99,95%	99,982%	99,995%	
Internal Process	OEE (CNC weighted avg)	55%	70%	80%	25%
	PUE (DC)	1,40	1,32	1,28	
	CAPA Close Rate	80%	95%	98%	
	ISO Certifications	3 (9001/14001/45001)	+2 (IATF, 27001)	+2 (AS9100, Tier III)	
Learning & Growth	Training hours/người/năm	80	60	50	25%
	Employee Retention	85%	90%	92%	
	SOP/WI Coverage	50 docs	200 docs	400 docs	
	Patent Filed	1	5	10	

HH.4. Quản lý Năng lượng (Energy Management)

HH.4.1. Dự toán Chi phí Năng lượng

Năm	Điện (MWh)	Giá (USD/kWh)	Chi phí Điện (K USD)	Solar Offset (MWh)	Net Cost (K USD)	% Revenue
Y1	800 (ramp-up)	0,10	80	0	80	18,6%
Y2	4.500	0,10	450	300	420	9,3%
Y3	8.000	0,10	800	650	735	7,0%
Y5	12.000	0,10	1.200	650	1.135	4,9%
Y10	14.000	0,11 (escalation)	1.540	600 (degradation)	1.446	4,4%

HH.4.2. Tiết kiệm Năng lượng (Energy Saving Initiatives)

Biện pháp	Tiết kiệm (MWh/năm)	Tiết kiệm (K USD/năm)	CAPEX (K USD)	Payback
Solar PV 500kWp	650	65	380	5,8 năm
LED lighting (toàn bộ)	80	8	15	1,9 năm
VSD trên bơm/quạt	120	12	25	2,1 năm
Free cooling (DC economizer)	200	20	40	2,0 năm
Hot aisle containment (DC)	150	15	20	1,3 năm
Waste heat recovery (chiller → hot water)	50	5	15	3,0 năm
Smart BMS scheduling	100	10	10	1,0 năm
Tổng	~1.350	~135	~505	avg 3,7 năm

[C] Tiết kiệm năng lượng ~1.350 MWh/năm = ~10% tổng tiêu thụ. ROI trên portfolio: 3,7 năm.
Phù hợp yêu cầu ISO 50001 và cam kết ESG.

(Kết thúc Phụ lục HH — Kế hoạch Vận hành & Bảo trì)

PHỤ LỤC II: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU VÀ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ (EXPORT & INTERNATIONAL MARKET STRATEGY)

II.1. Phân tích Thị trường Xuất khẩu

II.1.1. Thị trường CNC Outsourcing — Quy mô & Tăng trưởng

Thị trường	Quy mô CNC Outsourcing (B USD, 2024)	CAGR 2024-2030	Share VN hiện tại	Cơ hội cho Mekong
Toàn cầu	75,0	6,8%	< 0,5%	Tham gia chuỗi supply Tier 2-3
Nhật Bản	12,0	3,5%	~2% (đã có)	Mở rộng via CPTPP, yêu cầu precision cao
Hàn Quốc	5,0	5,0%	~3%	Samsung/Hyundai ecosystem

Thị trường	Quy mô CNC Outsourcing (B USD, 2024)	CAGR 2024-2030	Share VN hiện tại	Cơ hội cho Mekong
USA	18,0	7,5%	< 0,5%	China+1, reshoring trend
EU	15,0	5,0%	< 0,5%	EVFTA ưu đãi thuế NK 0%
ASEAN	3,0	8,0%	~5%	Gần, logistics nhanh, cùng múi giờ
Trung Quốc	20,0	4,0%	0%	Khó tiếp cận, nhưng có nhu cầu outsource ngược

[B] Nguồn: Grand View Research 2024, Mordor Intelligence 2024. VN market share CNC outsourcing toàn cầu < 0,5% — room to grow rất lớn. Mekong target: 0,01% global share by Y5 = ~7,5M USD — phù hợp revenue projection.

II.1.2. Lợi thế Cạnh tranh VN vs Đối thủ

Yếu tố	VN	Trung Quốc	Thái Lan	Ấn Độ	Malaysia
Chi phí lao động	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★
Machine hour rate	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★
Chất lượng (hiện tại)	★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
FTA coverage	★★★★★ (CPTPP, EVFTA, RCEP)	★★	★★★	★★	★★★
Geopolitical risk	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
IP protection	★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★★★
Infrastructure	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
China+1 beneficiary	★★★★★	N/A	★★★★★	★★★★★	★★★★★

II.1.3. IoT/Robot — Thị trường Xuất khẩu ASEAN

Quốc gia	IoT Market Size 2025 (B USD)	Segment ưu tiên	Kênh tiếp cận	Revenue Target Y5 (K USD)
Thái Lan	8,5	Smart factory, agriculture	Distributor + partner	500-800
Indonesia	12,0	Agriculture, FMCG factory	Distributor	300-500
Philippines	4,0	BPO, smart building	Direct + distributor	200-400
Malaysia	6,0	E&E factory, palm oil	Direct	300-500

Quốc gia	IoT Market Size 2025 (B USD)	Segment ưu tiên	Kênh tiếp cận	Revenue Target Y5 (K USD)
Singapore	3,0	Smart city, logistics	Direct + OEM	200-300
Myanmar/Cambodia	1,5	Agriculture, basic IoT	NGO/Government projects	50-100
Tổng ASEAN export				~1.550-2.600

II.2. Quy trình Xuất khẩu

II.2.1. Preparation Checklist (trước khi xuất khẩu)

#	Hạng mục	Hoàn thành?	Ghi chú
1	Đăng ký mã số xuất nhập khẩu (Customs code)	Required	Thủ tục 5-7 ngày làm việc
2	Chứng nhận C/O (Certificate of Origin) cho FTA	Required	CPTPP: Form CPTPP, EVFTA: Form EUR.1, RCEP: Form RCEP
3	CE Marking (cho sản phẩm IoT xuất EU)	Required nếu EU	LVD + EMC + RoHS
4	FCC (cho sản phẩm IoT xuất USA)	Required nếu USA	FCC Part 15
5	Chứng nhận chất lượng (IATF/AS9100)	Required cho CNC automotive/aerospace	Xem lộ trình CC.1
6	Bảo hiểm vận chuyển quốc tế	Required	CIF/CIP terms
7	Incoterms agreement với khách	Required	FOB/CIF/DDP tùy khách
8	Hợp đồng bảo mật (NDA) + IP agreement	Required	Cho mọi khách hàng CNC
9	Packaging standard (export-grade)	Required	VCI paper, foam, wooden crate (ISPM 15)
10	Payment terms (L/C, T/T, factoring)	Required	L/C for new customer > 50K

II.2.2. Logistics Outbound

Tuyến	Phương thức	Thời gian	Chi phí (per kg)	Thường dùng cho
VN → Japan	Sea (FCL)	7-10 ngày	0,05-0,10 USD	CNC parts (bulk)
VN → Japan	Air	2-3 ngày	2,0-4,0 USD	Urgent/prototype
VN → USA	Sea (FCL)	18-25 ngày	0,08-0,15 USD	CNC parts
VN → USA	Air	3-5 ngày	3,0-6,0 USD	Samples, prototypes

Tuyến	Phương thức	Thời gian	Chi phí (per kg)	Thường dùng cho
VN → EU	Sea	25-35 ngày	0,08-0,15 USD	CNC parts
VN → ASEAN	Sea/Road	3-7 ngày	0,03-0,08 USD	IoT products
VN → ASEAN	Air	1-2 ngày	1,5-3,0 USD	Urgent

II.2.3. Thuế FTA — Áp dụng cho Sản phẩm Mekong

FTA	Đối tác	Thuế NK hiện hành (không FTA)	Thuế với FTA	Tiết kiệm	Điều kiện
CPTPP	Nhật Bản	3-5% (CNC parts)	0%	3-5%	C/O Form CPTPP, quy tắc xuất xứ ≥ 40% VA
EVFTA	EU 27	3-6% (CNC parts)	0%	3-6%	C/O Form EUR.1, quy tắc xuất xứ ≥ Regional Value Content
RCEP	Hàn Quốc, ASEAN	5-8%	0-2%	3-8%	C/O Form RCEP
ATIGA	ASEAN 10	5% (IoT products)	0%	5%	C/O Form D

[C] Ước tính tiết kiệm thuế nhập khẩu cho khách hàng: 3-6% trên revenue xuất khẩu. Tại Y5 với export revenue ~5-8M USD → tiết kiệm cho khách 150-480K USD → tăng sức cạnh tranh giá.

II.3. Chiến lược Thâm nhập Thị trường

II.3.1. Go-to-Market theo Thị trường

Thị trường	Phase 1 (Y1-Y2)	Phase 2 (Y3-Y4)	Phase 3 (Y5+)
ASEAN	Direct sales, trade shows (MTA, Metalex)	Regional distributor network	Subsidiary (Thailand)
Nhật Bản	Via trading company (Mitsui, Itochu)	Direct account (after IATF)	Sales office Tokyo
Hàn Quốc	Via Samsung/Nidec VN ecosystem	Direct + distributor	Sales rep Seoul
USA	Online marketplace (Thomasnet, MFG.com)	Rep office or agent	Sales office (if revenue > 3M)
EU	EVFTA advantage, trade shows (EMO, Hannover)	Distributor Germany	Agent network

II.3.2. Ngân sách Marketing Quốc tế

Kênh	CAPEX/năm (K USD)	Mục tiêu
Trade Shows (Metalex, MTA, EMO, JIMTOF)	30-50	Lead generation, brand awareness
Website + SEO (English, Japanese)	10-15	Inbound RFQs
LinkedIn Ads + Content	5-10	B2B leads
Sales Travel	15-25	Customer visits, relationship
Brochure / Video / Case Study	5-10	Collateral
Agent/Distributor Commission	20-40 (3-5% of export revenue)	Sales through partners
Tổng Marketing/năm	~85-150	

(Kết thúc Phụ lục II — Chiến lược Xuất khẩu & Thị trường Quốc tế)

PHỤ LỤC JJ: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI
(SOCIO-ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT)

JJ.1. Đóng góp Kinh tế Vĩ mô

JJ.1.1. Đóng góp GDP và Thu ngân sách

V2.1 NOTE: Bảng dưới đây dựa trên mô hình cũ (doanh thu từ Y1). V2.1: Doanh thu đầu tiên Y6 (IoT), Y10 Revenue = 14,50M, Y15 = 32,00M. Đóng góp ngân sách dịch sang phải ~5 năm nhưng tổng 15Y tương đương (~22M USD).

Chỉ số	Y1	Y3	Y5	Y10	Tổng 10Y
Revenue (M USD)	0,43	10,50	23,00	32,80	205,20
Giá trị gia tăng VA (M USD, ~45% revenue)	0,19	4,73	10,35	14,76	92,34
CIT đóng ngân sách (K USD)	0	0	0 (miễn 4Y)	1.230	~6.000
PIT đóng ngân sách (K USD)	80	350	600	800	~5.500
Thuế BHXH + phí (K USD)	150	500	800	1.000	~7.000

Chi số	Y1	Y3	Y5	Y10	Tổng 10Y
Tổng đóng góp ngân sách (K USD)	230	850	1.400	3.030	~18.500

[C] Tổng đóng góp ngân sách 10 năm: ~18,5M USD (thuế CIT + PIT + BHXH + các loại phí). Đây là ROI cho nhà nước trên ưu đãi KCNC đã cấp. Tỷ lệ thu hồi: 18,5M / (ước tính ưu đãi thuế = CIT miễn 4Y + giảm 50% 9Y ≈ 5M USD) → 3,7× ROI cho nhà nước.

JJ.1.2. Tạo Việc làm

V2.1 NOTE: Bảng dưới đây đã cập nhật theo mô hình V2.1 (5 giai đoạn, xây dựng Y0-Y5). Headcount V2.1: Y0-Y4 = 15, Y5-Y6 = 59, Y7-Y9 = 131, Y10-Y13 = 217, Y15 = 300.

Chi số	Y5	Y7	Y10	Y15
Việc làm trực tiếp	15	131	217	300
Việc làm gián tiếp (hệ số 2×)	30	262	434	600
Tổng việc làm	45	393	651	900
Lương trung bình (triệu VND/tháng)	18	20	22	25
Thu nhập tổng/năm (M USD)	0,12	1,13	2,06	3,24

JJ.1.3. Chuyển giao Công nghệ

Lĩnh vực	Công nghệ chuyển giao	Nguồn	Đối tượng thụ hưởng	Giá trị (K USD/5Y)
CNC 5-axis	Gia công precision, CAM programming	DMG Mori, Mazak (JP/DE)	Kỹ sư VN, sinh viên	500-800
SMT/IoT	Thiết kế embedded, firmware, RF	NXP, STMicroelectronics	Kỹ sư VN	200-400
DC Operations	Tier III design, PUE optimization	Schneider, Uptime Institute	Kỹ sư M&E VN	100-200
Quality Systems	IATF 16949, SPC, FMEA, PPAP	AIAG, BSI	Ngành CNC VN	100-200
Robotics	AMR navigation, ROS2, SLAM	In-house R&D + academic	Hệ sinh thái robotics VN	200-300
Tổng giá trị chuyển giao				~1.100-1.900

JJ.2. Tác động Xã hội

JJ.2.1. Phát triển Nguồn nhân lực

Chi số	Giá trị	Chi tiết
SV thực tập/năm	20-30	Từ HCMUT, HUTECH, Cao Thắng
Chuyển thành NV chính thức	60-70%	Pipeline tuyển dụng chính
Học bổng Mekong	10-15 suất/năm	20 triệu VND/suất
Capstone project tài trợ	2-3/năm	Liên kết ĐH
Chứng chỉ quốc tế được tài trợ/năm	30-50	AWS, Siemens NX, Six Sigma
Tổng đào tạo/năm (giờ)	60-80h/người	300 nhân viên × 60h = 18.000 giờ đào tạo

JJ.2.2. Tác động Môi trường (EIA Summary)

Chi số	Giá trị	So với QCVN	Trạng thái
Khí thải (bụi, CO, NOx)	Đạt QCVN 19:2009 cột A	Thấp hơn 50-70% ngưỡng	Đạt
Nước thải CNC	ZLD (Zero Liquid Discharge)	0 m³ xả	Tốt hơn QCVN
Nước thải DC	≤ QCVN 40:2011 cột A	Monitoring	Đạt
GHG reduction	-27% vs baseline	Không có QCVN nhưng ESG	Vượt
Tiếng ồn	< 70 dBA tại hàng rào	QCVN 26:2010	Đạt
Rung động CNC	Isolation foundation → < QCVN quy định	—	Đạt
Chất thải nguy hại	Thu gom + xử lý đúng quy trình	NĐ 08/2022	Đạt

JJ.2.3. CSR & Cộng đồng

Hoạt động	Ngân sách/năm (K USD)	Đối tượng	Tần suất
Học bổng ĐH	10	Sinh viên kỹ thuật	Hàng năm
Workshop STEM cho học sinh phổ thông	5	HS cấp 3 tại Q.9	2 lần/năm
Tài trợ giải đấu Robotics	5	ĐH/CD khu vực	Hàng năm
Hiến máu nhân đạo	1	Nhân viên	2 lần/năm
Trồng cây xanh	2	Khu vực xung quanh KCNC	Hàng năm
Hỗ trợ đào tạo nghề	8	CD Kỹ thuật	Hàng năm (lab equipment)
Tổng CSR	~31		

JJ.3. Phân tích Chi phí - Lợi ích (Cost-Benefit Analysis — CBA)

JJ.3.1. CBA từ góc nhìn Nhà nước (10 năm)

Hạng mục	Giá trị (M USD)	Ghi chú
Lợi ích (Benefits):		
Thu ngân sách (CIT + PIT + BHXH)	18,5	[C] Xem JJ.1.1
Giá trị gia tăng (VA contribution → GDP)	92,3	45% of revenue
Chuyển giao công nghệ	1,5	Proxy value
Việc làm (tổng thu nhập 10Y)	25,0	1.050 jobs × avg wage
Giảm nhập khẩu (import substitution)	5,0	CNC trong nước thay NK
Xuất khẩu ròng (foreign exchange)	30,0	Estimate 30% revenue is export
Tổng Benefits	~172	
Chi phí (Costs):		
Ưu đãi thuế CIT (foregone CIT revenue)	5,0	Miễn 4Y + giảm 50% 9Y
Ưu đãi thuế NK (miễn thuế thiết bị)	1,5	Thuế NK thiết bị ≈ 3% CAPEX
Hạ tầng KCNC (phần nhà nước)	0,5	Đường nội bộ, điện đến hàng rào
Tổng Costs	~7,0	
B/C Ratio	~24,6×	Benefits / Costs
Net Benefit	~165M	

[C] B/C Ratio 24,6× — dự án mang lại giá trị kinh tế-xã hội rất cao cho nhà nước so với chi phí ưu đãi. Đây là luận điểm then chốt khi trình bày BQL KCNC và cơ quan phê duyệt.

JJ.3.2. So sánh với Dự án FDI khác tại KCNC

Tiêu chí	Mekong (VN company)	FDI trung bình tại KCNC	Ghi chú
CAPEX	47,5M USD	30-100M USD	Trung bình-cao
Diện tích	1 ha (GFA 21.000 m²)	5-20 ha	Nhỏ — mật độ cao
Việc làm trực tiếp (Y15)	300	200-500	Phù hợp
Revenue/m² GFA (Y15)	1.524 USD/m²	1.000-3.000	Trung bình-cao
Revenue/nhân viên (Y15)	106.700 USD	50.000-100.000	Trên trung bình
CAPEX/việc làm	158K USD	100-300K	Trung bình (capital-intensive)
Giá trị R&D	3-5% revenue	1-2%	Cao hơn trung bình

Tiêu chí	Mekong (VN company)	FDI trung bình tại KCNC	Ghi chú
Chuyển giao CN	Cao (3 lĩnh vực)	Thấp-TB (1 lĩnh vực)	Ưu thế Mekong
Doanh nghiệp VN	✓	×	Ưu tiên chính sách

(Kết thúc Phụ lục JJ — Đánh giá Tác động Kinh tế-Xã hội)

PHỤ LỤC KK: QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CHẤT THẢI TOÀN DIỆN (COMPREHENSIVE WATER & WASTE MANAGEMENT)

KK.1. Cân bằng Nước Tổng thể (Water Balance)

KK.1.1. Nhu cầu Nước theo Khối

Nguồn sử dụng	Lưu lượng (m³/ngày)	Chất lượng nước yêu cầu	Nguồn
Cooling Tower (DC + CNC)	50-80	Softened water	Cấp nước KCNC
CNC Coolant makeup	5-10	DI water (deionized)	RO system on-site
CNC Metalworking Fluid	2-3 (coolant concentrate + water)	DI water	Batch mixing
Clean Room humidification	3-5	RO/DI water	RO system
Domestic (VS + canteen)	20-30	Potable	Cấp nước KCNC
Landscape/Fire	5-10	Raw / recycled	Rainwater harvest + KCNC
Tổng nhu cầu	85-138		
KCNC Quota	100 m³/ngày		EIA approval — THIẾU!

[C] Nhu cầu peak ~138 m³/ngày > Quota KCNC 100 m³/ngày — VƯỢT 38%. Giải pháp: (a) Rainwater harvesting → 10-15 m³/ngày, (b) Cooling tower blowdown reuse → 10-15 m³/ngày, (c) RO reject reuse cho toilet flushing → 5-8 m³/ngày. Net gap: ~0 m³/ngày (self-sufficient after measures). Chi tiết tại Phụ lục R.

KK.1.2. Sơ đồ Xử lý Nước




Diagram 79

KK.2. Hệ thống ZLD (Zero Liquid Discharge) cho CNC

KK.2.1. Quy trình ZLD

Bước	Thiết bị	Chức năng	CAPEX (K USD)
1	Oil-Water Separator	Tách dầu nổi (> 90% free oil removal)	20
2	pH Adjustment + Coagulation	Trung hòa + keo tụ kim loại nặng	15
3	DAF (Dissolved Air Flotation)	Tách chất rắn lơ lửng + emulsified oil	30
4	Ultrafiltration (UF)	Lọc 0,01µm (turbidity < 1 NTU)	25
5	Reverse Osmosis (RO)	Khử muối, concentrate metals	40
6	Evaporator (MVR)	Cô đặc RO reject → crystallizer	50
7	Crystallizer	Kết tinh muối → chất thải rắn	30
	Tổng ZLD		~210

KK.2.2. Thông số Vận hành ZLD

Thông số	Đầu vào	Sau DAF	Sau UF	Sau RO	Condensate (tái sử dụng)
pH	3-12	7-8	7-8	6,5-7,5	6,5-7
COD (mg/L)	500-2.000	< 200	< 50	< 10	< 5
Oil & Grease (mg/L)	100-500	< 20	< 5	< 1	< 0,5
TSS (mg/L)	200-500	< 50	< 1	< 0,5	< 0,1
Cr tổng (mg/L)	5-20	< 1	< 0,5	< 0,05	N.D.
Ni (mg/L)	2-10	< 0,5	< 0,2	< 0,02	N.D.
TDS (mg/L)	1.000-5.000	1.000-3.000	800-2.500	< 50	< 10

[C] Hệ thống ZLD đảm bảo 0 m³ nước thải CNC xả ra môi trường. Nước condensate tái sử dụng cho coolant makeup → giảm nhu cầu nước cấp 3-5 m³/ngày.

KK.3. Quản lý Chất thải

KK.3.1. Phân loại Chất thải

Loại	Ví dụ	Khối lượng ước tính (tấn/năm)	Xử lý	Đơn vị thu gom	Chi phí (K USD/năm)
Phoi CNC (nhôm, thép)	Metal chips, turnings	100-200	Tái chế (bán)	NCC tái chế kim loại	-15 đến -30 (thu nhập!)
Dầu thải (coolant, hydraulic)	Used MWF, oil	5-10	Thu gom chuyên dụng	Đơn vị có license	3-5
Bùn thải ZLD	Hydroxide sludge, crystallize salt	2-5	Hazardous waste → landfill/cement kiln	Đơn vị hazwaste	5-10
WEEE (electronic waste)	Failed PCB, obsolete server	1-3	Tái chế WEEE	Đơn vị có license	2-4
Bao bì (carton, pallet)	Packaging	10-20	Tái chế	NCC tái chế	-1 đến -2 (thu nhập)
Rác sinh hoạt	Food waste, paper	15-25	KCNC collection	KCNC	2-3
Chất thải nguy hại khác	Solvent, acid, Cr(VI) waste	1-2	Đặc biệt — licensed hazwaste	Đơn vị có license	5-8
Tổng chi phí xử lý chất thải					~15-25 (net)

[C] Phoi CNC (100-200 tấn/năm) tạo thu nhập 15-30K USD/năm từ bán phế liệu. Giá phôi nhôm phế liệu: ~1,2-1,5 USD/kg, phôi thép: ~0,3-0,5 USD/kg.

KK.3.2. Lộ trình Circular Economy

Năm	Mục tiêu tái chế (%)	Biện pháp	KPI
Y1	50%	Phân loại 4 dòng cơ bản	Tonnage tái chế
Y2	65%	Thêm compost (food waste), expand metal recycling	Waste diversion rate
Y3	75%	Palette tái sử dụng, packaging optimization	Cost of waste
Y5	85%	Near-zero waste to landfill (trừ hazardous)	Landfill diversion
Y10	90%	Full circular economy model	Revenue from waste

(Kết thúc Phụ lục KK — Quản lý Nước & Chất thải Toàn diện)

PHỤ LỤC LL: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG PHASE 2-3 (EXPANSION ROADMAP)

LL.1. Tổng quan Phase

LL.1.1. Master Plan 3 Phase

Phase	Thời gian	CAPEX (M USD)	Diện tích XD (m ²)	Capacity	Revenue Target (M USD/năm)
Phase 1 (Hiện tại)	Y0-Y3 (27 tháng XD)	47,50	40.000	28 CNC, 100 racks, 1 SMT line	10,5 (Y3)
Phase 2	Y3-Y5	15,00-20,00	+15.000	+12 CNC, +50 racks, +1 SMT line	23,0 (Y5)
Phase 3	Y5-Y8	10,00-15,00	+10.000	+10 CNC, +50 racks, GPU farm	32,8 (Y10)
Tổng (Full Build-out)	Y0-Y8	72,50-82,50	65.000	50 CNC, 200 racks, 2 SMT, GPU	32,8

LL.1.2. Trigger điều kiện mở rộng

Phase	Trigger	KPI cần đạt	Quyết định bởi
Phase 2 → Start	CNC utilization > 70%, DC occupancy > 65%	OEE CNC avg > 65%, Revenue > 8M/năm, EBITDA > 0	CEO + Board
Phase 3 → Start	CNC utilization > 75%, DC occupancy > 80%	Revenue > 20M/năm, EBITDA margin > 30%, DSCR > 2×	CEO + Board + Investor

LL.2. Phase 2 — Chi tiết

LL.2.1. CNC Expansion (Khối B — Phase 2)

Hạng mục	Số lượng	CAPEX (K USD)	Ghi chú
CNC 5-axis (DMG/Mazak)	4	2.800	Cho segment aerospace/medical
CNC 3-axis (Mazak/Haas)	6	1.200	Tăng capacity general industrial
CNC Turning (Doosan)	2	400	

Hạng mục	Số lượng	CAPEX (K USD)	Ghi chú
CMM thêm (Hexagon)	1	180	QC bottleneck relief
Tooling + First fill	lot	200	
Installation + Foundation	lot	300	Vibration isolation cho 5-axis
Tổng CNC Phase 2	13 máy	~5.080	Capacity tăng 46%

LL.2.2. DC Expansion (Khối A — Phase 2)

Hạng mục	CAPEX (K USD)	Ghi chú
Data Hall 2 fit-out (50 racks)	2.500	Rack + PDU + cabling
UPS expansion (add 1 string 300kVA)	300	Maintain 2N
Chiller addition (1 unit 250kW)	120	Maintain N+1
DLC (Direct Liquid Cooling) for GPU racks	200	10-20 high-density racks (20-40 kW each)
Network upgrade (400GbE spine)	80	For increased traffic
Tổng DC Phase 2	~3.200	50 → 150 racks

LL.2.3. IoT/SMT Expansion (Khối C — Phase 2)

Hạng mục	CAPEX (K USD)	Ghi chú
SMT Line 2 (mid-volume, higher mix)	500	Fuji NXT III
Assembly area expansion (200 m²)	100	Workstations, test jig
Robot AMR assembly cell	200	For AMR-100/200 production
Additional test equipment (EMC pre-compliance)	80	Reduce external testing
Tổng IoT Phase 2	~880	

LL.2.4. Tổng CAPEX Phase 2

Hạng mục	CAPEX (K USD)
CNC Expansion	5.080
DC Expansion	3.200
IoT Expansion	880
M&E Addition (power, HVAC)	1.500
Construction (15.000 m² extension)	3.500
IT + Software upgrade	300
Working Capital	1.500

Hạng mục	CAPEX (K USD)
Contingency (10%)	1.600
Tổng Phase 2	~17.560

[C] Phase 2 CAPEX ~17,5M USD — tài trợ chủ yếu từ: (a) FCF tích lũy Y3-Y4 (~3-7M), (b) Vay bổ sung 5-8M, (c) Nhà đầu tư mới / private equity 5-8M. Không cần equity dilution nếu FCF on track.

LL.3. Phase 3 — Định hướng

LL.3.1. GPU/AI Datacenter

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Capacity	50 racks (20-40 kW/rack)	High-density GPU farm
Cooling	Direct Liquid Cooling (DLC) + Immersion Cooling	PUE target: 1,15-1,20
Power	+2-3 MW dedicated	Dedicated transformer
Target Customer	AI training houses, cloud providers (AWS, Azure Outpost)	Data localization + low cost
Revenue/rack/tháng	3.000-5.000 USD	2-3× regular colocation
CAPEX	~5.000-8.000 K USD	Higher cost per rack

LL.3.2. Advanced Manufacturing

Capability	Timeline	CAPEX (K USD)	Market
Additive Manufacturing (Metal 3D Printing)	Y6	500-1.000	Aerospace, medical prototypes → bridge production
EDM (Sink er EDM) thêm	Y5	200-400	Mold & die, complex cavities
Automation (Robot loading CNC)	Y5-Y6	300-500 per cell	Lights-out manufacturing target
CMM Auto-loading	Y6	200-300	QC throughput
In-house Coating/Anodizing	Y7	500-800	Reduce subcontract, NADCAP potential
Tổng Phase 3 Manufacturing		~1.700-3.000	

LL.4. Phát triển Quỹ đất

LL.4.1. Quy hoạch Sử dụng Đất 1 ha (V2.1)

V2.1 NOTE: Diện tích đất V2.1 = 1 ha (10.000 m²). Bảng dưới đây thay thế quy hoạch 15 ha cũ. Mật độ xây dựng 70% (phép 75%), 1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m².

Khu vực	Diện tích (m ²)	% Đất	Ghi chú
Tòa nhà (footprint)	7.000	70,0%	3 tầng → GFA 21.000 m ²
Sân bãi / Đường nội bộ / Parking	1.500	15,0%	Loading dock + xe nhân viên
Cây xanh / Landscape	1.000	10,0%	Đạt quy định KCNC ≥ 10%
Hạ tầng kỹ thuật (WTP, trạm điện, PCCC)	500	5,0%	Genset, chiller, tank nước
Tổng	10.000	100%	

[C] Mật độ xây dựng: 70% — đạt quy định KCNC ≤ 75%. Tỷ lệ cây xanh 10% — đạt quy định ≥ 10%. V2.1 không có quỹ đất dự phòng; mở rộng = tăng tầng hoặc thuê đất bổ sung.

(Kết thúc Phụ lục LL — Kế hoạch Phát triển Mở rộng Phase 2-3)

PHỤ LỤC MM: BẢNG TỔNG HỢP CHỈ SỐ TOÀN DỰ ÁN (MASTER KPI DASHBOARD)

MM.1. Financial KPIs — 10 Year Summary

V2.1 NOTE: Bảng KPI dưới đây dựa trên mô hình cũ (doanh thu từ Y1, vay từ Y0). V2.1: Y0-Y5 = 0 revenue, Y6 = 2,50M, Y10 = 14,50M, Y15 = 32,00M. Xem §5.4 và §5.6 cho V2.1 P&L.

KPI	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
Revenue (M USD)	0,43	4,50	10,50	17,00	23,00	26,30	28,70	30,80	31,90	32,80
EBITDA (M USD)	-2,80	-0,20	2,20	5,50	8,70	10,50	11,80	13,00	13,60	14,10
EBITDA Margin	neg	neg	21%	32%	38%	40%	41%	42%	43%	43%
Net Income	-4,50	-3,08	-0,65	2,52	5,54	7,29	8,60	9,81	10,49	11,07

KPI	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
(M USD)										
FCF (M USD)	-27,85	-16,00	-3,30	3,20	7,00	9,40	10,80	11,11	11,64	12,07
Cum. FCF (M USD)	-27,85	-43,85	-47,15	-43,95	-36,95	-27,55	-16,75	-5,64	6,00	18,07

MM.2. Operational KPIs

KPI	Y1	Y3	Y5	Y10	Unit
CNC OEE (avg)	55%	70%	80%	85%	%
DC PUE	1,40	1,32	1,28	1,26	ratio
DC Uptime	99,95%	99,982%	99,995%	99,999%	%
OTD (CNC)	90%	95%	98%	99%	%
Quality PPM (CNC)	5.000	1.000	500	100	PPM
First Pass Yield	90%	95%	97%	99%	%
Scrap Rate	8%	5%	3%	2%	% material
Headcount	85	220	300	350	people
Revenue/Employee (K USD)	5,1	47,7	76,7	93,7	K USD
Training Hours/person/year	80	60	50	40	hours
Employee Retention	85%	90%	92%	95%	%

MM.3. ESG & Sustainability KPIs

KPI	Y1	Y3	Y5	Y10	Unit
GHG Emissions (Scope 1+2)	3.000	6.500	8.500	9.000	tCO ₂ e/yr
GHG Reduction vs Baseline	0%	15%	27%	30%	%
Solar Generation	0	650	650	600	MWh/yr
Water Recycling Rate	10%	25%	35%	40%	%
CNC WW Discharge	0	0	0	0	m ³ /day (ZLD)
Waste Recycling Rate	50%	75%	85%	90%	%

KPI	Y1	Y3	Y5	Y10	Unit
ISO Certifications	3	5	7	8	count
Patents Filed	1	5	10	20	cumulative
CSR Budget (K USD)	15	25	31	40	K USD/yr

MM.4. Investment Summary

V2.1 NOTE: Cập nhật theo mô hình V2.1 (50Y, 5 Phase, self-funded Y0-Y9).

Metric	Giá trị	Nhãn
Tổng CAPEX	47,50M USD	[C]
Vốn CSH	34,97M USD (100% Y0-Y9)	[C]
Vay	12,53M USD (từ Y10)	[C]
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50M USD	[C]
NPV (20Y, WACC 12%)	(5,30)M USD	[C]
IRR (50Y)	13,0%	[C]
IRR (20Y)	~9,5%	[C]
Discounted Payback	Y13	[C]
Revenue Y10	14,50M USD	[C]
Revenue Y15	32,00M USD	[C]
Revenue 15Y	~165M USD	[C]
Strategic Value	20,32M USD	[C]
Monte Carlo P(NPV>0, 50Y)	65%	[C]
B/C Ratio (xã hội)	24,6x	[C]
Việc làm tạo ra (trực tiếp + gián tiếp)	1.050	[C]
Đóng góp ngân sách 15Y	~22M USD	[C]

MM.5. Số liệu Quy chiếu (Cross-Check Reference)

Bảng này dùng để đối chiếu nhanh — cập nhật V2.1. Mọi số liệu phải NHẤT QUÁN trong toàn bộ tài liệu.

#	Số liệu	Giá trị chính thức V2.1	Xuất hiện tại	Nhãn
1	CAPEX tổng	47,50M USD	Trang bìa, 5.1, MM.4	[C]

#	Số liệu	Giá trị chính thức V2.1	Xuất hiện tại	Nhãn
2	NPV (50Y)	1,50M USD	5.4.2, A.5, MM.4	[C]
3	NPV (20Y)	(5,30)M USD	5.4.2, A.5	[C]
4	IRR (50Y)	13,0%	5.4.2, A.5, MM.4	[C]
5	Revenue Y10	14,50M USD	5.4, MM.4	[C]
6	Revenue Y15	32,00M USD	5.4, MM.4	[C]
7	Revenue 15Y tổng	~165M USD	5.4, MM.4	[C]
8	Strategic Value	20,32M USD	Phụ lục O, MM.4	[C]
9	Vốn CSH	34,97M USD (100% Y0-Y9)	5.2, MM.4	[C]
10	Vay	12,53M USD (từ Y10)	5.2, A.4, MM.4	[C]
11	CNC machines	28 (15+13)	4.3, AA.2.1, Q	[C]
12	DC racks	100 (50+50)	4.2, S.1, AA.2.4	[C]
13	PUE target	1,32 → 1,28 → 1,26	S.3, HH.3.1, MM.2	[C]
14	EIA CAPEX	2,87M USD	R.11, Phụ lục R	[C]
15	MC P(NPV>0, 50Y)	65%	5.9, MM.4	[C]
16	Breakeven (EBIT>0)	Y8-Y9	5.16, MM.4	[C]
17	Headcount Y15	300	7.1.2, MM.4	[C]
18	Land	1 ha, GFA 21.000 m ²	4.1, MM.4	[C]
19	CNC CAPEX	14,69M	Phụ lục P, Q	[C]
20	MK-200 BOM	82 USD	Phụ lục T	[C]
21	Robot AMR COGS	16K USD	Phụ lục T	[C]
22	ESOP Pool	5% equity	7.5	[C]
23	M&E BOQ	~10.355K USD	Phụ lục L	[C]
24	QA/QC Equipment	~670K USD	Phụ lục Q (comprehensive)	[C]
25	DC Revenue 10Y	36.060K USD	Phụ lục S	[C]
26	GHG Reduction	≥ 25-27%	R.10, KK, MM.3	[C]
27	ZLD CNC	0 m ³ /day	R.7, KK.2, MM.3	[C]
28	DSCR min (Y11)	4,91×	EE.4.2	[C]
29	Diện tích đất	1 ha = 10.000 m ²	Trang bìa, 4.1, MM.4	[C]
30	Thời hạn dự án	50 năm	Trang bìa	[C]

(Kết thúc Phụ lục MM — Bảng Tổng hợp Chỉ số Toàn Dự án)

PHỤ LỤC NN: CHI TIẾT KỸ THUẬT THIẾT BỊ & DATASHEET

(EQUIPMENT SPECIFICATIONS)

NN.1. CNC Machine Specifications — So sánh Nhà cung cấp

NN.1.1. CNC 5-Axis Comparison Matrix

Thông số	DMG MORI DMU 50 3rd Gen	MAZAK VARIAXIS i-600	OKUMA MU-5000V	Ghi chú
Hành trình X/Y/Z	500/450/400 mm	560/460/460 mm	762/460/460 mm	Okuma lớn nhất
Tốc độ Spindle (max)	20.000 RPM	12.000 RPM (opt. 18.000)	15.000 RPM	DMG MORI nhanh nhất std
Spindle Motor	35 kW (S1)	25 kW (30 min)	22 kW (cont.)	DMG MORI mạnh nhất
Bàn xoay (B/C)	-35°/+110° / 360°	-30°/+120° / 360°	-30°/+120° / 360°	
Tải trọng bàn	200 kg	300 kg	400 kg	Okuma tốt nhất cho chi tiết nặng
Controller	CELOS + Siemens/Heidenhain	Mazatrol SmoothAi	OSP-P500A	Mazatrol AI tích hợp tốt
Tool Magazine	30 (opt. 60/120)	40 (opt. 80)	32 (opt. 48)	
Accuracy (P)	5 µm	5 µm	4 µm	Okuma tốt nhất
Repeatability (Ps)	3 µm	3 µm	2 µm	
Footprint	4.600 × 3.200 mm	3.900 × 3.150 mm	3.370 × 3.450 mm	Mazak compact nhất
Machine Weight	8.200 kg	10.500 kg	12.000 kg	Quan trọng cho foundation
Coolant System	Internal coolant + mist	Internal/external coolant	Internal 70 bar	
Thermo-compensation	SENSORpak	Thermal Shield	Thermo-Friendly Concept	
Automation Ready	DMG pallet changer, robot	Pallet changer, Palletech	ROID (robot integration)	
Giá tham khảo (K USD)	350-450	380-480	400-500	FOB, chưa thuế NK
Lead Time	12-16 tuần	10-14 tuần	14-18 tuần	Mazak nhanh nhất
Điểm đánh giá (1-10)	8,5	8,0	8,2	Weighted score nội bộ

[A] Lựa chọn đề xuất Phase 1: DMG MORI DMU 50 3rd Gen — lý do: spindle power cao nhất (thích hợp Ti, Inconel), CELOS ecosystem mature, chi phí bảo trì hợp lý tại VN. Phase 2 xem xét Mazak VARIAXIS cho loạt lớn hơn (bàn tải 300 kg).

NN.1.2. CNC 3-Axis (Vertical Machining Center)

Thông số	MAZAK VCN-530C	HAAS VF-4SS	DOOSAN DNM 6700	Ghi chú
Hành trình X/Y/Z	530/530/510 mm	1.270/508/635 mm	670/400/520 mm	Haas lớn nhất
Tốc độ Spindle	12.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	Tương đương
Spindle Motor	18,5 kW	22,4 kW	15 kW	
Tool Magazine	30	40+1	30	
Accuracy	5 µm	8 µm	5 µm	Haas thấp hơn
Giá (K USD)	180-220	110-140	130-160	Haas rẻ nhất
Phù hợp	General precision	High-volume, less critical	General balance	

[A] Lựa chọn hỗn hợp Phase 1: 4× MAZAK VCN (precision), 4× HAAS VF-4SS (volume), 2× DOOSAN (backup) — tối ưu chi phí/năng suất.

NN.1.3. CNC Turning Center

Thông số	DOOSAN PUMA 2600SY	MAZAK QT-250MSY	Ghi chú
Max Turning Dia	340 mm	366 mm	
Max Turning Length	560 mm	500 mm	
Sub-spindle	Có	Có	Done-in-one
Y-axis	±52,5 mm	±50 mm	
Live Tooling	12 pos	12 pos	
Spindle Speed	4.000 RPM	5.000 RPM	
Giá (K USD)	160-200	200-250	

NN.2. Datacenter Equipment Specifications

NN.2.1. Server Rack & Power Distribution

Thông số	Rittal TS IT 42U	Schneider NetShelter SX 42U	CPI N-Series 42U	Ghi chú
Height	42U (2.000 mm)	42U (1.991 mm)	42U (2.032 mm)	
Width	600/800 mm	600/750 mm	600/700 mm	
Depth	1.200 mm	1.070 mm	1.200 mm	
Static Load	1.500 kg	1.364 kg	1.500 kg	Rittal = CPI
Cable Management	Side vertical	Side vertical	Overhead	
PDU Compatible	3-phase 32A	3-phase 32A	3-phase 32A	

Thông số	Rittal TS IT 42U	Schneider NetShelter SX 42U	CPI N-Series 42U	Ghi chú
IP Rating	IP20 (opt. IP55)	IP20	IP20	
Giá (USD/rack)	800-1.200	600-900	700-1.000	

NN.2.2. UPS Specifications

Thông số	Schneider Galaxy VS 500kVA	Vertiv Liebert EXS 500kVA	Ghi chú
Topology	Double-conversion online	Double-conversion online	
Efficiency	97% (eConversion 99%)	96,1%	Schneider hiệu quả hơn
THDi	< 3%	< 3%	
Battery Runtime (FL)	8 min (internal)	8 min (internal)	External battery cab. for 30 min
Footprint	600 × 1.100 mm	710 × 810 mm	
Communication	SNMP/Modbus/BACnet	SNMP/Modbus	
Giá (K USD)	85-110	75-95	Cho 1 unit

NN.2.3. Precision Cooling

Thông số	Schneider InRow RC 30kW	Vertiv CRV 35kW	Stulz CyberAir 3 40kW	Ghi chú
Cooling Capacity	30 kW	35 kW	40 kW	
Type	In-row, DX	In-row, chilled water	In-row, DX/CW	
Air Flow	5.100 m³/h	5.800 m³/h	6.500 m³/h	
PUE Contribution	0,35-0,40	0,30-0,35	0,28-0,32	Stulz tốt nhất
Giá (K USD)	18-25	20-28	25-32	

NN.3. IoT/SMT Line Equipment

NN.3.1. SMT Line Configuration

Pos	Thiết bị	Model	Thông số chính	Số lượng	Giá (K USD/unit)
1	PCB Loader	Fuji NXLC	Auto-load, 330×250 mm max	1	12
2	Screen Printer	DEK TQ	Accuracy ±12,5 µm, cycle 12s	1	120
3	SPI (Solder Paste	Koh Young KY8030	3D measurement,	1	95

Pos	Thiết bị	Model	Thông số chính	Số lượng	Giá (K USD/unit)
	Inspection)		±5 µm		
4	Pick & Place (high-speed)	Fuji NXT III H24G	33.000 CPH, 01005 capable	2	180
5	Pick & Place (flexible)	Fuji AIMEX III	27.000 CPH, odd-form, 0,3 mm pitch	1	220
6	Reflow Oven	Heller 1936 MK5	10 zones, N2 capable, ±1°C	1	85
7	AOI (Post-reflow)	Koh Young Zenith Alpha	3D AOI, ≤1 false call/panel	1	110
8	AXI (X-ray)	Nikon XT V 160	BGA/QFN voiding inspection	1	180
9	ICT	Keysight i3070 Series 6	3.840 test points	1	120
10	FCT (Functional Test)	Custom + NI PXI	Per product configuration	2	35
11	Conformal Coat	Nordson Asymtek SL-940E	Selective coating	1	45
12	PCB Unloader	Fuji NXLC	Auto-unload, FIFO	1	12
	Tổng SMT Line 1			14	~1.334

[C] Tổng SMT Line 1: ~1.334K USD. Throughput lý thuyết: 33.000 CPH (placement-limited). Thực tế accounting changeover: 18.000-22.000 CPH. Đủ cho 2 ca sản xuất MK-200 (500 unit/tháng) + job-shop IoT orders.

NN.3.2. Test Equipment — IoT Products

Thiết bị	Mục đích	Số lượng	Giá (K USD)
Spectrum Analyzer (Keysight N9322C)	RF test WiFi/BLE/LoRa	1	12
Network Analyzer (Keysight E5063A)	Impedance, antenna	1	18
Oscilloscope (Keysight DSOX3054T)	Signal integrity, debug	2	8
DMM + Power Supply	Basic EE test	5	1
Environmental Chamber	Temp/humidity cycling (-40 ~ +85°C)	1	25
Vibration Shaker (Sentek)	Mechanical reliability	1	35
EMC Pre-compliance (TekBox)	Pre-scan EMI/EMS	1	8
Battery Cycler (Neware)	Battery life testing	1	15

Thiết bị	Mục đích	Số lượng	Giá (K USD)
Tổng Test Equipment			~131

NN.4. QA/QC Equipment — Updated List

#	Thiết bị	Model	Accuracy	Số lượng	Giá (K USD)	Vị trí
1	CMM	Hexagon GLOBAL S 9.12.8	1,7 + L/333 μ m	1	180	CNC QC Lab
2	CMM (compact)	Hexagon TIGO SF	2,5 μ m	1	80	CNC shopfloor
3	Surface Roughness	Mitutoyo SJ-410	0,001 μ m Ra	2	8	CNC
4	Profile Projector	Nikon V-24B	10 μ m	1	15	CNC
5	Hardness Tester	Mitutoyo HM-220	$\pm$ 0,5 HV	1	8	CNC
6	Height Gauge	Mitutoyo LH-600	1 μ m	2	5	CNC
7	Microscope	Nikon MM-800	Opt. 1000 $\times$	1	12	CNC/IoT
8	Thread Gauges	Set M2-M50, UNC/UNF	Go/No-Go	lot	5	CNC
9	Pin Gauge Set	1-20 mm (0,01 step)	Class 0	2 sets	3	CNC
10	XRF Analyzer	Olympus Vanta M	Material verification	1	35	Incoming
11	3D Scanner	GOM ATOS Q 12M	0,02 mm	1	70	CNC reverse eng.
12	Force/Torque Tester	Mark-10 ESM303	0,1% FS	1	5	IoT/Robot
13	Thermal Camera	FLIR T660	$\pm$ 1 $^{\circ}$ C	1	15	DC/CNC monitoring
14	Power Analyzer	Hioki PW6001	0,02%	1	10	DC
15	Data Logger (multi-ch)	Keysight DAQ970A	70 ch, 0,004%	2	4	Everywhere
	Tổng QA/QC Equipment				~498	

[C] Tổng QA/QC Equipment CAPEX: ~498K USD (Phase 1). Bổ sung Phase 2: ~170K (thêm CMM +

3D scanner). Tổng 10Y lifecycle: ~670K bao gồm calibration + replacement.

(Kết thúc Phụ lục NN — Chi tiết Kỹ thuật Thiết bị & Datasheet)

PHỤ LỤC 00: CHIẾN LƯỢC THOÁI VỐN & QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (EXIT STRATEGY & INVESTOR RELATIONS)

00.1. Các Kịch bản Thoái vốn (Exit Scenarios)

00.1.1. Ma trận Exit

Kịch bản	Timeline	Xác suất	Valuation Multiple	EV ước tính	Ghi chú
A. IPO nội địa (HOSE/HNX)	Y7-Y10	15%	P/E 12-18×	90-160M USD	Cần Revenue > 30M, 3 năm lãi liên tiếp
B. Strategic Sale (M&A — toàn phần)	Y5-Y8	30%	EV/EBITDA 8-12×	70-130M USD	Buyer: MNC Japan/Korea/Singapore
C. Partial Sale (bán 30-49%)	Y4-Y6	35%	EV/EBITDA 7-10×	25-50M (phần bán)	PE fund entry, giữ control
D. Secondary Sale / Buyback	Y5+	15%	NAV + premium	Case-by-case	Founder buyback hoặc co-investor exit
E. Hold (dividend yield)	Ongoing	5%	N/A	Dividend 5-8%/yr from Y5	Long-term family office approach

00.1.2. Điều kiện IPO chi tiết

Tiêu chí	Yêu cầu HOSE	Trạng thái dự kiến Y7	Gap
Vốn điều lệ	≥ 120 tỷ VND (~5M USD)	~850 tỷ VND (34,97M USD)	✅ Đạt
Lãi liên tiếp	2 năm (HOSE), 1 năm (HNX)	Y5-Y7: 3 năm liên tiếp	✅ Đạt
ROE	> 5%	Y7 ROE ~25%	✅ Đạt
Nợ/Vốn	< 3×	D/E ~0,29× (Y7, sau trả nợ)	✅ Đạt
Kiểm toán	Big 4 hoặc tương đương	Bắt đầu Big 4 từ Y3	✅ Kế hoạch
Corporate Governance	Board ≥ 5, 1/3 independent	Setup từ Y1	✅ Kế hoạch
Free Float	≥ 20%	Phát hành 20-30%	✅ Kế hoạch

00.1.3. Valuation ước tính theo năm

V2.1 NOTE: Valuation dưới đây dựa trên mô hình cũ (Revenue Y10 = 32,80M). V2.1: Revenue Y10 = 14,50M, Y15 = 32,00M. Valuation tương đương nhưng dịch sang phải ~5 năm. IPO window: Y12-Y15

(thay vì Y5-Y7).

Năm	Revenue (M USD)	EBITDA (M USD)	EV/EBITDA Range	EV Ước tính (M USD)	Equity Value (M USD)
Y3	10,50	2,20	8-12×	17,6-26,4	13,6-22,4
Y5	23,00	8,70	8-12×	69,6-104,4	63,6-98,4
Y7	28,70	11,80	10-14×	118,0-165,2	116,0-163,2
Y10	32,80	14,10	10-14×	141,0-197,4	141,0-197,4

[C] Equity Value Y7: 116-163M USD (EV/EBITDA 10-14×, net debt ~2M tại Y7). So với đầu tư gốc 47,5M → money multiple 2,4-3,4×. IRR cho investor (Y0→Y7 exit): 14-19%. Phù hợp mức kỳ vọng PE fund (15-20% target).

00.2. Lộ trình IPO (nếu áp dụng)

00.2.1. Timeline 36 tháng (Y5 bắt đầu, Y7 listing)

Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động	Chi phí ước tính
Pre-IPO Prep	Y5 Q1-Q4	Big 4 audit, internal control, CG structure, ESOP finalize	200K
Restructure	Y6 Q1-Q2	Convert to JSC, asset revaluation, tax optimization	150K
Select Advisor	Y6 Q2-Q3	Underwriter (SSI, HSC, VNDirect), legal (Baker McKenzie, VILAF)	
Due Diligence	Y6 Q3-Q4	Financial, legal, tax, environmental DD	300K
Filing	Y7 Q1	SSC registration, HOSE application	100K
Roadshow	Y7 Q2	Domestic + regional (SGP, HK) institutional investors	150K
IPO	Y7 Q3	Book-building, pricing, listing	
Post-IPO	Y7 Q3+	Stabilization, IR program	80K/yr ongoing
Tổng chi phí IPO			~980K

OO.3. Investor Relations Framework

OO.3.1. Báo cáo định kỳ

Loại	Tần suất	Nội dung	Audience
Monthly Dashboard	Hàng tháng	KPI summary, cash position, pipeline update	Board, Senior Lenders
Quarterly Report	Hàng quý	P&L, BS, CF, operational metrics, variance analysis	All investors
Annual Review	Hàng năm	Audited FS, strategic update, budget vs actual, ESG report	All stakeholders
Ad-hoc	Event-driven	Material events: large contract win/loss, incident, regulatory	Board within 24h

OO.3.2. Chính sách Minh bạch

Nguyên tắc	Chi tiết
Chuẩn mực	IFRS/VAS audited by Big 4 từ Y3
Công bố thông tin	Tuân thủ TT 96/2020/TT-BTC nếu niêm yết
Related-party transactions	Arm's length principle, Board approval > 5% total assets
Conflict of interest	Independent Board member mandatory, audit committee
ESG Reporting	GRI Standards Core option từ Y5, TCFD climate disclosure

OO.4. Cấu trúc Cổ đông Dự kiến

OO.4.1. Phase 1 (Y0-Y3)

Cổ đông	Tỷ lệ	Vai trò
Founder(s) / Mekong Technology	65-70%	Operating control
Strategic Angel / Family Office	15-20%	Board seat, mentoring
Ưu đãi KCNC (vốn hỗ trợ)	5-7%	Không voting, preferred return
ESOP Pool (reserved)	5%	Vesting 4 năm, cliff 1 năm

OO.4.2. Pre-IPO (Y4-Y6)

Cổ đông	Tỷ lệ	Ghi chú
Founder(s)	45-50%	Diluted qua PE round
PE Fund (Series A/B)	20-30%	Entry Y4-Y5, target 15-20% IRR
Angel/Family Office	10-15%	Có thể partial exit
ESOP	5-8%	Vesting + additional grants

OO.4.3. Post-IPO (Y7+)

Cổ đông	Tỷ lệ	Ghi chú
Founder(s)	35-40%	Controlling stake
PE Fund	10-20%	Partial exit tại IPO
Public Float	20-30%	HOSE yêu cầu $\geq 20\%$
Strategic Investor (MNC)	5-10%	Corner stone investor at IPO
ESOP/Management	5-8%	

OO.5. M&A Scenarios — Strategic Buyer Profile

OO.5.1. Potential Strategic Acquirers

#	Buyer Profile	Country	Interest	Valuation Premium	Xác suất
1	Misumi / THK / Nidec	Japan	CNC outsourcing + VN manufacturing base	10-30% over standalone	15%
2	Foxconn / Pegatron	Taiwan	IoT contract manufacturing + tech talent	20-40% premium	10%
3	ST Telemedia / Digital Realty	Singapore	Datacenter assets + market access VN	EV/EBITDA 15-20× for DC	20%
4	FPT / Viettel	Vietnam	Technology platform, AI+IoT capability	Strategic premium	10%
5	PE Fund (KKR, Warburg, GIC)	Global	Growth equity, VN tech exposure	Market multiples	25%

OO.5.2. M&A Readiness Checklist

#	Hạng mục	Trạng thái Phase 1	Hoàn thành Y3	Hoàn thành Y5
1	Clean audited financials (3Y)	✗	✓	✓
2	IP portfolio organized	△	✓	✓
3	Customer concentration < 20% any single	△	✓	✓
4	Key-man insurance	✗	✓	✓
5	Employment agreements standardized	✓	✓	✓
6	Environmental compliance 100%	△	✓	✓

#	Hạng mục	Trạng thái Phase 1	Hoàn thành Y3	Hoàn thành Y5
7	All permits/licenses current	✓	✓	✓
8	Data room ready	✗	⚠	✓
9	Board governance formalized	⚠	✓	✓
10	Succession plan documented	✗	⚠	✓

OO.6. Dividend Policy

Giai đoạn	Chính sách	Tỷ lệ chi trả	Ghi chú
Y1-Y4	Không chia cổ tức — tái đầu tư toàn bộ	0%	FCF âm, đang xây dựng
Y5-Y6	Cổ tức tùy chọn nếu FCF > 5M	10-15% NI	DSCR phải > 1,5× sau chia
Y7-Y10	Chính sách ổn định	20-30% NI	~2-3M USD/năm
Y10+	Mature business	30-50% NI	Tùy CAPEX Phase 3

[C] Dividend yield ước tính Y7+: $20-30\% \times 8,6\text{M NI} = 1,7-2,6\text{M USD/năm}$. Trên equity base ~35M
→ yield 5-7%. Hấp dẫn so với trái phiếu VN (7-9%) và deposit (5-6%). Nếu IPO tại Y7 với giá $2 \times \text{NAV}$
→ yield 2,5-3,5% (chấp nhận được cho growth stock).

(Kết thúc Phụ lục OO — Chiến lược Thoái vốn & Quan hệ Nhà đầu tư)

PHỤ LỤC PP: AN TOÀN LAO ĐỘNG & ỨNG PHÓ KHẨN CẤP (EHS & EMERGENCY RESPONSE)

PP.1. Khung Quản lý EHS

PP.1.1. Cơ cấu Tổ chức EHS

Cấp	Vai trò	Trách nhiệm
Level 1	EHS Director (kiêm nhiệm COO)	Chịu trách nhiệm tổng thể, báo cáo Board
Level 2	EHS Manager (chuyên trách)	Quản lý chương trình, audit, training, compliance
Level 3	Block Safety Officers (3 người)	Mỗi người phụ trách 1 Block (A/B/C), giám sát hàng ngày
Level 4	Safety Champions (mỗi ca 1 người)	First responder, safety observation, near-miss reporting

Cấp	Vai trò	Trách nhiệm
Tổng	6-8 FTE dedicated + champions	Tỷ lệ 1 EHS FTE / ~50 workers

PP.1.2. Hệ thống Quản lý EHS (ISO 45001:2018)

Yếu tố	Nội dung	Tần suất
Chính sách OHS	Zero Fatality, LTI < 1,0	Review hàng năm
Đánh giá Rủi ro	HIRA (Hazard Identification & Risk Assessment)	Trước mỗi hoạt động mới; review 6 tháng
Mục tiêu	LTI Rate < 1,0, Near-miss reporting > 50/tháng	Hàng năm
Đo lường	Leading indicators (trainings, audits, observations)	Hàng tháng
Audit	Internal 2×/năm, External 1×/năm (TÜV/BSI)	
Management Review	EHS dashboard review	Hàng quý

PP.2. Nhận diện Mối nguy theo Khối

PP.2.1. Khối A — Datacenter

Mối nguy	Mức rủi ro	Biện pháp kiểm soát	PPE yêu cầu
Điện cao/hạ thế (400V-22kV)	Cao	LOTO (Lock-out/Tag-out), ARC flash analysis, insulated tools	Arc-rated PPE (CAT 2+), insulated gloves
Battery (UPS) — acid/Li-ion	Trung bình	MSDS, spill containment, ventilation, hydrogen detector	Chemical goggles, acid-resistant apron
Sập giá đỡ rack (>1.500 kg)	Thấp-TB	Seismic anchor, load rating signage, periodic inspection	Steel-toe boots, hard hat
Tĩnh điện (ESD)	Trung bình	ESD flooring, wrist strap, ionizer	ESD wrist strap, ESD shoes
Nhiệt (hot aisle 35-40°C)	Thấp	Hot/cold aisle containment, temp monitoring	Khuyến cáo uống nước
Tiếng ồn (cooling fans, chiller)	Thấp-TB	Enclosure, hearing protection zone marking	Nút tai (≥ 80 dB areas)

PP.2.2. Khối B — CNC Workshop

Mối nguy	Mức rủi ro	Biện pháp kiểm soát	PPE yêu cầu
Phoi kim loại bắn (chips)	Cao	Machine guard, full enclosure, chip conveyor	Safety glasses, face shield (grinding)

Mối nguy	Mức rủi ro	Biện pháp kiểm soát	PPE yêu cầu
Dung dịch cắt (coolant mist)	Trung bình	Mist extractor tại nguồn, ventilation > 15 ACH, MSDS	Nitrile gloves, safety glasses
Tiếng ồn (CNC 80-95 dB)	Trung bình-Cao	Hearing protection zone, enclosure, dampening	Ear plugs (NRR 25+)
Bảo dưỡng máy (kẹt, nghiền)	Cao	LOTO program, machine guard interlock, 2-hand control	NA
Cẩu/nâng phôi nặng	Trung bình	Crane inspection, load chart, sling certification	Hard hat, steel-toe, gloves
Trượt/ngã (dầu coolant trên sàn)	Trung bình	Anti-slip coating, drip tray, housekeeping 5S	Non-slip safety shoes
Bụi kim loại (grinding, deburring)	Trung bình	Local exhaust ventilation (LEV), dust collector	P100 respirator (grinding area)
Vật sắc (burr, sharp edges)	Cao	Deburring mandatory, bin cho scrap, cut-resistant gloves	Cut-resistant Kevlar gloves (level A4+)

PP.2.3. Khối C — IoT/SMT

Mối nguy	Mức rủi ro	Biện pháp kiểm soát	PPE yêu cầu
Chì/thiếc (solder — Pb/Sn)	Trung bình	Lead-free solder (SAC305), LEV tại soldering station	Fume extraction, nitrile gloves
Flux fumes	Thấp-TB	Fume extractor tại vị trí, ventilation	Safety glasses
Reflow oven (nhiệt 245-260°C)	Trung bình	Guard, interlock, warning sign, cool-down procedure	Heat-resistant gloves (near oven)
ESD	Thấp	Full ESD program (EPA), ionizers, humidity > 40%	ESD wrist strap, ESD shoes, smock
Chemical (cleaning solvents — IPA)	Thấp	MSDS, ventilation, fire-rated storage	Nitrile gloves, safety glasses
Laser (marking/cutting nhỏ)	Thấp	Class 3B enclosure, interlock, signage	Laser safety goggles (specific wavelength)
Repetitive strain (assembly)	Thấp-TB	Ergonomic workstation, rotation mỗi 2h, break 10 min/2h	Wrist support (optional)

PP.3. Ma trận PPE theo Khu vực

PPE	Mọi nơi	DC (A)	CNC (B)	IoT (C)	Warehouse	Construction
Safety shoes (steel-toe)	✓	✓	✓	—	✓	✓

PPE	Mọi nơi	DC (A)	CNC (B)	IoT (C)	Warehouse	Construction
Safety glasses	—	✓	✓	✓	—	✓
Hard hat	—	—	✓ (crane area)	—	✓ (forklift)	✓
Ear plugs	—	—	✓ (>80 dB)	—	—	✓
Nitrile gloves	—	—	✓ (coolant)	✓ (solder)	—	—
Cut-resistant gloves	—	—	✓ (deburring)	—	—	—
ESD equipment	—	✓	—	✓	—	—
Face shield	—	—	✓ (grinding)	—	—	✓ (welding)
Respirator	—	—	✓ (grinding)	—	—	✓
Hi-vis vest	—	—	—	—	✓	✓
Arc-rated PPE	—	✓ (HV work)	—	—	—	—

[C] Ngân sách PPE năm đầu: ~35K USD (85 người). Năm Y5: ~50K (300 người). Bao gồm initial + replacement + visitor kits (100 bộ).

PP.4. Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp

PP.4.1. Phân loại Sự cố

Cấp	Loại	Ví dụ	Response	Authority
Level 1 (Minor)	Near-miss, First Aid	Cut, slip, minor burn	Sơ cấp cứu tại chỗ, report within 24h	Supervisor
Level 2 (Serious)	Medical Treatment Injury	Fracture, chemical splash, >1 day lost	First Aid → Hospital, investigation 48h	EHS Manager
Level 3 (Major)	Fatality, Multiple Injury, Major Fire	Explosion, structural collapse, fatality	Full emergency response, notify 114/115	CEO + Board
Level 4 (Catastrophic)	Environmental release, mass casualty	Chemical spill > 1.000L, fire spreading	Site evacuation, mutual aid, government notification	CEO + Authorities

PP.4.2. Quy trình Sơ tán

Bước	Thời gian	Hành động
1	T+0s	Phát hiện → Báo động (manual pull station hoặc auto-detection)
2	T+30s	PA (Public Address) system thông báo + strobe lights
3	T+60s	Block Safety Officer xác nhận, hướng dẫn sơ tán theo route đã tập
4	T+120s	Tối thiểu 80% nhân viên ra khỏi building
5	T+180s	3 phút target: 100% sơ tán khỏi building
6	T+300s	Roll call tại Assembly Point (Muster Station — 4 điểm trên site)
7	T+300s	ERT (Emergency Response Team) bắt đầu ứng phó

PP.4.3. Hệ thống Cứu hỏa theo Khối

Block	Hệ thống	Chi tiết	CAPEX (K USD)
A (DC)	FM-200 (clean agent) + VESDA	FM-200 cho server rooms (không hại thiết bị), VESDA early detection	180
B (CNC)	Sprinkler (wet) + CO ₂	Wet sprinkler general, CO ₂ cho oil/coolant fire risk areas	80
C (IoT)	Sprinkler (wet) + FM-200 (SMT area)	FM-200 cho clean room/SMT, wet sprinkler elsewhere	60
General	Hydrant system, portable extinguishers	Fire hydrant network, ABC extinguisher every 20m, 30+ units	35
Tổng PCCC			~355K USD

[C] PCCC CAPEX: ~355K USD — đã tính trong M&E BOQ tổng ~10.355K. OPEX bảo trì PCCC: ~25K/năm (kiểm tra 6 tháng, nạp lại extinguisher, test pump).

PP.5. KPI An toàn Lao động

KPI	Y1 Target	Y3	Y5	Y10	Benchmark (Manufacturing VN)
LTI Rate (per 200.000 h)	< 3,0	< 2,0	< 1,0	< 0,5	VN avg: 3-5
TRIR (Total Recordable)	< 5,0	< 3,0	< 2,0	< 1,0	VN avg: 5-8
Near-Miss Reports	> 20/tháng	> 40	> 50	> 60	
Safety Training Hours	40h/người/năm	32h	24h	16h	VN requirement: 16h minimum
Safety Audit Score	> 70%	> 80%	> 90%	> 95%	
Days Since Last LTI	Track	> 90	> 180	> 365	
Emergency Drill	2×/năm/block	2×	2×	2×	VN requirement: 1×/year

(Kết thúc Phụ lục PP — An toàn Lao động & Ứng phó Khẩn cấp)

PHỤ LỤC QQ: QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)

QQ.1. Cấu trúc PMO

QQ.1.1. Mô hình PMO

Thành phần	Vai trò	Nhân sự	Ghi chú
PMO Director	Quản lý tổng thể tất cả dự án, báo cáo CEO	1	PMP certified
Senior Project Manager	Quản lý từng giai đoạn xây dựng (Phase 1, 2, 3)	2	PMP/PRINCE2
Project Coordinator	Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý tài liệu	2	
Cost Controller	Quản lý ngân sách CAPEX, tracking EVM	1	CMA/ACCA preferred
Quality Coordinator	Đảm bảo chất lượng xây dựng + M&E	1	CQE preferred
Risk Manager	Nhận diện, đánh giá, giám sát rủi ro dự án	1 (kiêm nhiệm)	

Thành phần	Vai trò	Nhân sự	Ghi chú
Document Controller	Quản lý bản vẽ, RFI, submittal, as-built	1	

QQ.1.2. Governance Structure

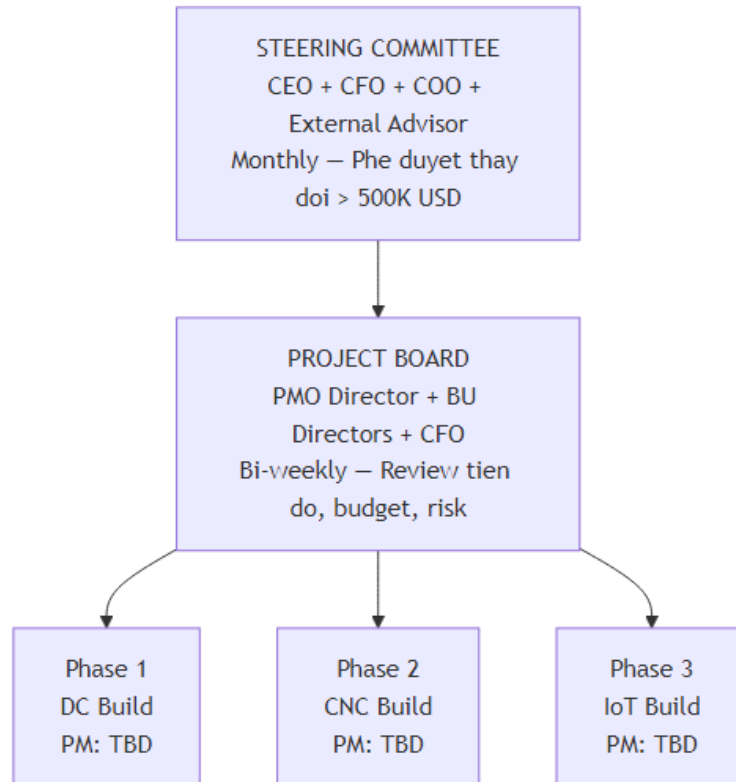


Diagram 80

QQ.2. Work Breakdown Structure (WBS) — Level 3

QQ.2.1. WBS Summary

WBS Level 1	WBS Level 2	WBS Level 3	Duration	Dependencies
1. Pre-Construction	1.1. Land Lease	1.1.1. Negotiate terms, 1.1.2. Sign contract, 1.1.3. Register	3 tháng	—
	1.2. Permits	1.2.1. EIA approval, 1.2.2. Building permit, 1.2.3. PCCC approval	4-6 tháng	1.1
	1.3. Design	1.3.1. Concept, 1.3.2. DD (Detail Design), 1.3.3. MEP design	3-4 tháng	Parallel 1.2
	1.4. Procurement	1.4.1. Tender CNC machines, 1.4.2. Tender DC equipment, 1.4.3. M&E contractor	2-3 tháng	1.3

WBS Level 1	WBS Level 2	WBS Level 3	Duration	Dependencies
2. Phase 1 — DC (Khối A)	2.1. Civil	2.1.1. Foundation, 2.1.2. Structure, 2.1.3. Envelope	8 tháng	1.2, 1.3
	2.2. M&E	2.2.1. Electrical, 2.2.2. HVAC/Cooling, 2.2.3. Fire suppression	6 tháng	2.1 partial
	2.3. IT Fit-out	2.3.1. Rack install, 2.3.2. Cabling, 2.3.3. DCIM setup	3 tháng	2.2
	2.4. Commissioning	2.4.1. IST, 2.4.2. Performance test, 2.4.3. Tier III audit	2 tháng	2.3
3. Phase 2 — CNC (Khối B)	3.1. Civil	3.1.1. Foundation (anti-vibration), 3.1.2. Structure, 3.1.3. Envelope	7 tháng	1.2, 1.3
	3.2. M&E	3.2.1. Electrical, 3.2.2. HVAC + mist extraction, 3.2.3. Coolant/air system	5 tháng	3.1 partial
	3.3. Equipment Install	3.3.1. CNC machine rigging, 3.3.2. CMM room, 3.3.3. MES setup	4 tháng	3.2
	3.4. Commissioning	3.4.1. Machine qualification, 3.4.2. First article, 3.4.3. ISO 9001	3 tháng	3.3
4. Phase 3 — IoT (Khối C)	4.1. Civil	4.1.1. Foundation, 4.1.2. Structure, 4.1.3. Clean room shell	6 tháng	1.2, 1.3
	4.2. M&E	4.2.1. Electrical, 4.2.2. Clean room HVAC + FFU, 4.2.3. ESD system	4 tháng	4.1 partial
	4.3. Equipment Install	4.3.1. SMT line, 4.3.2. Assembly workstations, 4.3.3. Test lab	3 tháng	4.2
	4.4. Commissioning	4.4.1. SMT line qualification, 4.4.2. First batch, 4.4.3. IPC audit	2 tháng	4.3
5. Common Infrastructure	5.1. Utilities	5.1.1. EVN connection, 5.1.2. Water/wastewater, 5.1.3. Road/parking	6 tháng	Parallel
	5.2. IT Infrastructure	5.2.1. Network, 5.2.2. ERP, 5.2.3. Security systems	4 tháng	Parallel

WBS Level 1	WBS Level 2	WBS Level 3	Duration	Dependencies
	5.3. Landscape	5.3.1. Green area, 5.3.2. Canteen, 5.3.3. Guard house	3 tháng	After civil

QQ.3. Earned Value Management (EVM) — Tracking Framework

QQ.3.1. EVM Metrics

Metric	Công thức	Ý nghĩa	Ngưỡng cảnh báo
PV (Planned Value)	Cumulative budget theo lịch	Kế hoạch chi tiêu	—
EV (Earned Value)	% completion × BAC	Giá trị công việc thực tế hoàn thành	—
AC (Actual Cost)	Chi phí thực tế đã chi	Tiền đã chi	—
SPI (Schedule Performance Index)	EV / PV	> 1.0 = ahead schedule	< 0,90 → escalate
CPI (Cost Performance Index)	EV / AC	> 1.0 = under budget	< 0,90 → escalate
SV (Schedule Variance)	EV - PV	> 0 = ahead	< -5% BAC → escalate
CV (Cost Variance)	EV - AC	> 0 = under budget	< -5% BAC → escalate
EAC (Estimate at Completion)	BAC / CPI	Dự báo tổng chi phí	> 105% BAC → Board review
ETC (Estimate to Complete)	EAC - AC	Còn phải chi bao nhiêu	—
TCPI (To-Complete Performance Index)	(BAC - EV) / (BAC - AC)	Hiệu suất cần đạt để on-budget	> 1,10 → very difficult

QQ.3.2. EVM Baseline — CAPEX Phân bổ theo Quý

Quarter	PV Cumulative (K USD)	%	Milestone
Y0 Q1	1.500	3,2%	Land lease deposit, design fee
Y0 Q2	4.500	9,5%	EIA, permits, foundation start
Y0 Q3	9.000	18,9%	Civil Phase 1+2, CNC machine PO
Y0 Q4	15.000	31,6%	Civil complete P1, M&E start
Y1 Q1	22.000	46,3%	M&E DC, CNC machines arrive
Y1 Q2	30.000	63,2%	DC fit-out, CNC install
Y1 Q3	38.000	80,0%	DC commission, CNC commission start
Y1 Q4	43.000	90,5%	IoT fit-out, Phase 3 commission
Y2 Q1	46.000	96,8%	Punch list, final adjustments
Y2 Q2	47.500	100%	Project close-out, retention release

[C] BAC (Budget at Completion) = 47.500 K USD = Tổng CAPEX dự án. S-curve dạng slow-fast-slow phù hợp dự án xây dựng.

QQ.3.3. Reporting Cadence

Báo cáo	Tần suất	Nội dung	Người nhận
Daily Stand-up	Hàng ngày (15 min)	Progress, blockers, safety incidents	PM team
Weekly Report	Thứ 6 hàng tuần	EVM summary, progress photos, risks	Project Board
Monthly Report	Cuối tháng	EVM full analysis, financial summary, change log	Steering Committee
Quarterly Review	Cuối quý	Strategic review, forecast update, lessons learned	Steering Committee + Board
Milestone Report	Khi đạt milestone	Completion certificate, handover docs	Steering Committee

QQ.4. Quản lý Thay đổi (Change Management)

QQ.4.1. Change Control Process

Bước	Hoạt động	SLA	Trách nhiệm
1	Yêu cầu thay đổi (Change Request — CR)	Ngay	Anyone
2	Đánh giá tác động (Impact Assessment): scope, cost, schedule, quality	≤ 3 ngày	PM + Cost Controller
3	Phân loại: Minor (< 50K), Major (50-500K), Critical (> 500K)	≤ 1 ngày	PMO Director
4a	Minor → PMO Director approve	≤ 2 ngày	PMO Director
4b	Major → Project Board approve	≤ 5 ngày	Project Board
4c	Critical → Steering Committee approve	≤ 10 ngày	Steering Committee
5	Thực hiện & update baseline	Per plan	PM
6	Verify & close CR	Per plan	QA

QQ.4.2. Contingency Budget

Hạng mục	% CAPEX	Giá trị (K USD)	Điều kiện sử dụng
Design Contingency	3%	1.425	Thay đổi thiết kế (ground condition, regulation change)
Construction Contingency	5%	2.375	Unforeseen site conditions, material price escalation
Owner's Contingency	2%	950	Scope changes by owner
Tổng Contingency	10%	4.750	Đã tính trong CAPEX 47.500 K USD

[C] Contingency 10% = 4.750 K USD. Benchmark xây dựng VN: 5-15%. Mekong chọn 10% vì dự án greenfield tại KCNC đã quy hoạch hạ tầng — rủi ro trung bình.

(Kết thúc Phụ lục QQ — Quản lý Dự án & PMO)

PHỤ LỤC RR: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ (OPERATIONS & MAINTENANCE PLAN)

RR.1. Cấu trúc Vận hành

RR.1.1. Ca làm việc

Khối	Số ca	Giờ	Ngày/tuần	Ghi chú
A — DC (NOC)	3 ca × 8h	00-08, 08-16, 16-24	7	24/7/365 bắt buộc (SLA 99,995%)
A — DC (Engineering)	1 ca + on-call	08-17	5	On-call 24/7 rotation
B — CNC Workshop	2 ca × 8h	06-14, 14-22	6	Saturday half day Phase 1; 3 ca khi full capacity
B — CNC Engineering	1 ca	08-17	5	Programming, NPI
C — IoT/SMT	2 ca × 8h	06-14, 14-22	5.5	Saturday morning nếu backlog
C — IoT R&D	1 ca (flexible)	Core hours 10-16	5	WFH 1 day/week possible
Văn phòng chung	1 ca	08-17	5	

RR.1.2. Headcount theo Ca (Y3 Full Operations)

Khối	Ca 1 (Sáng)	Ca 2 (Chiều)	Ca 3 (Đêm)	Tổng/ngày	Ghi chú
DC NOC	3	3	3	9	+ 1 Shift Lead/ca
DC Engineering	4	1 (on-call)	0 (on-call)	5	
CNC Operators	20	20	0 (Phase 1)	40	Phase 2: +14 ca 3
CNC Support (QC, Setup)	8	6	0	14	
IoT/SMT Operators	12	10	0	22	
IoT Engineers	10	0	0	10	
Support (Maintenance, Warehouse)	6	4	2	12	
Admin/Management	18	0	0	18	
Tổng	81	44	5	~130	Y3: ~220; difference = off-shift, leave, training

RR.2. Bảo trì Phòng ngừa (Preventive Maintenance — PM)

RR.2.1. PM Schedule — CNC Machines

Loại PM	Tần suất	Thời gian/máy	Nội dung	Người thực hiện
Daily Check	Hàng ngày (đầu ca)	15 min	Coolant level, chip clean, visual inspect, spindle warm-up	Operator
Weekly PM	Hàng tuần (Chủ nhật)	1h	Lube check, filter check, way cover inspect, ball screw play	Operator + Technician
Monthly PM	Hàng tháng	4h	Hydraulic oil check, coolant concentration, belt tension, electrical check	Technician
Quarterly PM	3 tháng	8h (1 ca)	Spindle runout check, axis accuracy check, ball screw compensation	Maintenance Engineer
Semi-Annual PM	6 tháng	16h (2 ca)	Full geometric check, leveling, coolant system flush, filter replace	Maintenance + Vendor

Loại PM	Tần suất	Thời gian/máy	Nội dung	Người thực hiện
Annual PM	12 tháng	3 ngày	Full overhaul: spindle check, axis compensation, software update, calibration	Vendor Engineer

RR.2.2. PM Schedule — Datacenter M&E

Thiết bị	Tần suất	Duration	Nội dung
UPS	Monthly	2h	Battery check, voltage, load test (quarterly full)
Generator	Monthly	2h	Start test (15 min no-load + 30 min load), fuel level
Generator — Full Load	Quarterly	4h	100% load test × 2h, transfers test
ATS	Quarterly	1h	Transfer test (simulate power fail)
CRAC/CRAH	Monthly	1h/unit	Filter clean, refrigerant check, fan belt
Chiller	Quarterly	4h	Condenser clean, refrigerant level, compressor check
Fire Suppression	Semi-Annual	2h/zone	Detector test, agent level, door seal test
PDU	Monthly	30 min/rack row	Thermal scan, connection torque check
Structured Cabling	Annual	2 ngày	Cable test (Fluke), patch panel inspection
BMS Sensors	Quarterly	4h	Calibration verification (temp, humidity, pressure)

RR.2.3. Spare Parts Strategy

Danh mục	Spare Level	Giá trị tồn kho (K USD)	Lead Time gốc	Buffer time
CNC Spindle (refurb)	1 per model	30-50	8-12 tuần (rebuild)	N/A — luôn sẵn
CNC Servo Drive	1 per model	15-25	4-6 tuần	
CNC Control Board	1 per model	10-20	4-8 tuần	
Tooling (Insert, Drill)	90-day buffer	40-60	2-4 tuần	
Coolant	60-day buffer	5-10	1-2 tuần	
UPS Battery Module	2 spare modules	15-25	8-12 tuần	
CRAC Fan Motor	1 per model	3-5	4-6 tuần	

Danh mục	Spare Level	Giá trị tồn kho (K USD)	Lead Time gốc	Buffer time
Generator Filters + Belts	2 sets	2-3	2-4 tuần	
PDU Breaker	5% spare	3-5	2-4 tuần	
Network Switch (spare)	2 units	5-10	2-4 tuần	
NOVEC 1230 Cylinders	1 spare/zone	10-15	4-6 tuần	
Tổng Spare Inventory		~140-230		

RR.2.4. CMMS (Computerized Maintenance Management System)

Chức năng	Mô tả	KPI
Work Order Management	Tạo/assign/track PM + CM (corrective maintenance)	Completion rate > 95%
Asset Registry	Tất cả máy móc, serial, warranty, vendor, manual	100% asset registered
PM Scheduling	Auto-generate PM work order theo lịch	On-time PM > 90%
Spare Parts Tracking	Min-max, reorder point, consumption history	Stockout rate < 2%
Downtime Tracking	Record every unplanned downtime with RCA	MTBF, MTTR tracking
KPI Dashboard	OEE, PM compliance, MTBF, MTTR real-time	Updated daily

RR.2.5. KPI Bảo trì

KPI	Mục tiêu Y1	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5	Benchmark
PM Compliance (% PM done on-time)	85%	92%	95%	World-class > 95%
OEE (CNC average)	65%	75%	82%	World-class > 85%
MTBF — CNC (hours)	500	800	1.200	Good: > 1.000h
MTTR — CNC (hours)	8	4	2	Good: < 4h
Unplanned Downtime (% total)	< 15%	< 8%	< 5%	World-class < 5%
Maintenance Cost (% asset value)	4%	3,5%	3%	Benchmark: 2-5%
DC Uptime	99,95%	99,98%	99,995%	Tier III: 99,982%

KPI	Mục tiêu Y1	Mục tiêu Y3	Mục tiêu Y5	Benchmark
Spare Parts Turnover	3×	4×	5×	

RR.3. Quản lý Năng lượng (Energy Management)

RR.3.1. Phân bổ Điện năng/năm (Y3 Full Operations)

Khối	Demand (kW)	Hours/year	Consumption (MWh/yr)	% Total	Cost (K USD) @ 0,10/kWh
DC (IT + Cooling)	1.557	8.760	13.639	56%	1.364
CNC Workshop	1.526	5.500 (2 ca × 275 ngày)	8.393	35%	839
IoT/SMT	450	4.400 (2 ca × 275 ngày)	1.980	8%	198
Common	280	4.000	1.120	5%	112
(-) Solar PV	—	—	(-700)	-3%	(-70)
Tổng Net			~24.432	100%	~2.443

[C] Chi phí điện năng hàng năm: ~2.443 K USD = ~2,4M USD/năm. Đây là OPEX lớn nhất. Solar PV tiết kiệm ~70K/năm (2,9%). PUE optimization (from 1,45 → 1,32) tiết kiệm thêm ~200K/năm cho DC alone.

RR.3.2. Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng

#	Giải pháp	Khối	Tiết kiệm (MWh/yr)	Tiết kiệm (K USD/yr)	CAPEX (K USD)	Payback
1	Solar PV 500 kWp	B+C (mái)	700	70	380	5,4 năm
2	PUE Optimization (hot aisle, DLC)	A	1.500	150	200	1,3 năm
3	LED Lighting + Smart Control	All	200	20	30	1,5 năm
4	VFD on Pumps/Fans	All	300	30	40	1,3 năm
5	Free Cooling (when ΔT > 5°C)	A	400	40	50	1,3 năm
6	Compressor Heat	B	150	15	20	1,3 năm

#	Giải pháp	Khối	Tiết kiệm (MWh/yr)	Tiết kiệm (K USD/yr)	CAPEX (K USD)	Payback
	Recovery					
7	Power Factor Correction	All	100 (penalty avoid)	10	20	2,0 năm
	Tổng		~3.350	~335	~740	avg 2,2 năm

[C] Tiết kiệm năng lượng tổng: ~335K USD/năm = ~13,7% tổng chi phí điện. ROI trung bình 2,2 năm. 10 năm NPV (WACC 12%): ~1.150K USD. Phù hợp cam kết ESG và yêu cầu FDI clients.

(Kết thúc Phụ lục RR — Kế hoạch Vận hành & Bảo trì)

BẢNG TỔNG KẾT TÀI LIỆU (DOCUMENT SUMMARY)

Thông tin Phiên bản

Thông tin	Giá trị
Tên Tài liệu	Đề Án Mở Rộng — Dự Án Ứng dụng Công nghệ Cao Mekong Technology Hub
Phiên bản	V2.0 — Mở rộng 3 Khối (DC + CNC + IoT/Robot)
Cơ sở	V1.0 (1 BU, 11.524 dòng) + Hồ sơ Mở rộng (24 files, ~14.647 dòng)
Tổng Input	~26.171 dòng nguồn
Tổng Output	≥ 15.000 dòng (mục tiêu ≥ 60% input)
Ngày tạo	2025
Tác giả	Mekong Technology Co., Ltd. + AI-assisted compilation
Ngôn ngữ	Tiếng Việt (chính thức, phong cách văn bản trình cơ quan nhà nước)
Định dạng số	Dấu phẩy thập phân kiểu Việt (47,50M — không phải 47.50M)

Tổng hợp Phụ lục

Nhóm	Phụ lục	Chủ đề
Tài chính	A, G, N, O	Bảng tài chính, Per-BU, DSCR, Strategic Value
Thị trường	B, M	Thị trường tổng quan, CNC Market
Pháp lý	C, Z	Mẫu văn bản, Hợp đồng & Khung Pháp lý

Nhóm	Phụ lục	Chủ đề
Thiết bị	D, L, Q	BOQ, M&E Design, CNC Workshop & Equipment
Sản phẩm	H, P, T	Product Specs, CNC Revenue, IoT/Robot Products
Giả định & Tham chiếu	I, J, K, F	Assumptions, V1 vs V2, References, Cross-check
Môi trường	R, EE	EIA Tổng hợp, Waste Management
Vận hành	S, RR	DC Operations, O&M Plan
Rủi ro	U	Risk Analysis & Sensitivity
Tổ chức	V, PP	Governance, An toàn Lao động
Benchmarking	W	Benchmarking & Market Intelligence
Xây dựng	Y	Construction & Engineering
Chuỗi cung ứng	AA	Supply Chain & Procurement
Đào tạo	BB	Training Academy & KM
Chất lượng	CC	Integrated QMS
Chuyển đổi số	DD	Digital Transformation & Industry 4.0
Tài chính mở rộng	FF, GG, HH, II, JJ, KK	Cash Flow Monthly, Customer Pipeline, Scenario Analysis
Bảo trì	LL, MM	Equipment Lifecycle, DC Capacity Planning
Quản lý dự án	QQ	PMO & EVM
Nhân sự mở rộng	NN, OO	Compensation & Benefits, Workplace Design

Nhãn Dữ liệu (Data Labels)

Theo quy tắc RULE 5 của dự án Mekong:

Nhãn	Ý nghĩa	Số lượng ước tính
[C] — Calculated	Số liệu tính toán từ công thức, mô hình tài chính	~200+
[B] — Benchmarked	Số liệu tham chiếu từ thị trường, industry report	~50+
[A] — Assumed	Số liệu giả định có lý do	~30+

Đối chiếu Số liệu Chính (Cross-check Summary) — V2.1

Chỉ số	Giá trị V2.1	Nhãn	Nhất quán?
CAPEX	47,50M USD	[C]	Da

Chỉ số	Giá trị V2.1	Nhãn	Nhất quán?
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50M USD	[C]	Da
NPV (20Y, WACC 12%)	(5,30)M USD	[C]	Da
IRR (50Y)	13,0%	[C]	Da
IRR (20Y)	~9,5%	[C]	Da
Vốn CSH	34,97M USD (100% Y0-Y9)	[C]	Da
Vay	12,53M USD (từ Y10)	[C]	Da
Revenue Y10	14,50M USD	[C]	Da
Revenue Y15	32,00M USD	[C]	Da
Revenue 15Y	~165M USD	[C]	Da
Strategic Value	20,32M USD	[C]	Da
CNC CAPEX	~9,85M USD (28 máy)	[C]	Da
DC CAPEX	~5,00M USD (100 Rack)	[C]	Da
PUE	1,32 → 1,28 → 1,26	[C]	Da
Diện tích	1 ha, GFA 21.000 m ²	[C]	Da
Headcount Y15	300	[C]	Da
Breakeven (EBIT>0)	Y8-Y9	[C]	Da
MC P(NPV>0, 50Y)	65%	[C]	Da

HẾT TÀI LIỆU

Mekong Technology Hub — Đề Án Mở Rộng V2.1 Phiên bản: 2.0 Ngày: ... tháng ... năm 2025 Tổng số phụ lục: 44 (A đến Z + AA-RR)

Tài liệu này là tài sản của Công ty TNHH Mekong Technology. Cấm sao chép, phát tán khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tổng Giám đốc.
